

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa : 619/6131/2008

č. ZoD zhotoviteľa : 92/2008/08411/S/R

uzatvorenej dňa 03. 10. 2008 na zhotovenie stavby :

„CESTA I/51 a II/511 VRÁBLE, KRÍŽOVATKA “

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
IČ DPH : SK 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433 / 8180

2. Zhotoviteľ :

Názov : CESTY NITRA, a.s.
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N
V zastúpení : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.
IČO : 34 128 344
DIČ : 2020410788
IČ DPH : SK 2020410788
Realizujúce stredisko : CESTY NITRA, a.s.
stredisko Nitra, Murgašova 4, 949 78 N i t r a
telefón : 037/6920 500
fax : 037/7720 491
e-mail : officentr@cestynitra.sk
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
technických : p. Marián Jamrich, vedúci strediska Nitra
Ing. Ján Hreha, vedúci prevádzky
Bankové spojenie : CALYON S.A, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu : 102052207 / 8020

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah tejto zmluvy č. 619/6131/2008; 92/2008/08411/S/R týmto dodatkom č. 2 v čl. III. Zmluvná cena nasledovne:

III. Zmluvná cena

- na základe zavedenia novej meny € (eur) v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 650/2007 Z.z. v platnom znení s prihladnutím na riešenie obsiahnuté vo vyhláske Národnej banky Slovenska č. 240/2008 Z.z. prepočítava podľa konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk
- z dôvodu zmien počas realizácie prác, zachovania bezpečnosti cestnej premávky predĺžením zábradlia, realizovaním vodovodu v zmenenej trase po vytýčení.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Prestavané v Sk bez DPH | 8 757 187,28 Sk |
| DPH 19% | 1 663 865,60 Sk |
| Celkom: | 10 421 052,88 Sk |
| | |
| Prestavané v EUR bez DPH | 290 685,36 EUR |
| DPH | 55 230,22 EUR |
| Celkom: | 345 915,58 EUR |
| | |
| Zostatok v Sk bez DPH | 3 097 329,70 Sk |
| DPH | 588 492,64 Sk |
| Celkom: | 3 685 822,34 Sk |
| | |
| Zostatok v EUR bez DPH | 102 812,60 EUR |
| DPH | 19 534,40 EUR |
| Celkom: | 122 347,00 EUR |
| | |
| Cena celkom v Sk | 14 106 875,22 Sk |
| Cena celkom v EUR | 468 262,58 EUR |

VII. Ostatné ujednania

Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti. Tento dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 619/6131/2008; 92/2008/08411/S/R a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami


Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2 je:


| | |
|----------------------------------|---------|
| rekapitulácia rozpočtu čerpania: | 1 x A4 |
| zmena meny: | 18 x A4 |
| rozpočet s výkazom výmer: | 9 x A4 |
| doklady | 4 x A4 |

Bratislava, dňa 07. 05. 2009

Nitra, dňa 27. 04. 2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
- 20 -


Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava


Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 940 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
- 1 -

Rekapitulácia objektov stavby

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Stavba: Cesta I/51 a II/511 Vrábľe, križovatka - Dodatok č. 2
 Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC Bratislava
 Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

Dátum: 30.3.2009
 Projektant: CEMOS - projektová kancelária s.r.o.
 Spracoval:

| Kód | Základka | Cena bez DPH EUR | Cena bez DPH SKK | DPH EUR | Cena s DPH EUR | Cena s DPH SKK | ZRN EUR |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2008042b | Cesta I/51 a II/511 Vrábľe, križovatka - Dodatok č. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | SO-101 Okružná križovatka na ceste I/51 - dod.č.2, | 9 224,55 | 277 898,79 | 1 752,66 | 10 977,21 | 330 699,43 | 9 224,55 |
| 03 | SO-103 Dopravné značenie na ceste I/51 - dod.č.2, | 5 648,76 | 170 174,54 | 1 073,26 | 6 722,02 | 202 507,57 | 5 648,76 |
| 04 | SO-104 Dopravné značenie na ceste II/511 - dod.č.2 | -290,50 | -8 751,60 | -55,19 | -345,69 | -10 414,26 | -290,50 |
| 07 | SO-202 Rekonštrukcia vodovodu - dod.č.2 | 9 660,53 | 291 033,13 | 1 835,50 | 11 496,03 | 346 329,40 | 9 660,53 |
| 09 | SO-301 Sadové úpravy - dod.č.2 | -24 243,34 | -730 354,86 | -4 606,23 | -28 849,57 | -869 122,15 | -24 243,34 |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cesta I/51 a II/511 Vráble, križovatka - Dodatok č. 2

Objekt: SO-101 Okružná križovatka na ceste I/51 - dod.č.2

Časť:

Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC Bratislava

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: E. Bednár

Dátum: 30. 3. 2009

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------------|------------|--|--|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HSV | | HSV | | | | | 9 568,6360 |
| 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | 9 550,3280 |
| 1,221 | 911131111 | | Osadenie a montáž cestného zábradlia oceleového s ocelovými stĺpkami s jedným držadlom | m | -72,000 | 14,4400 | -1 039,6800 |
| | | | -72,00 | | -72,000 | | |
| 2,141 | 1411526001 | | Rúrka bezšvíková 11353.0 d40 hr 1,8 | m | -303,840 | 3,5849 | -1 089,2360 |
| | | | -303,840 | | -303,840 | | |
| 3,221 | 911131111 | | Osadenie a montáž cestného zábradlia oceleového s ocelovými stĺpkami pr. 3" | m | 123,000 | 19,5300 | 2 402,1900 |
| | F1 | | 71,00+52,00 | | 123,000 | | |
| 4,141 | 1413081500 | | Zábradlie oceleové D 3" - kompletná dodávka vrátane náterov | m | 123,000 | 75,4232 | 9 277,0540 |
| | F1 | | | | 123,000 | | |
| 99 | | Presun hmôt HSV | | | | | 18,3080 |
| 5,221 | 998225111 | | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živícnym akejkoľvek dĺžky objektu | t | 10,028 | 1,8257 | 18,3080 |
| PSV | | PSV | | | | | -344,0870 |
| 783 | | Dokončovacie práce - nátery | | | | | -344,0870 |
| 6,783 | 783225600 | | Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním | m2 | -71,000 | 3,3858 | -240,3920 |
| | | | -71,00 | | -71,000 | | |
| 7,783 | 783226100 | | Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný | m2 | -71,000 | 1,4605 | -103,6950 |
| | | | -71,00 | | -71,000 | | |
| | | Celkom | | | | | 9 224,5490 |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cesta I/51 a II/511 Vráble, križovatka - Dodatok č. 2

Objekt: SO-103 Dopravné značenie na ceste I/51 - dod.č.2

Časť:

Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC Bratislava

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: E. Bednár

Dátum: 30. 3. 2009

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----------|---------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | HSV | HSV | | | | 5 648,7590 |
| | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 5 628,0620 |
| 1 | 221 | 914001111 | Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty | kus | 4,000 | 25,8913 | 103,5650 |
| | | | -7 "Malá zn. 7ks*3,50m" | | -7,000 | | |
| | | | 11 "Veľká zn.3ks*3,50m+Malá zn.2*3,50m" | | 11,000 | | |
| | | | Súčet | | 4,000 | | |
| 2 | 404 | 404459600 | Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou | m | 14,000 | 13,9414 | 195,1800 |
| | | | -7*3,50 | | -24,500 | | |
| | | | 11*3,50 | | 38,500 | | |
| | | | Súčet | | 14,000 | | |
| 3 | 404 | 4044540101 | Značka dopravná príkazová reflexná AI C1 | kus | -1,000 | 64,7281 | -64,7280 |
| | | | -1 "Namiesto B35" | | -1,000 | | |
| 4 | 404 | 4044540900 | Značka dopravná príkazová reflexná AI C5a | kus | -3,000 | 55,7658 | -167,2970 |
| | | | -3 "2xC5a+1x namiesto C4b" | | -3,000 | | |
| 5 | 404 | 4044541000 | Značka dopravná príkazová reflexná AI C5b | kus | -1,000 | 55,7658 | -55,7660 |
| | | | -1 | | -1,000 | | |
| 6 | 404 | 4044560300 | Značka dopravná informačná reflexná AI D1a | kus | 1,000 | 43,8160 | 43,8160 |
| | | | +1 | | 1,000 | | |
| 7 | 404 | 4044561000 | Značka dopravná informačná reflexná AI D14 - N.P. | kus | 1,000 | 64,7281 | 64,7280 |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| 8 | 404 | 4044566100 | Značka dopravná informačná reflexná AI D37b (3500*2500mm) | kus | 3,000 | 1 865,3987 | 5 596,1960 |
| | | | 1+1+1 | | 3,000 | | |
| 9 | 404 | 4044560501 | Značka dopravná informačná reflexná AI D6a | kus | -2,000 | 43,8160 | -87,6320 |
| | | | -2 | | -2,000 | | |
| | | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 20,6970 |
| 10 | 221 | 9982251111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živícnym akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1,039 | 19,9200 | 20,6970 |
| | | Celkom | | | | | 5 648,7590 |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cesta I/51 a II/511 Vráble, križovatka - Dodatok č. 2

Objekt: SO-103 Dopravné značenie na ceste I/51 - dod.č.2

Časť:

Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC Bratislava

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: E. Bednár

Dátum: 30. 3. 2009

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|----------|---------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | HSV | HSV | | | | 5 648,7590 |
| | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 5 628,0620 |
| 1 | 221 | 914001111 | Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty | kus | 4,000 | 25,8913 | 103,5650 |
| | | | -7 "Malá zn. 7ks*3,50m" | | -7,000 | | |
| | | | 11 "Veľká zn.3ks*3,50m+Malá zn.2*3,50m" | | 11,000 | | |
| | | | Súčet | | 4,000 | | |
| 2 | 404 | 404459600 | Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou | m | 14,000 | 13,9414 | 195,1800 |
| | | | -7*3,50 | | -24,500 | | |
| | | | 11*3,50 | | 38,500 | | |
| | | | Súčet | | 14,000 | | |
| 3 | 404 | 4044540101 | Značka dopravná príkazová reflexná AI C1 | kus | -1,000 | 64,7281 | -64,7280 |
| | | | -1 "Namiesto B35" | | -1,000 | | |
| 4 | 404 | 4044540900 | Značka dopravná príkazová reflexná AI C5a | kus | -3,000 | 55,7658 | -167,2970 |
| | | | -3 "2xC5a+1x namiesto C4b" | | -3,000 | | |
| 5 | 404 | 4044541000 | Značka dopravná príkazová reflexná AI C5b | kus | -1,000 | 55,7658 | -55,7660 |
| | | | -1 | | -1,000 | | |
| 6 | 404 | 4044560300 | Značka dopravná informačná reflexná AI D1a | kus | 1,000 | 43,8160 | 43,8160 |
| | | | +1 | | 1,000 | | |
| 7 | 404 | 4044561000 | Značka dopravná informačná reflexná AI D14 - N.P. | kus | 1,000 | 64,7281 | 64,7280 |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| 8 | 404 | 4044566100 | Značka dopravná informačná reflexná AI D37b (3500*2500mm) | kus | 3,000 | 1 865,3987 | 5 596,1960 |
| | | | 1+1+1 | | 3,000 | | |
| 9 | 404 | 4044560501 | Značka dopravná informačná reflexná AI D6a | kus | -2,000 | 43,8160 | -87,6320 |
| | | | -2 | | -2,000 | | |
| | | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 20,6970 |
| 10 | 221 | 9982251111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým živičným akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1,039 | 19,9200 | 20,6970 |
| | | Celkom | | | | | 5 648,7590 |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cesta I/51 a II/511 Vráble, križovatka - Dodatok č. 2

Objekt: SO-104 Dopravné značenie na ceste II/511 - dod.č.2

Časť:

Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC Bratislava

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: E. Bednár

Dátum: 30. 3. 2009

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | HSV | HSV | | | | -290,5020 |
| | | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | -279,8250 |
| 1 | 221 | 914001111 | Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty | kus | -2,000 | 25,8913 | -51,7830 |
| | | | -2 | | -2,000 | | |
| 2 | 404 | 404459600 | Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou | m | -7,000 | 13,9414 | -97,5900 |
| | | | -2*3,50 | | -7,000 | | |
| 3 | 404 | 4044540101 | Značka dopravná príkazová reflexná AI C1 | kus | -1,000 | 64,7281 | -64,7280 |
| | | | -1 | | -1,000 | | |
| 4 | 404 | 4044540201 | Značka dopravná príkazová reflexná AI C2 | kus | -1,000 | 65,7240 | -65,7240 |
| | | | -1 | | -1,000 | | |
| | | 99 | Presun hmôt HSV | | | | -10,6770 |
| 5 | 221 | 9982251111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živícnym akejkoľvek dĺžky objektu | t | -0,536 | 19,9200 | -10,6770 |
| | | | Celkom | | | | -290,5020 |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cesta I/51 a II/511 Vrábľe, križovatka - Dodatok č. 2

Objekt: SO-202 Rekonštrukcia vodovodu - dod.č.2

Časť:

Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC Bratislava

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: E. Bednár

Dátum: 30. 3. 2009

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|--------|------------|-----------------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HSV | | HSV | | | | | 8 131,8280 |
| 1 | | Zemné práce | | | | | 1 983,4680 |
| 1.001 | 132201202 | F1 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 (12,00*1,10*1,80)+(29,20*1,10*1,60) "Predĺženie výkopu ryhy o 12m+29,20m" | m3 | 75,152 | 5,0621 | 380,4270 |
| 2.001 | 132201209 | F1*0,30 | Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3 | m3 | 22,546 | 18,5999 | 419,3530 |
| 3.001 | 151101101 | F2 | Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m 2*(12,00*(1,80-0,15))+2*(29,20*(1,60-0,15)) | m2 | 124,280 | 2,3236 | 288,7770 |
| 4.001 | 151101111 | F2 | Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m | m2 | 124,280 | 0,6141 | 76,3200 |
| 5.001 | 161101101 | F1*0,30 | Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m | m3 | 22,546 | 1,5933 | 35,9230 |
| 6.001 | 162701101 | | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m | m3 | 12,000 | 3,9169 | 47,0030 |
| 7.001 | 171201201 | | Uloženie sypaniny na skládky | m3 | 12,000 | 0,5975 | 7,1700 |
| 8.001 | 175101101 | F5 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 67,363 | 7,4354 | 500,8710 |
| | | F5a | (12,00*1,10*0,45)-(12,00*3,14*0,125*0,125) | | 5,351 | | |
| | | F5b | (29,20*1,10*0,15)-(29,20*3,14*0,055*0,055) | | 4,541 | | |
| | | F1-F6 | | | 57,471 | | |
| | | F5b | Súčet | | 67,363 | | |
| 9.583 | 5833725100 | F5b | Štrkopiesok 0-63 B | m3 | 9,892 | 6,1176 | 60,5150 |
| | | | | | 67,363 | | |
| | | | | | 9,892 | | |
| 10.001 | 175101109 | F5b | Príplatok k cene za prehodenie sypaniny | m3 | 9,892 | 4,8131 | 47,6110 |
| | | | | | 67,363 | | |
| | | | | | 9,892 | | |
| 11.R | 42.1 | 12 | Poplatok za skládku | m3 | 12,000 | 9,9582 | 119,4980 |
| | | | | | 12,000 | | |
| 4 | | Vodorovné konštrukcie | | | | | 195,4250 |
| 12.271 | 451573111 | F3 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm (12,00+29,20)*1,10*0,15 | m3 | 6,798 | 26,0240 | 176,9110 |
| | | | | | 6,798 | | |
| 13.271 | 452313111 | F4 | Podkladné konštr. v otv. výkope bloky z prostého betónu pre potrubie tr. B 7, 5 (zn. 0) 1*(0,50*0,50*0,50) | m3 | 0,125 | 93,9388 | 11,7420 |
| | | | | | 0,125 | | |
| 14.271 | 452353101 | | Debnenie blokov v otvorenom výkope pre potrubia | m2 | 1,000 | 6,7716 | 6,7720 |

| | | | | | | | |
|----|----------|-----------------------|---|-----|--------|----------|-------------------|
| | | 4*0,50*0,50 | | | 1,000 | | |
| | 8 | Rúrové vedenie | | | | | 5 660,8060 |
| 15 | 271 | 851361121 | Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 250 | m | 41,200 | 6,9043 | 284,4570 |
| | | F8 | 12,00+29,20 | | 41,200 | | |
| 16 | 552 | 5525113000 | Rúra liatinová tlaková hrdlová D 274 mm | m | 42,024 | 93,4741 | 3 928,1560 |
| | | | F8*1,02 | | 42,024 | | |
| 17 | 271 | 852242121 | Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 80 | kus | 2,000 | 9,2445 | 18,4890 |
| | | | 2 | | 2,000 | | |
| 18 | 552 | 5525212400 | Rúra liatinová tlaková prírubová D 80 dl 200 mm | kus | 2,020 | 39,0360 | 78,8530 |
| | | | 2 * 1,01 | | 2,020 | | |
| 19 | 271 | 857242121 | Montáž liatin. tvaroviek jednoosových z rúr prírubových DN 80 | kus | 1,000 | 6,3068 | 6,3070 |
| | | F10 | 1 | | 1,000 | | |
| | | F10z | 1 | | 1,000 | | |
| 20 | 552 | 5525568000 | Koleno prírubové D 80 mm | kus | 1,010 | 40,3306 | 40,7340 |
| | | | F10 * 1,01 | | 1,010 | | |
| 21 | 271 | 857363121 | Montáž liatin. tvaroviek odbočných z rúr hrdlových DN 250 | kus | 2,000 | 47,0690 | 94,1380 |
| | | | 1+1 | | 2,000 | | |
| 22 | 552 | 5525851000 | Tvar liat tlak prí r e dn 250 a | KUS | 1,010 | 189,4045 | 191,2990 |
| | | | 1*1,01 | | 1,010 | | |
| 23 | 552 | 55258510001 | Tvar liat tlak prí r f dn 250 a | KUS | 1,010 | 169,6209 | 171,3170 |
| | | | 1*1,01 | | 1,010 | | |
| 24 | 271 | 891241111 | Montáž vodovodných posúvačov s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 | kus | 1,000 | 10,7548 | 10,7550 |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| 25 | 422 | 4222388600 | Posúvač S 25-111-610 P 2, PN 6, D 80 mm | kus | 1,010 | 167,9612 | 169,6410 |
| | | | 1*1,01 | | 1,010 | | |
| 26 | 422 | 4229123000 | Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm | kus | 1,000 | 43,3845 | 43,3850 |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| 27 | 422 | 422537110 | Hydrant podzemný DN 80 | kus | 1,000 | 243,6434 | 243,6430 |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| 28 | 271 | 891369111 | Montáž navrtávacích pásov s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr azbest., liat., ocel., plast. DN 250 | kus | -1,000 | 22,6383 | -22,6380 |
| | | | -1 | | -1,000 | | |
| 29 | R | 422 | Navrtavací pás 250/2" | kus | -1,000 | 142,8002 | -142,8000 |
| | | | -1 | | -1,000 | | |
| 30 | 271 | 892372111 | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 | kus | 1,000 | 76,6780 | 76,6780 |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| 31 | 271 | 892381111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350 | m | 41,200 | 0,6473 | 26 6690 |
| | | | F8 | | 41,200 | | |
| 32 | 271 | 892383111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 250,300 alebo 350 | m | 41,200 | 8,0329 | 330,9550 |
| | | | F8 | | 41,200 | | |
| 33 | 271 | 899401112 | Osadenie poklopov liatinových posúvačových | kus | 1,000 | 13,2112 | 13,2110 |
| | | F21 | 1 | | 1,000 | | |
| 34 | 422 | 4229135200 | Poklop Y 4504 - posúvačový | kus | 1,000 | 21,9080 | 21,9080 |
| | | | F21 | | 1,000 | | |
| 35 | 271 | 899401113 | Osadenie poklopov liatinových hydrantových | kus | 1,000 | 26,4887 | 26,4890 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|---|-------|--------|----------|-------------------|
| | | 1 | | 1,000 | | |
| 36 422 | 4229133200 | Poklop Y 4522 - hydrantový | kus | 1,000 | 49,1602 | 49,1600 |
| | | 1 | | 1,000 | | |
| 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 0,0000 |
| 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 292,1290 |
| 37 271 | 998273101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené al. razené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvor.výkope | t | 19,557 | 14,9373 | 292,1290 |
| | M | M | | | | 1 528,7010 |
| 23-M | | Montáže potrubia | | | | 1 528,7010 |
| 38 923 | 230011155 | Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 D x t 426 x 10 | m | 3,700 | 9,5764 | 35,4330 |
| | F22 | 2,00+1,70 | | 3,700 | | |
| 39 143 | 1433051800 | Rúrka pozdĺžne zváraná 11343 D 426 hr. 10 | m | 3,700 | 165,5049 | 612,3680 |
| | | F22 | | 3,700 | | |
| 40 85 | 85.1 | Kĺzne dištančné objímky RACI typ. M/N-90, kód OOM 0090 | kus | 7,000 | 16,8625 | 118,0380 |
| | | 3+4 "Chránička dl.1,70m+2,00" | | 7,000 | | |
| | F23 | Súčet | | 7,000 | | |
| 41 R | 85.01 | Manžety na chráničku 110x200 | kus | 4,000 | 149,9701 | 599,8800 |
| | F24 | 2*(1+1) | | 4,000 | | |
| 42 R | 85.3 | KEBUTYL dvojpáskový systém C-50 C | kotúč | 1,000 | 162,9821 | 162,9820 |
| | | 1 | | 1,000 | | |
| Celkom | | | | | | 9 660,5290 |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cesta I/51 a II/511 Vrábľe, križovatka - Dodatok č. 2

Objekt: SO-301 Sadové úpravy - dod.č.2

Časť:

Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC Bratislava

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: E. Bednár

Dátum: 30. 3. 2009

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | |
|-----|-----|---------------|---|-----|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | HSV | HSV | | | | -24 243,3420 | |
| | | 2 | Zakladanie | | | | -442,0430 | |
| 1 | 011 | 272313521 | Betón základových konštrukcii prostý tr.B 15 (C 12/15) | m3 | -4,600 | 96,0964 | -442,0430 | |
| | | | -4,600 | | -4,600 | | | |
| | | 3 | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | -4 935,5850 | |
| 2 | 231 | 338950101 | Osadenie rady kolov v rovine alebo na svahu do 1:5 so zatlač. do bet., výšky kolov do 0,5 m | m | -49,400 | 54,7700 | -2 705,6380 | |
| 3 | 231 | 338950124 | Priplatok za smerové zakrivenie trasy za odklon do 45° a smerové zakrivenie trasy v oblúku | m | -49,400 | 32,0321 | -1 582,3860 | |
| 4 | 231 | 338950126 | Priplatok za šikmé zrezanie horných koncov kolov | m | -49,400 | 1,1950 | -59,0330 | |
| 5 | 020 | 0200 010 | Drevené palisády, hranolčeky (5x5x35-100cm), impregnované, červený náter | m3 | -1,800 | 326,9601 | -588,5280 | |
| | | 9 | Ostatné konštrukcie a práce | | | | -17 791,9310 | |
| 6 | R | 900 005 | Vodorovné premiestnenie umeleckého diela | km | -500,000 | 3,7177 | -1 858,8500 | |
| | | | -500 | | -500,000 | | | |
| 7 | 020 | 0200 009 | Umelecké sklenené dielo 1,2 x 1,5m s osadením do bet.lôžka-zemný hrad | kus | -1,000 | 15 933,0811 | -15 933,0810 | |
| | | | -1 | | -1,000 | | | |
| | | 99 | Presun hmôt HSV | | | | -1 073,7830 | |
| 8 | 231 | 998231311 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | -50,545 | 21,2441 | -1 073,7830 | |
| | | Celkom | | | | | | -24 243,3420 |

STAVBA: Cesta I/51 a II/511
križovatka Vrable

Denné záznamy stavby

List č.

Dátum

SO 202 Rekonštrukcia vodovodu.

10. 12. 2007

Záznam zhotoviteľa

- Na základe skutočnosti počas realizácii prakticky vodovodu TLT DN 250 v miestach budúcej križovatky boli vykonaní nasledujúce práce realizácie:
1. z dôvodu iného situovania pristupiaceho vodovodu a miesta pripojenia bolo nevyhnutní realizovať pripoj na konci vlnku v rýle na páte, čo predstavuje novobudovaný vodovod o oca 12m. Na pripoj bol použitý T kus 250/250 s usadením DN 210.
 2. Pripojka na obchody D 63 nebola na namierenom mieste, preto z dôvodu možnosti napojenia obchodu na vodovod je pripojka a vodovod vody D 110 uložený v chráničke DN 200 a položený cez celú križovatku a na konci je ukončený podzemným hrdlom v rýle na páte. Dĺžka HDPE D 110 je oca 19m.


Všetchní činnosti a rozhodnutia o nevyhnutných zmenách boli počas výstavby pojednávané aj s projektovou firmou ZS US a. s. Nitra p. Becár a aj p. Bako

Za dodávateľa
Ing. Štefan Damiel

Za inštatora

Za projektovateľa
p. Becár.

ŠPĽAVO SLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Činnosť zameraná na
vzdušný vzduch, Tel: 0371 515 751
10000, 0371 515 751
10000, 0371 515 751

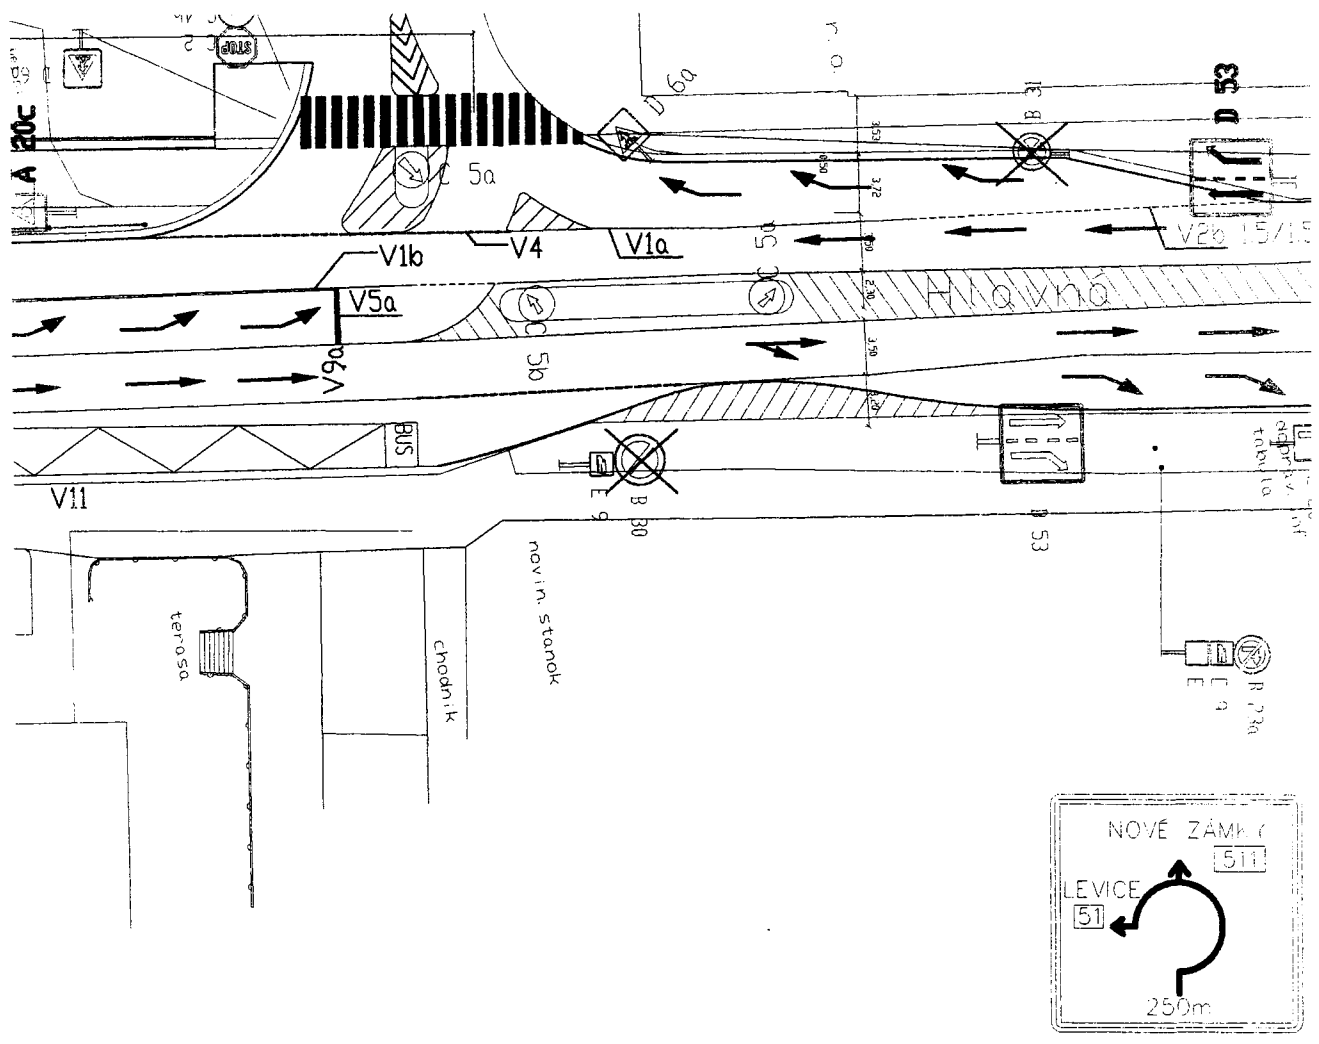

UMIESTNIŤ VO VZDIALENI
OKRUŽNEJ KRIŽOVATKY

Okresný dopravný inšpektorát v Liptove
 z dôvodu pracovných bezpečnosti a plynulosti
 CP požaduje predĺženie bezpečnostného zariadenia
 a DŽ D375, kde ako je to vyobrazené v predloženej
 návrhu.

Mgr. Ondrej Jurek
 Okresný dopravný inšpektorát v Liptove
