

**DODATOK č. 1  
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 27.6.2008**

**na zhotovenie stavby  
uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka  
a násl. v znení neskorších zmien a predpisov**

**Čl. I.  
ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ**

Názov organizácie

: **Pamiatkový úrad SR**

IČO

: 317 55 194

Sídlo organizácie

: Cesta na Červený most č. 6  
841 06 Bratislava

Štatutárny orgán

: PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

:

b) technických

:

c) vykonávať technický dozor investora

:

d) kontrolovať zhotovenie diela

:

v priebehu realizácie

:

e) prevziať dielo

:

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

:

Bankové spojenie

: Štátna pokladnica, Bratislava

číslo účtu

: 70 000 68 998/8180

číslo telefónu

: 02/54 77 12 77

e-mail

: sekret.epu@pamiatky.sk

Fax

: 02/54 77 58 68

**2. ZHOTOVITEĽ**

Názov organizácie

: **HRT s.r.o.**

IČO

: 314 327 35

DIČ

: 2020391648

Sídlo organizácie

: Skladová č. 3/691, 917 01 TRNAVA

zastúpený

:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

:

b) technických

:

c) stavbyvedúci

:

Bankové spojenie

: ISTROBANKA TRNAVA

číslo účtu

: 10006-2119080/4900

číslo telefónu

: 033/5545 620

Fax

: 033/5545 184

E-mail

: hrt@hrt.sk

Zapísaný v : OR OS TA odd. Sro vl. Č. 1271/T

## Čl. II.

Týmto dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len zmluvy) na zhotovenie stavby „Stavebné úpravy kaštieľa v Trnave – Kačerov majer – národná kultúrna památka“ uzatvorenej 27.6.2008 sa zmluvné strany v zmysle Čl. IV. Ods. 4.4. a Čl. XV. Ods. 15.3. dohodli na nasledovnej zmene a doplnení nižšie uvedených ustanovení zmluvy :

**Ods. 1** V Čl. II. Sa Predmet zmluvy dopĺňa o odsek 2.8 nasledovného znenia :

2.6. Predmetom tohto dodatku sú dodávky navyiac prác, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii a výkaze výmer a nebolo možné ich pri tvorbe ceny predvídať a ich potreba vyplynula z požiadaviek objednávateľa, z postupu stavebných prác a posúdenia jestvujúceho stavu odkrytých stavebných konštrukcií budovy. Predmetom tohto dodatku sú taktiež odpočty nezrealizovaných prác. Obsah prác je vyšpecifikovaný v prílohe č.1 – Krycí list rozpočtu – navyiac práce, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

**Ods. 2** Čl. IV. Cena diela zmluvy sa mení odsek 4.1. nasledovne :

Príloha č. 1 – Krycí list rozpočtu – navyiac práce bez DPH	446.745,30
Cena diela podľa zmluvy bez DPH	24 288 730,10
<hr/>	
Cena diela podľa Dodatku č. 1 bez DPH	24.735.475,40


Slovom : dvadsaťštyrimiliónovsemenstotridsaťpäťtisíšťtyristosedemdesiatpäť slovenských korún  
40/100

## Čl. III.

- 1.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 27.6.2008.
- 2.) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú tieto prílohy:
  - a) Príloha č. 1 – Krycí list rozpočtu – navyiac práce
- 3.) Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 27.6.2008, zmenami tohto Dodatku č. 1 nedotknuté, ostávajú v platnosti.
- 4.) Tento dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch (2) rovnopisoch dodatku. Každý rovnopis má platnosť originálu.
- 5.) Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok k Zmluve o dielo prečítali, uzatvorili ho slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho znením ho oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpísali.


V Bratislave dňa .....

V Trnave dňa *10.11.2008* .....

Objednávateľ: 

Pamiatkový úrad  
Slovenskej republiky  
Cesta na Červený most 6  
814 06 Bratislava  
-2-

.....

Zhotoviteľ: 

**HRT** s.r.o.

bná a obchodná spoločnosť  
ová 3. 917 01 TRNAVA  
1432735, DIČ: 2020391648  
Č DPH: SK2020391648  
- 10 -

.....

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy objektu Kačerov majer	JKSO	
Názov objektu	Dodatok č. 1	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Pamiatkový úrad SR	IČO	IČ DPH
Projektant		31755194	
Zhotoviteľ	HRT s.r.o.	31432735	SK 2020391648
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Hrušková	10.11.2008	

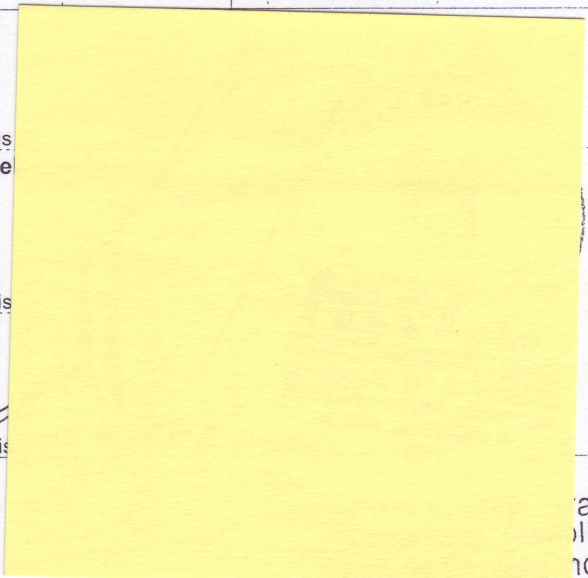
## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práca nadčas 0	13	Zariad. staveniska 0,00% 0
2	Montáž 278 657	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 15 761	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 152 319	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 446 737	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 8	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 446 745,30
<b>Objednávateľ</b>		24	19 % 446 745,30 DPH 84 881,60
Dátum a podpis		25	<b>Cena s DPH (ř. 23-24) 531 626,90</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochy a odpočty</b>
Dátum a podpis		26	Dodávky objednávateľa 0
		27	Kľzavá doložka 0
		28	Zvýhodnenie + - 0



814 06 Bratislava
