

4600000475

Zmluva o dielo č. HP08/051 na Zabezpečenie prechodu vybraných informačných systémov riadenia verejných financií na euro

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Galvaniho 7, P.O. Box 43

821 04 Bratislava

IČO: 357 853 06,

IČ DPH: SK2020213393

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.

Číslo účtu: 1464046853/0200

zastúpená: Ing. Peter Weber, generálny riaditeľ,

konajúca: Ing. Igor Zeman, konateľ

zapísaný v OR SR, vložka č. 21438/B, oddiel Sro, u Okresného súdu Bratislava I
(ďalej "Zhotoviteľ")

a

Slovenská republika

zastúpená

Ministerstvom financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava 15

Slovenská republika

IČO: 00151742

IČ DPH: Ministerstvo financií Slovenskej republiky nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Štátna pokladnica,

Číslo účtu: 7000001400/8180

Ktorú zastupuje: Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

(ďalej "Objednávateľ")

uzavreli v zmysle súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka, Autorského
Zákona a Zákona o verejnom obstarávaní nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka
túto

zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok rokovacieho konania bez zverejnenia, uskutočneného podľa § 58 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dielo, ktorým je rozšírenie funkčnosti Informačného systému štátnej pokladnice o Zabezpečenie prechodu vybraných informačných systémov riadenia verejných financií na euro.

1 Predmet zmluvy

- 1.1 Zhotoviteľ sa v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve zaväzuje vytvoriť a implementovať dielo popísané ako „Zabezpečenie prechodu vybraných informačných systémov riadenia verejných financií na euro“ (ďalej označované tiež ako „dielo“), v súlade so špecifikáciou uvedenou v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zoznam skratiek používaných v tejto zmluve je uvedený v Prílohe č. 1.
- 1.2 Zhotoviteľ ako súčasť diela poskytne plnenia pre nasledovné informačné systémy:
 - 1.2.1 Bankové aplikácie IS SŠP: ManEx, AccoMan, PayEx, PlarEx a FlexMan,
 - 1.2.2 SAP aplikácie IS SŠP: SAP R/3 moduly FI, AM, FM, MM, HR a IIM a Výkazníctvo ŠP (SAP BW),
 - 1.2.3 IS ESO – moduly SAP R/3 FI, AM, CO, FM, MM, HR,
 - 1.2.4 AC KSK – moduly SAP R/3 FI, AM, CO, FM, HR, modul BW, modul Riadenie rozpočtu,
 - 1.2.5 Platobné portály - modul Platobný portál KSK a NSK,
 - 1.2.6 Wallstreet Suite (WSS),
 - 1.2.7 ACIS – Účtovníctvo príjmového cyklu kapitoly VPS,
 - 1.2.8 Integračná platforma SAP XI,a to podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.
- 1.3 Zhotoviteľ dielo vykoná pre funkcionality platnú v deň podpisu tejto Zmluvy. Špecifikácia diela bude spresnená v projektovom výstupe Detailná funkčná špecifikácia. Pre zamedzenie pochybností sa stanovuje, že v prípade rozporu medzi Prílohou č. 1 a Detailnou funkčnou špecifikáciou bude mať vždy prednosť špecifikácia diela podľa Detailnej funkčnej špecifikácie.
- 1.4 Dielo bude v súlade so slovenskými právnymi predpismi upravujúcimi prechod na euro, účinnými ku dňu akceptácie Detailnej funkčnej špecifikácie. Ak po akceptácii Detailnej funkčnej špecifikácie dôjde k zmene takých právnych predpisov, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmene diela a ceny v súlade s postupmi (procedúrami) zmenového konania podľa článku 15 tejto zmluvy, inak bude dielo vyhotovené v súlade s Detailnou funkčnou špecifikáciou.
- 1.5 Každé čiastkové plnenie diela sa bude považovať za dokončené po jeho akceptácii. Zmluvné strany o tom podpíšu čiastkový akceptačný protokol. Dielo ako celok sa bude považovať za dokončené po akceptácii posledného čiastkového plnenia. Zmluvné strany o tom podpíšu akceptačný protokol, ktorým potvrdia funkcionality diela v súlade so zadáním, t.j. vyhotovenie a odovzdanie diela v súlade so zmluvou a jej špecifikáciou.
- 1.6 Objednávateľ sa zaväzuje dielo (čiastkové plnenie) prevziať a zaplatiť cenu diela podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 1.7 Predmetom plnenia Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy nie je:
 - a) Dodávka akýchkoľvek licencií, inštalčných médií a dokumentácie k produktom,
 - b) Dodávka a inštalácia akejkoľvek HW platformy a systémového SW,
 - c) Podpora ročnej účtovnej uzávierky,

- d) Podpora produktívnej prevádzky po nasadení nových verzií na produktívny systém.

2 Cena

- 2.1 Cena za dielo podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vzájomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.
- 2.2 DPH bude Zhotoviteľom účtovaná v súlade s právnymi predpismi účinnými v čase vystavenia faktúry.
- 2.3 Celková cena za plnenie poskytnuté Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy je:
- o **114 100 000 Sk** (slovom jednostoštrnásť miliónov jednosto tisíc slovenských korún) bez DPH,
 - o 19% DPH je **21 679 000 Sk** (slovom dvadsaťjeden miliónov šesťstosedemdesiatdeväť tisíc slovenských korún) a
 - o **135 779 000 Sk** (jednostotridsaťpäť miliónov sedemstosedemdesiatdeväť tisíc slovenských korún) s DPH.

Cenová sumarizácia predmetu diela podľa tejto zmluvy je uvedená v Prílohe č. 2.

- 2.4 Cena podľa článku 2 bodu 2.3. vyššie môže byť upravená (zvýšená alebo znížená) len za predpokladu, že nastanú nasledujúce skutočnosti:
- 2.4.1 zmena sadzby DPH, cla a dovozných prirážok alebo akýchkoľvek iných daní, poplatkov alebo dávok ukladaných štátnymi orgánmi Slovenskej republiky vzťahujúcich sa na predmet plnenia Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, alebo
- 2.4.2 zmenové konanie v súlade s procedúrou zmenového konania podľa tejto zmluvy, pokiaľ také zmenové konanie má dosah na cenu.
- 2.5 V prípade, že v zmysle súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky sa menou Slovenskej republiky stane euro, bude cena diela počínajúc dňom účinnosti takých predpisov, hradená v eurách za použitia konverzného kurzu stanoveného takými predpismi.
- 2.6 Všetky zmeny ceny musia byť upravené v dodatku k tejto zmluve, okrem úpravy ceny podľa predchádzajúceho bodu 2.5.

3 Platba ceny a platobné podmienky

- 3.1 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, cena za plnenie Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (alebo jej časť) bude splatná v deň akceptácie príslušného čiastkového plnenia.
- 3.2 Cena za dielo bude Objednávateľom uhradená výlučne Zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy v príslušnej časti vždy po akceptácii príslušného čiastkového plnenia Zhotoviteľa v súlade s platobným kalendárom špecifikovaným v Prílohe č. 2 k tejto zmluve.

- 3.3 Podkladom pre zaplataenie ceny bude faktúra, vystavená Zhotoviteľom v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vždy po akceptácii čiastkového plnenia. Faktúry budú splatné vždy do 30 dní od dátumu ich doručenia Objednávateľovi alebo do 35 dní odo dňa vystavenia, podľa toho, čo nastane skôr. Zhotoviteľ sa však zaväzuje doručiť každú faktúru do 5 dní odo dňa jej vystavenia.
- 3.4 Ak bude faktúra obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, má Objednávateľ právo v lehote splatnosti faktúru vrátiť Zhotoviteľovi s uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov. Zhotoviteľ daňový doklad – faktúru opraví, alebo vystaví novú a doručí Objednávateľovi. Dňom vystavenia takej opravnej alebo novo-vystavenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti.
- 3.5 Všetky platby ceny za plnenia Zhotoviteľa budú poukázané v prospech Zhotoviteľa na jeho účet uvedený v záhlaví zmluvy alebo písomne oznámený účet najneskôr s doručením faktúry a musia byť v plnej výške, neznížené o akékoľvek bankové poplatky alebo iné náklady spojené s prevodom.
- 3.6 Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky platby ceny budú vykonané v slovenských korunách.
- 3.7 Zhotoviteľ môže prerušiť plnenie, ak Objednávateľ ani po písomnom upozornení neuhradí akúkoľvek splatnú čiastku podľa tejto zmluvy ani v náhradnej lehote určenej Zhotoviteľom v takom upozornení.

4 Omeškanie a sankcie

- 4.1 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinnosti odovzdať Objednávateľovi dielo alebo jeho časť, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny tej časti diela alebo jeho časti vrátane DPH, s ktorou je v omeškaní. V prípade, že sa omeškanie bude týkať termínu odovzdania celého diela, vypočíta sa taká zmluvná pokuta z jeho celej hodnoty zníženej o hodnotu jeho prevzatých čiastkových plnení a zmluvná pokuta sa zníži o výšku zmluvných pokút za omeškanie Zhotoviteľom už uhradených.
- 4.2 Ak je Objednávateľ v omeškaní s platbou, uhradí Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej čiastky vrátane DPH, s ktorou je v omeškaní.
- 4.3 Celková suma všetkých zmluvných pokút, ktoré bude mať Zhotoviteľ povinnosť zaplatiť podľa tejto Zmluvy neprekročí 5 % z ceny diela s DPH. Na zmluvné pokuty nad tento limit sa nebude prihliadať.
- 4.4 Žiadna zo zmluvných strán nebude v omeškaní a zmluvná pokuta ani úrok z omeškania neprináleží, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, alebo ak omeškanie vzniklo úplne alebo čiastočne okolnosťami na strane oprávnenej zmluvnej strany alebo inak mimo kontrolu povinnej strany.
- 4.5 Ak by došlo k omeškaniu s plnením v dôsledku nepredvídateľných okolností alebo v dôsledku príčin, ktoré sú Zhotoviteľom neovplyvniteľné, je Zhotoviteľ oprávnený primerane predĺžiť všetky zjednané lehoty plnenia

bez ďalších dôsledkov, okrem zmeny konečného termínu ukončenia diela, ktorého zmena bude vykonaná na základe písomného dodatku k zmluve.

5 Termíny plnenia

- 5.1 Dielo bude Objednávateľovi odovzdané po etapách (čiastkových plneniach) v termínoch pre jednotlivé čiastkové plnenia ako to vyplýva z Harmonogramu plnenia dodávky uvedeného v Prílohe č. 3 k tejto zmluve (ďalej tiež len „Harmonogram“). Zmluvné strany sa dohodli na postupnom čiastkovom plnení diela v etapách (čiastkových plneniach) ako je to vyznačené v Harmonograme.
- 5.2 Dodržanie Harmonogramu je závislé na včasnom a riadnom splnení si povinností Objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, spočívajúcich predovšetkým v zaistení a poskytnutí všetkých primeraných informácií, dokumentácie, potvrdení a povolení, ktoré sú potrebné, alebo odôvodnene požadované Zhotoviteľom, ako i v poskytnutí ďalšej primeranej súčinnosti podľa Prílohy č. 4. Ak si Objednávateľ nebude plniť svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, bude Zhotoviteľ oprávnený primerane predĺžiť (oddialiť) termíny svojho plnenia alebo implementácie diela alebo jeho jednotlivých častí.
- 5.3 Bez ohľadu na uvedené, ak sa termíny plnení a lehoty uvedené v Harmonograme či inde v tejto zmluve zmenia na základe výsledkov detailnej funkčnej analýzy, tieto budú upravené v súlade s výsledkami detailnej analýzy vytvorenej v zmysle tejto zmluvy písomným dodatkom k zmluve.

6 Miesto plnenia

Miesta plnenia sú:

- Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
- Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
- Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, Radlinského 32, 813 19 Bratislava 15, Slovenská republika
- Datacentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, Slovenská Republika
- Colné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava
- Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika
- Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, Slovenská republika

7 Inštalácia a príprava testovacieho prostredia

- 7.1 Pred inštaláciou aplikácií vykonávanou Zhotoviteľom je Objednávateľ povinný zabezpečiť prípravu hardvérového vybavenia testovacieho prostredia s pokynmi vydanými Zhotoviteľom, ktoré musia byť Zhotoviteľom vydané v dostatočnom časovom predstihu, ktorý umožní Objednávateľovi splniť uvedený záväzok. Objednávateľ zabezpečí, že testovacie prostredie bude mať porovnateľné výkonnostné parametre ako produktívne prostredie. Zoznam požiadaviek na testovacie prostredie je

uvedený v Prílohe č. 4 – Požadovaná súčinnosť zo strany Objednávateľa v časti „Požiadavky na hardvérovú infraštruktúru testovacieho prostredia“.

8 Všeobecné požiadavky na Softvér a jeho komponenty

- 8.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je nositeľom užívacieho alebo autorského práva k plneniam vytvoreným Zhotoviteľom v rámci tejto zmluvy, spĺňajúcim znaky autorského diela podľa autorského zákona (ďalej tiež označované ako „Softvér“), alebo ich komponentom alebo je oprávnený na ich poskytnutie Objednávateľovi. Ak by sa toto vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé, alebo nesprávne, Zhotoviteľ musí bezodkladne získať chýbajúce práva, alebo právne chybné časti nahradiť právne bezchybnými a v prípade, že nebude možné túto podmienku splniť, Zhotoviteľ bude povinný vrátiť Objednávateľovi už zaplatenú cenu za Softvér alebo jeho komponenty s právnymi vadami a nahradiť škodu, ktorá tým Objednávateľovi vznikla. Ustanovenia predchádzajúcej vety sa použijú len za predpokladu splnenia podmienok uvedených v článku 17 (Zodpovednosť za právne vady) tejto Zmluvy.

9 Práva duševného vlastníctva

- 9.1 Zaplacením ceny čiastkového plnenia získava Objednávateľ právo používať Softvér, alebo jeho komponenty, dokumentáciu, know-how, ktoré boli poskytnuté Zhotoviteľom Objednávateľovi ako súčasť takého čiastkového plnenia, a to bez časového obmedzenia (po dobu trvania autorských práv) a inak v súlade s touto zmluvou.
- 9.2 Objednávateľ sa zaplacením dohodnutej ceny stane oprávneným používať Softvér a jeho komponenty na svojich pracovných staniciach a serveroch a pracovných staniciach klientov. Právo použitia Softvéru je však obmedzené počtom zakúpených licencií.
- 9.3 Softvér bude v rámci plnenia tejto zmluvy poskytovaný na užívanie za podmienok stanovených jeho majiteľom a v prípade Softvéru Zhotoviteľa, za podmienok stanovených jeho materskou spoločnosťou.
- 9.4 Práva používania Softvéru
- a) Pojem "Užitie" alebo „Užívanie“ sa v tejto časti tejto zmluvy využíva iba pre uloženie, nahrávanie, inštaláciu, spustenie, alebo zobrazovanie Softvéru na počítači, procesore či kontroléri a pre obstarávanie kópie pre účely archivačné alebo zálohovacie (backup).
 - b) Ak nie je Zhotoviteľom stanovené inak, Objednávateľ môže vytvárať kópie, alebo úpravy Softvéru len pre účely archivácie, alebo ak je kopírovanie či úprava nutným krokom pri oprávnenom Užívaní Softvéru na záložnom Zariadení za predpokladu, že tieto kópie a úpravy nie sú využívané iným spôsobom, a ďalej za predpokladu, že Užívanie na záložnom Zariadení je ukončené v okamžiku, keď pôvodné, alebo náhradné zariadenie začne pracovať.
 - c) Objednávateľ nebude spätne rozkladať (disasemblovať) ani spätne prekladať (dekompilovať) Softvér bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa. Objednávateľ nebude dešifrovať Softvér, ak to nie je nevyhnutne potrebné pre legitímne užívanie Softvéru. Objednávateľ je povinný na požiadanie Zhotoviteľa poskytnúť akékoľvek jemu známe informácie týkajúce sa prípadných

Objednávateľom vykonaných disasemblácií či dekompilácií.

- d) Poskytnuté užívacie práva k Softvéru sú ako celok prevoditeľné len po predchádzajúcom písomnom súhlase Zhotoviteľa.
 - e) Zhotoviteľ môže ukončiť Objednávateľovo užívacie právo k Softvéru, ak Objednávateľ ani po predchádzajúcom písomnom upozornení nenapraví neplnenie akejkoľvek príslušnej licenčnej podmienky. Okamžite po ukončení bude Softvér a všetky kópie Softvéru zničené alebo vrátené Zhotoviteľovi. Kópie Softvéru, ktoré sú začlenené do Produktov, s výnimkou jednotlivých dát v Objednávateľovej databáze, budú odstránené a zničené alebo vrátené Zhotoviteľovi. S písomným súhlasom Zhotoviteľa si môže Objednávateľ po skončení ponechať jednu kópiu Softvéru výhradne pre archivačné účely.
 - f) Užívanie Softvéru a dokumentácie, dodanej v rámci plnenia tejto zmluvy, sa bude riadiť príslušnými licenčnými podmienkami, ktoré budú dodané spolu s takým Softvérom alebo dokumentáciou. Na ustanovenia licenčných podmienok, ktoré budú v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, sa nebude prihliadať.
- 9.5 Softvér, ktorý nenesie značku vlastnenú materskou spoločnosťou Zhotoviteľa a softvér, ktorý nebol vytvorený Zhotoviteľom v rámci plnenia tejto zmluvy (ďalej tiež ako „softvér tretej strany“), podlieha licenčným podmienkam stanoveným jeho majiteľom.
- 9.6 Dokumentácia, schémy, skúšobné zariadenie, softvér (pre ktorý nebola udelená licencia) a príslušné nosiče dát používané pracovníkmi Zhotoviteľa v mieste inštalácie zostávajú výlučným vlastníctvom Zhotoviteľa a sú pre jeho výhradné použitie. Nosiče dát používané pracovníkmi Zhotoviteľa, ktoré ostávajú výlučným vlastníctvom Zhotoviteľa, nesmú obsahovať údaje Objednávateľa a/alebo MF SR, vrátane ich know-how, ibaže je to potrebné pre plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
- 9.7 Plnenie splňujúce znaky autorského diela v zmysle Autorského zákona, ako je napr. Softvér, dokumentácia Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, výukové materiály a pod. (ďalej tiež len „autorské dielo“), nesmie byť kopírované ani poskytované bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa, pokiaľ nie je v tejto zmluve ustanovené inak.
- 9.8 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo autorské a práva duševného alebo hmotného vlastníctva na všetku dodanú dokumentáciu a na akýkoľvek vývoj alebo produkty, ktoré vzniknú z jeho služieb.

10 Dokumentácia, jazyk

- 10.1 Dokumentácia odovzdávaného diela pri používateľskom softvéri (aplikačnom programovom vybavení) sa bude skladať z testovacích scenárov a aktualizácie používateľskej príručky. Zhotoviteľ ju odovzdá ku každému komponentu diela alebo jeho časti.
- 10.2 Aktualizácia používateľskej príručky bude vyhotovená v slovenskom jazyku. Ďalšia dokumentácia môže byť v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.
- 10.3 Aktualizácia používateľskej príručky bude dodaná v elektronickej forme vo formáte Adobe Acrobat.

- 10.4 Objednávateľ je oprávnený celú dokumentáciu k dodávanému riešeniu pre vlastnú potrebu bez obmedzení kopírovať a používať.

11 Akceptácia a preberacie konanie

- 11.1 Preberanie čiastkových plnení sa bude vykonávať v postupných krokoch v súlade s etapami a termínmi špecifikovanými v Prílohe č. 2 k tejto zmluve.
- 11.2 Dielo alebo časť diela dodané Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy sa vždy bude považovať za akceptované (dôjde k akceptácii), plnenie Zhotoviteľa sa bude považovať za riadne poskytnuté, a práva a povinnosti strán sa upravujú, ako keby došlo k akceptácii diela (jeho časti), ak Objednávateľ dielo (alebo jeho časť) použije v živej prevádzke.
- 11.3 Pre preberanie plnení Zhotoviteľa podliehajúcich preberacím testom (označovaným tiež ako „akceptačné testy“) sa uplatní postup uvedený v tomto bode 11.3:
- 11.3.1 Zhotoviteľ aspoň päť pracovných dní vopred vyrozumie Objednávateľa o započatí preberacieho konania danej časti plnenia. Po úspešnom ukončení preberacieho konania bude Zhotoviteľ mať povinnosť vyhotoviť príslušný preberací protokol (ďalej tiež ako „akceptačný protokol“).
- 11.3.2 Pokiaľ nie je alebo nebude dohodnuté inak, preberanie čiastkových plnení, podliehajúcich preberacím testom, sa uskutoční na základe kladného výsledku preberacieho testu čiastkového plnenia, ktorý bude dohodnutý medzi stranami tak, aby tento čo najjednoduchším spôsobom preukazoval existenciu dohodnutých vlastností predmetnej časti diela, pričom test funkčnosti bude spočívať v preskúšaní, či predmetná časť diela spĺňa funkcie špecifikované v Prílohe č.1 k tejto zmluve a nevykazuje vady znemožňujúce alebo podstatne obmedzujúce prevádzkovanie informačných systémov ohľadom ktorých sú poskytované plnenia podľa tejto Zmluvy.
- 11.3.3 Vady, ktoré budú zrejmé pri preberaní plnení, budú odstránené na náklady Zhotoviteľa bez zbytočného omeškania pred ukončením predmetného preberacieho testu. Úspešnou realizáciou preberacích testov posledného čiastkového plnenia diela, sa dielo ako celok považuje za odovzdané a prevzaté (akceptované).
- 11.3.4 Ak sa Objednávateľ nezúčastní na preberacích testoch jednotlivých čiastkových plnení, na ktorých vykonanie ho Zhotoviteľ včas písomne pozval, preberacie testy vykoná Zhotoviteľ aj bez účasti Objednávateľa a výsledok preberacích testov sa zachytí v zápisnici podpísanej zástupcami Zhotoviteľa a namiesto Objednávateľa podpíše zápisnicu hodnoverná a nestranná osoba, ktorá sa na skúškach zúčastnila.
- 11.3.5 Ak nie je možné vykonať preberacie testy v stanovenom termíne z dôvodov, ktoré nie sú na strane Zhotoviteľa, platí, že k akceptácii plnenia určeného na testovanie došlo uplynutím tridsiateho dňa po stanovenom termíne testov.

- 11.4 Akceptácia (prevzatie) každého čiastkového plnenia bude obojstranne písomne potvrdená čiastkovými akceptačnými protokolmi. Akceptácia diela ako celku (finálna akceptácia) bude obojstranne potvrdená záverečným akceptačným protokolom.
- 11.5 Oprávnenými osobami na podpisovanie akceptačných protokolov sú:
za MF SR:
za HP:
- 11.6 Vo všetkých prípadoch, v ktorých sa vyžaduje obojstranné podpísanie protokolu, môže ktorákoľvek zmluvná strana odmietnuť podpísanie protokolu iba písomne, s uvedením oprávnených dôvodov, ktoré predstavujú porušenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Toto písomné odôvodnenie bude zmluvná strana povinná doručiť druhej zmluvnej strane do päť dní odo dňa pôvodného termínu na podpísanie protokolu. Pokiaľ nebude protokol podpísaný a nebudú druhej zmluvnej strane do päť dní doručené také dôvody, protokol sa považuje za podpísaný s tým, že účinky podpísaného protokolu nastali dňom pôvodného termínu na podpísanie protokolu.
- 11.7 Popis akceptácie a preberania diela alebo jeho časti podliehajúcej preberacím testom, je uvedený v Prílohe č. 5.
- 11.8 Akceptačné podmienky dohodnuté podľa tejto zmluvy vyššie sa nepoužijú na hardvérové výrobky a výrobky operačných systémov a iného softvéru vytvorené pred uzavretím tejto zmluvy (ďalej označované spoločne ako „Výrobky“), ktoré majú byť dodané podľa tejto zmluvy alebo iných zmlúv za účelom použitia s iným plnením zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (najmä službami a aplikačným softvérom). Také Výrobky sa bez ohľadu na iné ustanovenia budú považovať za riadne poskytnuté a prevzaté ich dodaním, a po takej ich dodávke objednávateľ nebude mať právo na žiadnu zľavu alebo vrátenie, ani na nezaplatenie alebo vrátenie už uhradenej časti ceny, ktorá zodpovedá Výrobkom takto dodaným, ani na žiadnu sankciu v súvislosti s takými Výrobkami. Ustanoveniami tohto bodu 11.8 nie sú dotknuté nároky Objednávateľa zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a zo záruky podľa tejto Zmluvy.

12 Exportné predpisy

- 12.1 Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že služby dodané v zmysle tejto zmluvy môžu za istých okolností podliehať predpisom o kontrole vývozu, ktorými je Zhotoviteľ a/alebo jeho materská spoločnosť viazaná. Také predpisy sa môžu týkať exportu a reexportu Služieb a technických údajov Zhotoviteľa a tretej strany poskytovaných podľa tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať tieto predpisy pri dovoze a prípadnom opätovnom vývoze kontrolovaného tovaru a technických dát dodaných Zhotoviteľom. Takýto záväzok sa bude vzťahovať tiež na technické informácie priamo získané z kontrolovaného tovaru dodaného podľa tejto zmluvy.
- 12.2 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy, v prípade, že to vyžaduje zákon, plnenie Zhotoviteľa môže byť poskytnuté jedine za predpokladu, že

Zhotoviteľovi budú udelené dovozné a vývozné oprávnenia, ak sú tieto potrebné podľa zákona.

- 12.3 Je výhradnou povinnosťou Objednávateľa, aby vyhovel platným reexportným predpisom. Objednávateľ sa zaväzuje nevyviesť plnenia dodané Zhotoviteľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa. Taký súhlas nebude bezdôvodne odoprený.

13 Bezpečnosť zamestnancov

- 13.1 Zamestnanec Objednávateľa bude vždy sprevádzať pracovníkov Zhotoviteľa, pokiaľ sa títo budú zdržiavať v priestoroch Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Objednávateľ prijme všetky primerané opatrenia pre ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov Zhotoviteľa vo svojich priestoroch a pracovníci Zhotoviteľa (t.j. osoby pracujúce na základe poverenia Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov na plnení záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ďalej tiež ako „pracovníci Zhotoviteľa“) musia dodržiavať všetky platné predpisy pre ochranu zdravia a bezpečnosti, s ktorými boli preukázateľne oboznámení.

14 Záruky

Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, záväzky Zhotoviteľa v súvislosti s vadami jeho plnenia alebo zárukou za akosť či inou zárukou na dielo budú v rozsahu v súlade s ustanoveniami tohto článku 14. Za „vadu“ sa považuje nesúlad plnenia Zhotoviteľa s touto zmluvou, za ktorý zodpovedá Zhotoviteľ. V tejto zmluve sa pod pojmi ako „chyba“ alebo „odchýlka“ a pod. rozumie vada.

- 14.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo ako celok a Softvér, tvoriaci súčasť predmetu diela, záruky v nasledujúcom rozsahu po záručnú dobu 24 mesiacov s tým, že taká záručná doba sa počíta odo dňa finálnej akceptácie plnenia.
- 14.2 Záruka sa poskytuje na dielo, ako bolo dodané na základe tejto zmluvy, s tým, že pokiaľ bude dielo zmenené Objednávateľom alebo akoukoľvek treťou stranou, záruka sa končí. Pokiaľ však dôjde k zmene diela Zhotoviteľom na základe požiadavky Objednávateľa, zmluvné strany sa dohodnú na nových podmienkach záruky na takú zmenu diela.
- 14.2.1 Zhotoviteľ zaručuje, že nedôjde k nespusteniu, alebo k chybné prevádzke programových inštrukcií Softvéru v dôsledku chyby v materiáli a spracovaní pri správnej inštalácii a používaní na zariadení určenom Zhotoviteľom. Ak bude Zhotoviteľ upozornený na takéto chyby v priebehu záručnej doby, poskytne bezplatný servis, v rámci ktorého tieto chyby buď opraví alebo nahradí tie softvérové média, ktoré v dôsledku vyššie uvedených porúch programovacie pokyny nevykonávajú.
- 14.2.2 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že z hľadiska súčasného stavu techniky nie je možné úplne vylúčiť poruchy jednotlivých produktov.
- 14.3 Záruka sa nevzťahuje na vady diela alebo jeho časti vzniknuté v dôsledku:
- a) nevhodnej alebo nesprávnej údržby, alebo kalibrácie produktov a/alebo diela zo strany Objednávateľa alebo ním poverených osôb, alebo iných osôb neschválených Zhotoviteľom;

- b) nesprávneho, alebo neadekvátneho používania produktov a/alebo diela; t.j. používania, ktoré je v rozpore s pokynmi k používaniu daných produktov a/alebo diela obsiahnutými v Zhotoviteľom dodanej dokumentácii alebo v dokumentácii výrobcu produktov alebo s tým čo je pre používanie daných produktov a/alebo diela obvyklé;
 - c) neautorizovanej modifikácie, operácie, opravy, alebo využitia produktov a/alebo diela;
 - d) využitia produktov a/alebo diela v prostredí inom, než dodanom, alebo odporúčenom Zhotoviteľom;
 - e) nesprávnej prípravy a údržby miesta využívania produktov a/alebo diela alebo ich častí;
 - f) použitia softvéru, rozhraní, alebo náhradných dielov nedodaných, alebo neodporúčených Zhotoviteľom, alebo zo vzájomnej neznášanlivosti medzi takým softvérom, rozhraním, alebo náhradným dielom a produktom dodaným Zhotoviteľom;
 - g) zneužitia, nedbalosti, straty, alebo poškodenia pri preprave zo strany iných osôb ako Zhotoviteľa;
 - h) zásahu pracovníka tretej strany do diela.
- 14.4 Nároky Objednávateľa na poskytnutie záruky zodpovedajú povinnostiam Zhotoviteľa podľa článku 14 tejto zmluvy.
- 14.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za chyby softvéru tretích strán je obmedzená na rozsah v súlade s podmienkami stanovenými treťou stranou, ktorá taký softvér vlastní a ktoré sú uvedené na jeho obale alebo sú jeho súčasťou.
- 14.6 Zhotoviteľ nemá žiadne povinnosti v súvislosti so zárukou alebo vadami svojho plnenia podľa tejto zmluvy nad rámec záruk a iných záväzkov výslovne uvedených v tejto zmluve.

15 Zmenové konanie

- 15.1 Pokiaľ nie je stanovené inak v tejto zmluve, zmeny v rozsahu dodávky diela Zhotoviteľa budú dohodnuté dodatkami k tejto zmluve a inak v súlade s postupmi a podmienkami uvedenými v Prílohe č. 6 – Riadenie zmien. Také postupy (Procedúry) sa použijú na akúkoľvek bežne požadovanú zmenu ktoroukoľvek stranou tejto zmluvy. Žiadna zmena rozsahu dodávky nebude účinná dokiaľ nebude dohodnutá v súlade s touto zmluvou.
- 15.2 Ak dôjde k dohode o zmene projektu a z toho vyplývajúcich zmien podmienok dodávky, riadi sa zmenený projekt tam, kde nebolo dohodnuté inak, pôvodnými ustanoveniami tejto zmluvy.
- 15.3 Zhotoviteľ bude realizovať zmeny či doplnky v projekte iba v tom prípade, že bude dosiahnutá dohoda v otázkach zmien termínov a zvýšenia či zníženia ceny projektu, alebo ďalších podmienok zmeneného plnenia Zhotoviteľa. Bez ohľadu na iné ustanovenia, v prípade zmeny inej ako menšieho rozsahu (ako je táto definovaná v Prílohe č. 6), bude zmena realizovaná až na základe samostatného postupu, výsledkom ktorého bude uzavretie písomného dodatku, alebo, ak tak rozhodne Objednávateľ, samostatnej zmluvy na také zmenené plnenie.

16 Obmedzenie náhrady škody

- 16.1 V rozsahu stanovenom touto zmluvou bude zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie a škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, a to aj keď tieto vznikli v čase, keď Zhotoviteľ je v omeškaní.
- 16.2 Právo Objednávateľa na náhradu škody, za ktorú Zhotoviteľ nesie zodpovednosť, bude obmedzené na povinnosť Zhotoviteľa uhradiť Objednávateľovi zistené priame škody (teda škody, ktoré vznikli ako bezprostredný a bežne predvídateľný dôsledok škodnej udalosti) do celkovej sumy uvedenej v bode 16.4 nižšie. Vzhľadom na obmedzenie uvedené v predchádzajúcej vete, Zhotoviteľ nebude v žiadnom prípade ani rozsahu hradiť ušlý zisk ani škody vyplývajúce zo straty dát, možnosti využitia diela ani žiadne iné ako priame škody.
- 16.3 Je výhradnou povinnosťou Objednávateľa zabezpečiť, aby nemohlo dôjsť ku strate dát, pre spracovanie ktorých boli plnenia poskytnuté alebo použité.
- 16.4 Celková suma náhrady škody a sankcií, na ktoré každá zo strán bude mať voči druhej strane nárok v súvislosti s touto zmluvou, nesmie prekročiť cenu diela bez DPH.

17 Zodpovednosť za právne vady

- 17.1 Zhotoviteľ zaručuje, že odovzdané dielo nemá právne vady, predovšetkým nie je zaťažené právami tretích osôb z priemyslového alebo iného duševného vlastníctva. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi škodu spôsobenú uplatnením nárokov tretích osôb z titulu porušenia ich chránených práv súvisiacich s plnením Zhotoviteľa, alebo jeho subdodávateľov podľa tejto zmluvy, a to len za predpokladu, že Objednávateľ:
- a. oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu uplatnenie akéhokoľvek takého nároku z duševného vlastníctva tretích osôb,
 - b. neuzná sám taký nárok,
 - c. splnomocní výhradne Zhotoviteľa k vysporiadaniu takého nároku súdnou alebo mimosúdnou cestou a
 - d. bez súhlasu Zhotoviteľa neurobí akékoľvek právne úkony vo veci takého nároku.

18 Ukončenie zmluvy

- 18.1 Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak druhá zmluvná strana nesplní svoju podstatnú povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy ani v lehote, v prípade Objednávateľa deväťdesiat dní a v prípade Zhotoviteľa šesťdesiat dní odo dňa, v ktorom po uplynutí dohodnutého termínu na také plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná. Za podstatnú povinnosť sa bude považovať:

- a) v prípade Objednávateľa neuhradenie faktúry vystavenej Zhotoviteľom v súlade s jeho nárokom podľa tejto zmluvy,
- b) v prípade Zhotoviteľa každá povinnosť vyplývajúca z tejto zmluvy, o ktorej tak stanoví Objednávateľ.
- 18.2 Odstúpením Objednávateľa od Zmluvy nebudú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom čiastkových plnení Zhotoviteľa, ktoré boli do tej doby Objednávateľom riadne prevzaté na základe akceptačného protokolu.
- 18.3 Ak dôjde k tomu, že prechod Slovenskej republiky na používanie eura nebude schválený, Objednávateľ bude oprávnený odložiť plnenie podľa tejto zmluvy až do doby, kedy k takému schváleniu dôjde („reaktivácia plnenia“), a to na základe písomného dodatku k Zmluve, pričom Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi:
- každú oprávnené fakturovanú čiastku z ceny dodaného diela dovtedy nezaplatenú
 - cenu podľa hodinovej sadzby podľa Prílohy č.7 za služby Zhotoviteľom dodané Objednávateľovi a Objednávateľom objednané, alebo na základe tejto zmluvy vykonané, ale doposiaľ neakceptované,
 - všetky preukázateľne vynaložené náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľ v dôsledku takého odloženia plnenia musel uhradiť, ak sa zmluvné strany nedohodnú na odklade ich platenia v závislosti od doby odloženia plnenia.

19 Servis Softvéru v rámci záručnej lehoty

- 19.1 Servis vzťahujúci sa k dodávanému dielu je vymedzený nasledovne:
- i. štandardný záručný servis na odstraňovanie väd diela, príp. pomoc pri náhradnom riešení,
 - ii. servis sa nevzťahuje na chyby a poškodenia diela spôsobné nedostatočne kvalifikovanou obsluhou, alebo nesprávnou manipuláciou obsluhy vykonanou v rozpore s odovzdanou dokumentáciou projektu.
 - iii. servis zabezpečí pri hlásení vady softvéru zásah pracovníkov Zhotoviteľa a analýzu chybového stavu s určením príčin a navrhne postup na odstránenie vady a zabezpečí príslušné kapacity. Objednávateľ pri hlásení výskytu vady určeným spôsobom a na mieste zariadenom Zhotoviteľom spracuje popis vady a určí kategóriu vady. Kategorizácia väd podľa prílohy číslo 5 a reakčný čas:
 - a. Vada kategórie 3 – vada systému brániaca prevádzke diela – 1 pracovný deň
 - b. Vada kategórie 2 – vada umožňujúca prevádzku diela v sťažených podmienkach – 3 pracovné dni
 - c. Vada kategórie 1 – vada neovplyvňujúca efektívnu prevádzku diela – 5 pracovných dní.
- 19.2 Objednávateľ poskytne pri odstraňovaní vady/pri reklamacii maximálnu súčinnosť, podporu a potrebné prostriedky, aby bol minimalizovaný čas na odstránenie vady.
- 19.3 Chyby sa diagnostikujú a odstraňujú okamžitým telefonickým poradenstvom a/alebo nasadením špecialistu na mieste plnenia, ak to odstránenie chyby vyžaduje.

- 19.4 Objednávateľ bude hlásiť vady a problémy týkajúce sa diela a získavať súvisiace informácie na mieste zriadenom Zhotoviteľom.
- 19.5 Pokiaľ nie je uvedené inak, servis bude trvať v čase od pondelka do piatku od 8.00 hod. do 17.00 hod. (okrem dní pracovného voľna a pracovného pokoja).
- 19.6 Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, cena servisných výkonov poskytovaných podľa bodu 14.1 je zahrnutá v cene diela počas záručnej doby diela podľa bodu 14.1 tejto zmluvy.

20 Súčinnosť a iné záväzky zmluvných strán

- 20.1 Zmluvné strany si vzájomne budú priebežne vymieňať dôležité informácie, týkajúce sa predmetu zmluvy. Akonáhle sa Zhotoviteľovi stanú známymi okolnosti, ktoré by mohli ohroziť plnenie predmetu zmluvy, je povinný o týchto okolnostiach a prípadných ním navrhovaných protiopatreniach Objednávateľa bezodkladne písomne informovať.
- 20.2 Objednávateľ vytvorí alebo zabezpečí štandardné pracovné podmienky pre pracovný tím Zhotoviteľa v mieste plnenia podľa článku 6 tejto zmluvy. Poskytne a zabezpečí mu zdarma minimálne jednu štandardnú kanceláriu vybavenú telefónom, umožní mu prístup ku kopírovaciemu a faxovému stroju.
- 20.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať všetky bezpečnostné, hygienické a ďalšie interné predpisy platné v mieste plnenia, kde mu bude poskytnutá kancelária, s ktorými bol preukázateľne oboznámený.
- 20.4 Pre riadnu realizáciu tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa je Objednávateľ povinný poskytnúť primeranú súčinnosť ako Zhotoviteľovi, tak i jeho subdodávateľom, v požadovanom rozsahu. Objednávateľ je tiež povinný, v záujme plynulého priebehu plnenia, zabezpečiť poskytnutie súčinnosti tretích strán.
- 20.5 Požiadavky na súčinnosť Objednávateľa sú uvedené v Prílohe č. 4. tejto zmluvy.
- 20.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť Objednávateľovi do piatich dní od uzatvorenia tejto zmluvy mená projektového manažéra, hlavného analytika a mená členov projektového tímu s detailnejším popisom zodpovedností.
- 20.7 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť Zhotoviteľovi do piatich dní od uzatvorenia tejto zmluvy mená projektového manažéra a zodpovedných zástupcov pre jednotlivé informačné systémy podľa bodu 1.2 tejto zmluvy.
- 20.8 Je výhradnou povinnosťou Objednávateľa zabezpečiť na vlastné náklady konzistenciu Objednávateľových dát. Ak sa pri testoch alebo inak preukáže, že Objednávateľove dáta nie sú konzistentné, Zhotoviteľ nebude v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy a dohodnuté termíny plnenia Zhotoviteľa budú primerane posunuté.
- 20.9 Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania tejto Zmluvy nebude Objednávateľ bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa realizovať žiadne

zmeny existujúcej funkcionality informačných systémov, ktoré sú súčasťou diela podľa bodu 1.2, alebo iných systémov, ktoré by mohli ovplyvniť systémy, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

21 Záväzok mlčanlivosti a ochrana údajov

- 21.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sa dozvedel počas realizácie predmetu zmluvy, pokiaľ ho Objednávateľ v konkrétnom prípade tejto povinnosti písomne nezbaví, alebo predmetné informácie nie sú verejne známe. Táto povinnosť bude platiť aj pre subdodávateľov Zhotoviteľa. V rozsahu zaistujúcom možnosť splnenia takej povinnosti Zhotoviteľ uzatvorí s každým subdodávateľom dohodu o mlčanlivosti, pokiaľ obdobný záväzok nevyplýva pre takého subdodávateľa zo zákona. Zhotoviteľ vyhlasuje, že oboznámil svojich pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy s povinnosťou mlčanlivosti v zmysle tejto zmluvy a/alebo, že zabezpečí také oboznámenie.
- 21.2 Záväzok mlčanlivosti a ochrana údajov môže podliehať zákonu č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonu o ochrane osobných údajov, zákonu č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákonu č. 150/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Obchodnému zákonníku a pre prípad, že informácie poskytnuté pri plnení tejto zmluvy takým právnym predpisom podliehajú, zaväzujú sa ich zmluvné strany také právne predpisy dodržiavať.
- 21.3 Objednávateľ sa zaväzuje chrániť pred vyzradením informácií Zhotoviteľa, ktoré sú jasne a písomne označené Zhotoviteľom ako dôverné. Táto povinnosť trvá dva roky po oznámení týchto informácií Zhotoviteľom.
- 21.4 Za informáciu podliehajúcu ustanoveniam tohto článku nebude považovaná taká informácia, ktorá je už známa, alebo je verejne dostupná, či bola vyvinutá, alebo zákonne získaná od tretej strany bez obmedzenia s jej nakladaním v zmysle tejto zmluvy, ani informácia, ktorú je Objednávateľ povinný sprístupniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- 21.5 Objednávateľ súhlasí, že Zhotoviteľ môže sprístupniť všetky informácie, vrátane informácií, ktoré sú dôverné podľa tohto článku, v rozsahu nevyhnutnom k plneniu tejto zmluvy svojim subdodávateľom.
- 21.6 Každá zo zmluvných strán je tiež oprávnená sprístupniť informáciu podliehajúcu povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku v rozsahu požadovanom právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného štátneho orgánu alebo právnymi predpismi SR. Pred takým sprístupnením informuje o požiadavke na sprístupnenie druhú zmluvnú stranu a vykoná primerané opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií druhej zmluvnej strany.

22 Riešenie sporov

- 22.1 Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na odstránenie vzájomných sporov vzniknutých na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s touto zmluvou a k ich vyriešeniu predovšetkým prostredníctvom jednaní kontaktných osôb, alebo poverených zástupcov.

- 22.2 Všetky spory zo zmluvy budú podľa dohody obidvoch zmluvných strán riešiť príslušné súdy Slovenskej republiky.

23 Prílohy

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledujúce prílohy, ustanovenia, ktorých sa použijú v rozsahu neodporujúcom ustanoveniam hlavnej časti tejto zmluvy (teda jej článkom 1 až 24):

- 23.1 Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy
- 23.2 Príloha č. 2 – Cenová špecifikácia a platobný kalendár
- 23.3 Príloha č. 3 – Harmonogram plnenia dodávky
- 23.4 Príloha č. 4 – Požadovaná súčinnosť zo strany Objednávateľa
- 23.5 Príloha č. 5 – Popis akceptácií a preberania diela
- 23.6 Príloha č. 6 – Riadenie zmien,
- 23.7 Príloha č. 7 – Sadzby Zhotoviteľa pre jednotlivé role

24 Všeobecné ustanovenia

- 24.1 Ak akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude vyhlásené za neplatné, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť jej ostatných ustanovení.
- 24.2 Táto zmluva sa riadi v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka:
- §536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, ako aj jeho inými ustanoveniami, vždy pokiaľ také ustanovenia dispozitívnej povahy nie sú upravené ustanoveniami tejto zmluvy,
 - Ustanoveniami autorského zákona.
- 24.3 Nevykonanie akéhokoľvek práva z tejto zmluvy neznamena zrieknutie sa, alebo zrušenie takeého práva.
- 24.4 Ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa záruky, zodpovednosti za škodu, poskytnutia užívacích práv a dôverných informácií druhej zmluvnej strany ostávajú v platnosti i po ukončení záväzkového vzťahu upraveného touto zmluvou.
- 24.5 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorou je doba splnenia záväzkov v nej dohodnutých.
- 24.6 Práva z tejto zmluvy nie sú prevoditeľné bez predchádzajúceho písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán, ako je uvedené vyššie. Zhotoviteľ bude oprávnený postúpiť neuhradené pohľadávky len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.
- 24.7 Všetky oznámenia s právnym alebo zmluvným účinkom sa budú písať v slovenskom jazyku a posilať druhej strane doporučene (alebo na doručenku) na jej horeuvedenú alebo dodatočne písomne oznámenú adresu.
- 24.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán dostane po dva exempláre.
- 24.9 Túto zmluvu je možné meniť iba formou písomného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 24.10 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

24.11 Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a na dôkaz svojho súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy pripájajú osoby k tomu oprávnené každou zo strán svoje podpisy.

V BRATISLAVE dňa 20. 05. 2008


V Bratislave dňa 27-05-2008

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.


Ing. Jaroslav Mikla,
vedúci služobného úradu


Ing. Igor Zeman, konateľ

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR

Štefanovičova 5

817 82 BRATISLAVA 15

- 2C/1 -

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zmluvy

Predmetom dodávky pre informačné systémy uvedené v bode 1.2. Zmluvy sú nasledovné služby:

1. Príprava euro testovacieho prostredia
2. Detailná špecifikácia „zabezpečenia prechodu vybraných informačných systémov riadenia verejných financií na euro“
3. Vývoj zákazníckych konverzných programov
4. Otestovanie systémových konverzných programov dodávaných v rámci licenčnej podpory
5. Vývoj a úpravy zákazníckych programov, obrazoviek, formulárov a používateľských výstupov v súlade s Detailnou špecifikáciou
6. Testovacie euro konverzie, vyhodnotenie testu a opravy a optimalizácia behu konverzných programov
7. Generálny test aplikácií, rozhraní a integračnej platformy pred konverziou na replike produktívnych dát
8. Spustenie konverzných programov v produktívnom prostredí – konverzia transakčných a statických dát na euro v súlade s Detailnou špecifikáciou
9. Súčinnosť pri rekonziliácii dát po konverzii – súčinnosť pri kontrole v rámci interných a externých integračných väzieb
10. Projektový manažment

V súčasnosti je zákonným platidlom v Slovenskej republike slovenská koruna a informačné systémy pracujú s touto menou ako s lokálnou. Zavedenie eura ako zákonného platidla Slovenskej republiky predstavuje rozsiahlu zmenu s celospoločenským dopadom, z nej vyplýva nutná príprava aj v oblasti bankových a nebankových informačných systémov MF SR, informačného systému pre systém štátnej pokladnice nevynímajúc.

Zákon č.659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike (ďalej tiež „Generálny zákon“) vytvára základné právne predpoklady na zavedenie eura ako zákonného platidla v Slovenskej republike. Dodávka diela „Zabezpečenie prechodu vybraných informačných systémov riadenia verejných financií na euro“ z nasledovných častí Generálneho zákona:


- základné ustanovenia - §1 - definuje účel generálneho zákona a jeho základné pojmy,
- bezhotovostné peňažné operácie a platobný styk - §8 - paragraf sa dotýka:
 - konverzie peňažných prostriedkov,
 - lehoty vykonania peňažných prevodov,
- duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt - §18 - paragraf definuje:
 - obdobie duálneho zobrazovania,
 - peňažné hodnoty podliehajúce duálnemu zobrazovaniu,
 - postupy a pravidlá duálneho zobrazovania.

Medzi ďalšie legislatívne normy, ktoré musia byť pri implementácii diela zohľadnené, patrí:

- Národný plán zavedenia eura v Slovenskej republike vydaný NBS a schválený vládou Slovenskej republiky

Pri implementácii diela budú zohľadnené všetky súvisiace legislatívne normy platné v Slovenskej republike, ktoré budú známe do času akceptácie finálnej Detailnej špecifikácie prechodu vybraných informačných systémov riadenia verejných financií na euro.

Generálny zákon a Národný plán zavedenia eura v Slovenskej republike stanovujú nasledovný harmonogram pre prechod na euro:

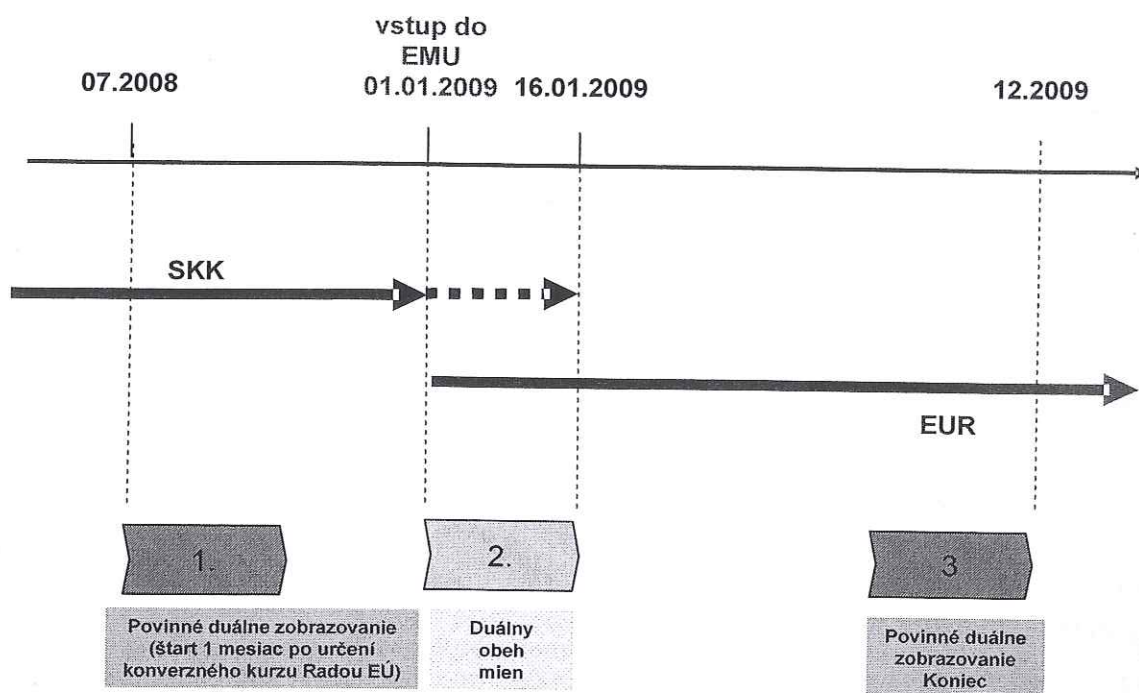

Dodávka diela „Zabezpečenie prechodu vybraných informačných systémov riadenia verejných financií na euro“ a s ňou spojené služby budú prebiehať v nasledovných etapách:

- Etapa 1:** Detailná špecifikácia prechodu vybraných informačných systémov riadenia verejných financií na euro
- Etapa 2:** Implementácia a test funkcionality pre duálne zobrazovanie
- Etapa 3:** Implementácia a test funkcionality bankových aplikácií IS SŠP pre rozpočtový rok 2009
- Etapa 4:** Implementácia a test funkcionality pre konverziu na euro
- Etapa 5:** Generálny test euro-kompatibilných aplikácií a rozhraní
- Etapa 6:** Nasadenie euro funkcionality do produktívnej prevádzky
- Etapa 7:** Konverzia transakčných dát v SAP aplikáciách

1. etapa: Detailná špecifikácia prechodu vybraných informačných systémov riadenia verejných financií na euro

V rámci tejto etapy sú predmetom dodávky nasledovné plnenia:

- Príprava euro testovacieho prostredia pre vybrané informačné systémy riadenia verejných financií*
 - vytvorenie kópie produkčnej verzie aplikácií do euro testovacieho prostredia
 - vytvorenie kópie produkčných dát do euro testovacieho prostredia
- I. cyklus testov - nasadenie licenčných konverzných programov pre SAP aplikácie
- Spracovanie dokumentu Detailná špecifikácia prechodu vybraných informačných systémov riadenia verejných financií na euro, ktorého obsahom bude:
 - špecifikácia požiadaviek (popis legislatívnych požiadaviek, požiadaviek používateľov a pod.)
 - spracovanie Detailnej špecifikácie aplikačných zmien, resp. detailná špecifikácia konverzie dát a euro-kompatibilnej verzie aplikácií
 - popis činností vyplývajúcich z prechodu na euro na základe metodiky SAP, v oblastiach, kde je to relevantné
 - analýza dopadov

** Obstaranie a inštalácia hardvérovej infraštruktúry pre euro testovacie prostredie je zodpovednosťou Objednávateľa a nevyhnutným predpokladom pre začatie etapy 1.*

Výstupy:

- Dokument Detailná špecifikácia prechodu bankových aplikácií IS SŠP na euro
- Dokument Detailná špecifikácia prechodu SAP aplikácií IS SŠP na euro
- Dokument Detailná špecifikácia prechodu IS ESO na euro
- Dokument Detailná špecifikácia prechodu AC KSK na euro
- Dokument Detailná špecifikácia prechodu Platobných portálov KSK a NSK na euro
- Dokument Detailná špecifikácia prechodu WallStreet Suite na euro
- Dokument Detailná špecifikácia prechodu ACIS – Účtovníctvo príjmového cyklu VPS na euro
- Dokument Detailná špecifikácia prechodu integračnej platformy SAP XI na euro

Vyššie popísané dokumenty sú výstupom projektovej etapy „Detailná špecifikácia prechodu vybraných informačných systémov riadenia verejných financií na euro“ a ako detailný popis cieľového stavu tak ďalej upresňujú zadanie projektu. Po schválení Oprávnenými osobami za stranu Objednávateľa a Zhotoviteľa sa tieto dokumenty stávajú pre obe strany záväzným zadáním, podľa ktorého budú realizované implementačné a testovacie etapy dodávky diela.

2. etapa: Implementácia a test funkcionality pre duálne zobrazovanie

V rámci tejto etapy sú predmetom dodávky nasledovné služby:

- Vývoj a test zákaznických (custom) programov pre duálne zobrazovanie
- Otestovanie systémových programov dodávaných v rámci licenčnej podpory pre duálne zobrazovanie
- Vývoj a modifikácia všetkých výstupov systému v súlade s legislatívnymi a používateľskými požiadavkami na duálne zobrazovanie, minimálne v rozsahu legislatívnych požiadaviek, kde predmetom duálneho zobrazovania sú v zmysle §18 Generálneho zákona peňažné sumy uvedené:
 - na faktúrach,
 - v zmluvách,
 - na platobných alebo výplatných dokladoch,
 - na dokladoch vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou,
 - pokladničných potvrdenkách, na ďalších dokladoch o zaplatení alebo na iných účtovných dokladoch
 - sumy hodnôt uvádzaných na výpisoch z účtov vyhotovovaných finančnými inštitúciami.
- Spracovanie testovacích scenárov a aktualizácia používateľských príručiek pre novú verziu aplikácie s duálnym zobrazovaním
- Nasadenie novej verzie aplikácií s funkčnosťou pre duálne zobrazovanie do produkčnej prevádzky
- Horeuvedené služby budú realizované pre nasledovné aplikácie v rozsahu implementovanej funkčnosti*:
 1. SAP aplikácie IS SŠP: SAP R/3 moduly FI, AM, FM, MM, HR a IIM okrem aplikácie Výkazníctvo ŠP (modul SAP BW)**,
 2. IS ESO – SAP R/3 FI, AM, CO, FM, MM, HR,
 3. AC KSK – moduly SAP R/3 FI, AM, CO, FM, HR, modul BW, modul Riadenie rozpočtu,
 4. Platobné portály - modul Platobný portál KSK, modul Platobný portál NSK,
 5. SAP moduly PSCD a FI pre Colnú správu.

* Funkcionalita duálneho zobrazovania pre Bankové aplikácie IS SŠP už bola realizovaná, je v produkčnej prevádzke a preto nie je predmetom dodávky.

** V aplikácii Výkazníctvo ŠP a Wallstreet Suite nebude implementovaná funkčnosť pre duálne zobrazovanie, keďže podľa legislatívnych požiadaviek nie je predmetom povinného duálneho zobrazovania a takisto táto funkčnosť nebola požadovaná zo strany Objednávateľa.

Akceptačný protokol etapy projektu „Implementácia a test funkcionality pre duálne zobrazovanie“, bude popisovať výsledky uskutočnených funkčných testov vyššie uvedených aplikácií. Bude deklarovať, ktorá z testovanej funkčnosti aplikácie vyhovuje požiadavkám Objednávateľa, definovaných v Detailnej špecifikácii a to buď bez výhrad alebo s výhradami (akými) alebo nevyhovuje. Po doplnení spôsobu a termínov odstránení zistených nedostatkov sa stáva pre obe strany záväzným potvrdením, že funkčnosť vyššie uvedených aplikácií vyhovuje požiadavkám Objednávateľa a tak bude nasadená na produktívny systém.

3. etapa: Implementácia a test funkcionality Bankových aplikácií IS SŠP pre rozpočtový rok 2009

V rámci tejto etapy sú predmetom dodávky nasledovné plnenia:

- Vývoj a test funkcionality v rozsahu definovanom v dokumente Detailná špecifikácia prechodu bankových aplikácií IS SŠP na euro (výstup etapy 1), dodaná funkcionality bude zahŕňať:
 - Realizáciu prechodných úprav vo vedení účtov v prechodnom období pred začiatkom roku 2009, ktoré budú zahŕňať umožnenie spracovania platieb na rok 2009 v roku 2008, zadávanie produktových podmienok a pásiem. (Umožnenie zadávania individuálnych kurzov a blokácií CPS v EUR počas roku 2008 pre platby roku 2009, umožnenie zadávania produktových podmienok v lokálnej mene, poplatkov a úrokov pre rok 2009 v roku 2008).
 - Zadávanie platieb na rok 2009 v roku 2008 (Umožnenie zadania domácich platieb v EUR počas platnosti SKK ako lokálnej meny, Zabránenie zadávania cezhraničných platieb v roku 2008 na rok 2009 v SKK a v EUR v rámci SR).
 - Integráciu s RIS vo verzii 2009 vrátane úpravy súvisiacich interných rozpočtových mechanizmov pre spracovanie rozpočtov v dvoch rôznych menách v závislosti od obdobia,
 - Zavedenie spracovania dvoch mien do procesu záväzkovania, alokácie a vykazovania čerpania,
 - Spracovanie platieb pre rok 2009 v prechodnom období - umožnenie zadávania domácich platieb v EUR na rok 2009 počas roku 2008, týkajúcich sa nasledovných druhov rozpočtových a mimorozpočtových platieb z príjmových, výdavkových a bežných účtov,
 - Prípravu prognóz v EUR pre rok 2009 v roku 2008 manuálnym spôsobom bez automatizácie - zavedenie prognózovania v EUR zo zdrojových údajov v SKK pred prepočtom údajov, počas decembra 2008,
 - Export údajov pre ARDaL na prelome rokov 2008 a 2009 - úprava zasielania údajov finančného plánovania do ARDaL počas prechodného obdobia pred prepočtom údajov, počas decembra 2008,
- Spracovanie testovacích scenárov a aktualizácia používateľských príručiek pre novú verziu bankových aplikácií IS SŠP
- Nasadenie novej verzie aplikácií s funkčnosťou pre duálne zobrazovanie do produkčnej prevádzky
- Horeuvedené služby budú realizované pre nasledovné Bankové aplikácie IS SŠP:
 1. ManEx, AccoMan, PayEx, PlarEx a FlexMan.

Akceptačný protokol etapy projektu „Implementácia a test funkcionality Bankových aplikácií IS SŠP pre rozpočtový rok 2009“, bude popisovať výsledky uskutočnených funkčných testov vyššie uvedených aplikácií. Bude deklarovať, ktorá z testovanej funkčnosti aplikácie vyhovuje požiadavkám Objednávateľa, definovaných v Detailnej špecifikácii a to buď bez výhrad alebo s výhradami (akými) alebo nevyhovuje. Po doplnení spôsobu a termínov odstránení zistených nedostatkov sa stáva pre obe strany záväzným potvrdením, že funkčnosť vyššie uvedených aplikácií vyhovuje požiadavkám Objednávateľa a tak bude nasadená na produktívny systém.

4. etapa: Implementácia a test funkcionality pre konverziu na euro

V rámci tejto etapy sú predmetom dodávky nasledovné služby:

- Vývoj zákazníckych konverzných programov
- Otestovanie systémových konverzných programov dodávaných v rámci licenčnej podpory
- Vývoj a modifikácia všetkých zákazníckych programov a používateľských výstupov systému ako aj rozhraní na externé systémy v rozsahu definovanom v dokumente Detailná špecifikácia (výstup etapy 1), súčinnosť pri úprave špecifických používateľmi vytvorených reportov.
- Vykonanie interných funkčných testov euro konverzie a súčinnosť pri akceptačnom funkčnom testovaní euro konverzie, vyhodnotenie testov a vykonanie opráv.
- Spracovanie testovacích scenárov pre euro-kompatibilnú verziu nižšie menovaných aplikácií
- Horeuvedené služby budú realizované pre nasledovné aplikácie v rozsahu implementovanej funkčnosti:
 1. Bankové aplikácie IS SŠP: ManEx, AccoMan, PayEx, PlarEx a FlexMan,
 2. SAP aplikácie IS SŠP: SAP R/3 moduly FI, AM, FM, MM, HR a IIM a Výkazníctvo ŠP (SAP BW) ,
 3. IS ESO – moduly SAP R/3 FI, AM, CO, FM, MM, HR,
 4. AC KSK – moduly SAP R/3 FI, AM, CO, FM, HR, modul BW, modul Riadenie rozpočtu,
 5. Platobné portály - modul Platobný portál KSK, modul Platobný portál NSK,
 6. Wallstreet Suite (WSS), vrátane reportovacej aplikácie MS SQL
 7. SAP moduly PSCD a FI pre Colnú správu s väzbou na kapitolu VPS MF SR,
 8. Integračná platforma SAP XI.

Akceptačný protokol etapy projektu „Implementácia a test funkcionality pre konverziu a euro“, popisujúci výsledky uskutočnených funkčných testov euro-kompatibilných aplikácií bude deklarovať, ktorá z testovanej funkčnosti aplikácie vyhovuje požiadavkám Objednávateľa, definovaných v Detailnej špecifikácii a to buď bez výhrad alebo s výhradami (akými) alebo nevyhovuje. Po doplnení spôsobu a termínov odstránení zistených nedostatkov vo funkčnosti sa stáva pre obe strany záväzným potvrdením, že funkčnosť vyššie menovaných aplikácií vyhovuje požiadavkám Objednávateľa a dáva súhlas na začatie Generálneho testu euro-kompatibilných aplikácií a rozhraní (etapa 5).


Spôsob a metodika implementácie funkcionality pre konverziu a euro závisí od toho, či sa jedná o SAP aplikácie, ako je to v prípade aplikácií SAP IS SŠP, IS ESO, AC KSK, Platobných portálov KSK a NSK a SAP modulov PSCD a FI alebo či ide o iný typ aplikácií – bankové aplikácie IS SŠP a Wallstreet Suite.

4.1 Spôsob implementácie a testu funkcionality pre konverziu na euro - SAP aplikácie

- Vývoj a test funkcionality v rozsahu definovanom v dokumente Detailná špecifikácia (výstup etapy 1), predovšetkým bude zahŕňať nasledovné:
 - Konverzia meny v SAP aplikáciách (SAP aplikácie IS SŠP, IS ESO, AC KSK, Platobné portály KSK a NSK, SAP moduly PSCD a FI) bude implementovaná v testovacom prostredí v dvoch samostatných fázach v rozsahu podľa charakteru fázy:
 1. fáza - zmena transakčnej meny na euro (TCC) – v používateľských obrazovkách, formulároch, zostavách a kmeňových záznamoch k 1.1.2009

2. fáza - zmena lokálnej meny na euro (LCC) - databázová konverzia transakčných a customizovaných dát k 1.2.2009
- o Riešenie problematiky rozdielov vyplývajúcich zo zaokrúhľovania
 - o Úprava všetkých relevantných customizovaných programov, formulárov a zostáv typu Z* bez potreby zásadných zmien v režime súčasných bežiacich procesov
 - o Kontrola a dorovnanie stavov v rámci interných integračných väzieb - Integrácia hlavnej knihy a vedľajších kníh (doúčtovanie rozdielov)
 - o Kontrola a dorovnanie rozdielov medzi externými systémami - Manuálne porovnanie stavov na účtoch
 - o Optimalizácia konverzného behu
 - o Pre modul HR historické dáta sa nebudú konvertovať, pretože modul HR vykonáva spätný prepočet miezd
 - o Vo Výkazníctve ŠP (modul SAP BW) budú historické dáta (04-08) transformované do nových infokociek, dáta v nových infokockách budú konvertované na euro počas prenosu, pričom dáta za rok 2009 už potečú do nových infokociek. Z historických výkazov budú konvertované len údaje pre posúdenie plnenia rozpočtu verejnej správy (Príjmy a Výdavky).
 - o Konverzia systému AC KSK na euro zahŕňa aj integráciu AC KSK na systémy OvZP. Predmetom konverzie systému AC KSK sú aj Platobný portál a Riadenie rozpočtu, jedná sa o aplikácie vyvinuté pre potreby KSK, preto bude implementované vlastné riešenie konverzie.
 - o Konverzia systému AC NSK na euro zahŕňa aj integráciu AC NSK na systémy OvZP. Predmetom konverzie systému NSK je modul Platobný portál, kde bude zabezpečená eurokonverzia vlastným riešením, nakoľko ide o špecifický modul. Prechod na euro pre Platobné portály KSK a NSK bude realizovaný súčasne na oboch systémoch koordinovane.

Nasledovná schéma popisuje postup implementácie a testu konverzie národnej meny na euro v SAP aplikáciách:

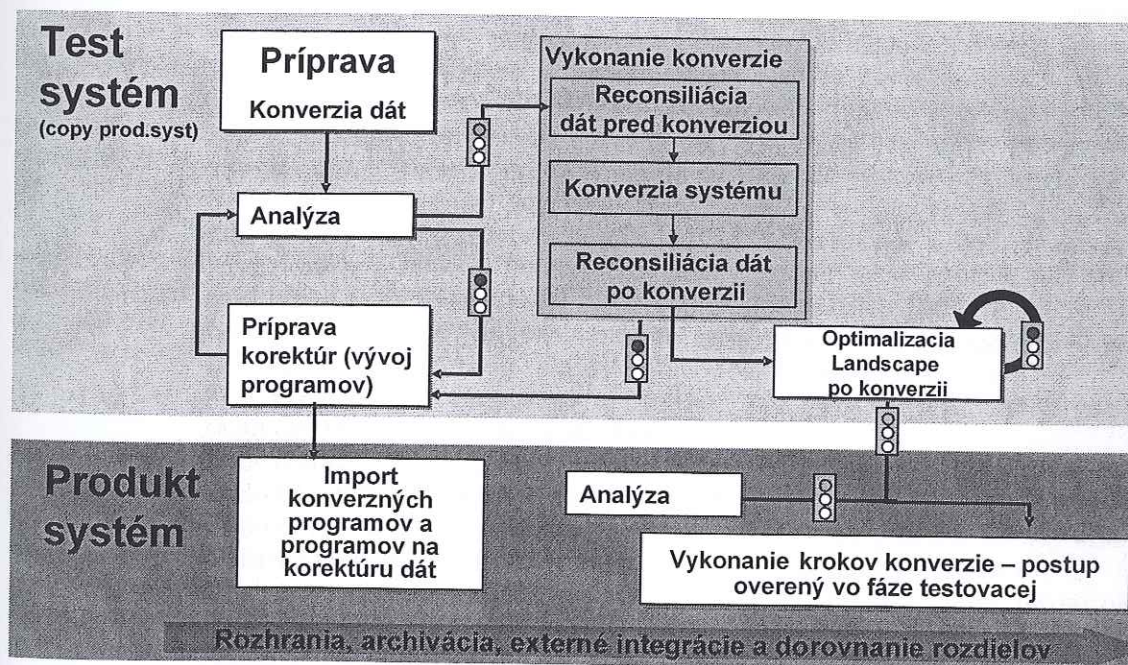

4.2 Spôsob implementácie a testu funkcionality pre konverziu na euro – bankové aplikácie IS SŠP

- Vývoj a test funkcionality v rozsahu definovanom v dokumente Detailná špecifikácia (výstup etapy 1). Dodaná funkcionality bude zahŕňať nasledovné úpravy bankových aplikácií IS SŠP (ManEx, AccoMan, PayEx, PlarEx a FlexMan):
 - Špecifické úpravy v účtoch klientov pre obdobie konverzie (Zmeny devízových účtov v EUR na bežné účty, Zmeny terminovaných účtov v SKK a EUR s viazanosťou počas konverzie, Úpravy súvisiace so zmenami účtov ŠP v SKK vedených v iných bankách (hotovostné účty vedené vo VÚB, nostro účty vo VÚB a NBS),
 - Jednorazové konverzie pri prechode na euro – Automatická úprava údajov bez povinnej konverzie, zadaných v systéme v SKK na EUR tak aby ich nebolo potrebné zmeniť manuálne operátormi vedenia účtov počas 1.1.2009, vrátane automatizovaného vyriešenia neštandardných stavov pri komplexných produktoch (cash pooling). Konverzie sa budú týkať oblastí (Blokácie na účtoch, Obrazovky transakcií, platieb, Predpisy automatických prevodov a inkás, Sumárne účty, Úročenie, Poplatky, Zneplatnenie produktov, produktových podmienok, pásiem, Ostatné číselníky - meny, systémové nastavenia, Kurzový lístok),
 - Úpravu integrácie na účtovníctvo - Odstránenie referenčnej meny keďže sa stane lokálnou menou.
 - Spracovanie chybára domáceho platobného styku (DPS) na prelome rokov 2008 a 2009 - umožnenie odúčtovania SKK položiek z chybára DPS po konverzii na EUR,
 - Spracovanie výziev na inkaso a zrušenie úhrady DPS pre platby v SKK po konverzii na EUR,
 - Spracovanie chybára cezhraničného platobného styku (CPS) na prelome rokov 2008 a 2009 - umožnenie odúčtovania SKK položiek z chybára po konverzii na EUR.
 - Zobrazovanie pohybov na účtoch klientov po konverzii spočívajúce v zavedení používania dvoch mien v závislosti od obdobia vzniku obrátov,
 - Vysporiadanie kreditov v prechodnom období po konverzii - umožnenie spätného vysporiadania kreditných obrátov v SKK po prechode na EUR,
 - Sprístupnenie sumárnych prehľadov pre SKK aj EUR po konverzii - zobrazovanie v mene podľa obdobia vzniku zobrazovaných údajov,
 - Úpravu spracovania vstupov z rozhraní pre prechodné obdobie pred konverziou - úprava spracovania dávok a správ pre umožnenie zadávania záväzkov a platieb v EUR na rok 2009 počas roku 2008 a pre zadávanie refundácií a zúčtovaní roku 2008 v SKK počas roku 2009,
 - Úprava integrácie na výkazníctvo pre prechodné obdobie po konverzii zabezpečujúce výmenu údajov počas prechodného obdobia.
 - Konverzie údajov rozpočtov a prognóz pre potreby finančného plánovania (Konverzia historických rozpočtov),
 - Zobrazenie Finančného plánu po konverzii (Úprava dotknutých prehľadových obrazoviek, úprava integračných exportov pre archív).
 - Duálne zobrazovanie zostáv v aplikácii FlexMan (Konverzia agregovaných historických klientskych skutočností - rozšírenie existujúcej dátovej štruktúry a jednorazový prepočet, Úprava mechanizmov generovania a agregovania klientskych skutočností).
 - Predmetom dodávky nie sú nové rozhrania bankových aplikácií IS SŠP na európsky platobný systém TARGET2 ani na SIPS retail NBS vo verzii euro.

4.3 Spôsob implementácie a testu funkcionality pre konverziu na euro – Wallstreet Suite

- Vývoj a test funkcionality v rozsahu definovanom v dokumente Detailná špecifikácia (výstup etapy 1)*, predovšetkým bude zahŕňať nasledovné úpravy aplikácie Wallstreet Suite:
 - Zmena základných nastavení v statických dátach k 1.1.2009:
 - Nastavenie meny EUR pre vykazovanie P/L v portfóliách
 - Nastavenie meny EUR pre účtovné položky
 - Zmena nastavenia portfóliovej štruktúry a transakčného toku
 - Zmena nastavenia platobných inštrukcií pre vysporiadanie (hotovostné)
 - Zmena nastavenia emisných podmienok finančných nástrojov denominovaných v SKK
 - Zmena nastavenia limitov (zmena meny, objemu, štruktúry limitu)
 - Zmena nastavenia pravidiel prípravy dát pre účely účtovania MFSR
 - Zmena nastavenia účtovných pravidiel ŠP
 - Nastavenie zdrojov trhových dát (fixing ECB, výnosové krivky pre EUR)
 - Konverzia transakčných dát na euro k 1.1.2009:
 - Konverzia transakcií bude vykonaná automaticky pomocou konverzných skriptov. Špeciálne prípady sa budú riešiť individuálne manuálnou konverziou týchto obchodov.
 - Konverzia otvorených pozícií cenných papierov
 - Zmena Base Currency a Base FX Rate v budúcich cashflowoch živých transakcií
 - Zmena platobnej meny, objemu a platobných inštrukcií v budúcich cashflowoch živých transakcií
 - Úpravy v existujúcich rozhraniach a implementácia potrebných rozhraní pre platobný styk

** Detailná špecifikácia prechodu Wallstreet Suite na euro bude vychádzať z dokumentu „PRECHOD INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ARDAL NA MENU EUR“ verzia 1.6 akceptovaného ARDAL dňa 7.12.2007 a konverzia bude vykonaná v rozsahu definovanom v tomto dokumente. Uvedený východiskový dokument „PRECHOD INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ARDAL NA MENU EUR“ bude detailne rozpracovaný v chýbajúcich detailoch a v prípade viacerých možností bude dopracovaná vybraná alternatíva.*

5. etapa: Generálny test euro-kompatibilných aplikácií a rozhraní

V rámci tejto etapy sú predmetom dodávky nasledovné služby:

- Otestovanie konverzných programov dodávaných v rámci licenčnej podpory
- Funkčný a integračný test nových euro-kompatibilných zákazníckych (custom) programov a používateľských výstupov systému ako aj rozhraní na externé systémy v rozsahu definovanom v dokumente Detailná špecifikácia (výstup etapy 1)
- Funkčné a integračné testovanie Euro konverzie, vyhodnotenie testu a opravy
- Aktualizácia testovacích scenárov a používateľských príručiek pre euro-kompatibilnú verziu aplikácií
- Horeuvedené služby budú realizované pre všetky aplikácie pokryté touto zmluvou.
- Služby budú realizované v testovacom prostredí a v prípade SAP aplikácií budú prebiehať sekvenčne v dvoch fázach v rozsahu podľa charakteru fázy:
 1. fáza – zmena transakčnej meny (TCC)
 2. fáza – konverzia lokálnej meny (LCC)

Akceptačný protokol etapy projektu „Generálny test euro-kompatibilných aplikácií a rozhraní“ bude popisovať výsledky uskutočnených funkčných a integračných testov euro-kompatibilných aplikácií. Deklaruje, ktorá z testovanej funkčnosti aplikácie vyhovuje požiadavkám Objednávateľa, definovaných v Detailnej špecifikácii a to buď bez výhrad alebo s výhradami (akými) alebo nevyhovuje. Po doplnení spôsobu a termínov odstránení zistených nedostatkov vo funkčnosti Zhotoviteľom sa stáva pre obe strany záväzným potvrdením, že funkčnosť euro-kompatibilných verzií vyššie menovaných aplikácií vyhovuje požiadavkám Objednávateľa.

6. etapa: Nasadenie euro funkcionality do produktívnej prevádzky

V rámci tejto etapy sú predmetom dodávky nasledovné služby:

- Nasadenie euro-kompatibilných zákazníckych programov a používateľských výstupov systému ako aj rozhraní na externé systémy v rozsahu definovanom v dokumente Detailná špecifikácia (výstup etapy 1) z euro testovacieho prostredia do produktívneho prostredia Objednávateľa.
 - Záloha aplikácie pred nasadením novej verzie
 - Nasadenie euro-kompatibilnej verzie nižšie menovaných aplikácií do produktívnej prevádzky k 1.1.2009 (v prípade SAP aplikácií nasadenie verzie pre fázu TCC – zmena transakčnej meny na euro).
- Spustenie konverzných programov v bankových aplikáciách IS SŠP a v aplikácii Wallstreet Suite v produktívnom prostredí:
 - Zmena lokálnej meny na euro
 - Konverzia vybraných transakčných a statických dát
- Horeuvedené služby budú realizované pre nasledovné aplikácie:
 1. Bankové aplikácie IS SŠP: ManEx, AccoMan, PayEx, PlarEx a FlexMan,
 2. SAP aplikácie IS SŠP: SAP R/3 moduly FI, AM, FM, MM, HR a IIM a Výkazníctvo ŠP (SAP BW) ,
 3. IS ESO – moduly SAP R/3 FI, AM, CO, FM, MM, HR,
 4. AC KSK – moduly SAP R/3 FI, AM, CO, FM, HR, modul BW, modul Riadenie rozpočtu,
 5. Platobné portály - modul Platobný portál KSK, modul Platobný portál NSK,
 6. Wallstreet Suite (WSS),
 7. SAP moduly PSCD a FI pre Colnú správu s väzbou na kapitolu VPS MF SR,
 8. Integračná platforma SAP XI.

Akceptačný protokol „Nasadenie euro funkcionality do produktívnej prevádzky“, popisujúci priebeh nasadenia euro-kompatibilných aplikácií do produktívnej prevádzky, sa stáva pre obe strany záväzným potvrdením, že funkčnosť euro-kompatibilných verzií vyššie menovaných aplikácií vyhovuje požiadavkám Objednávateľa.

Tento akceptačný míľnik nie je platobým míľnikom v zmysle Prílohy č.2.

7. etapa: Konverzia transakčných dát v SAP aplikáciách

V rámci tejto etapy sú predmetom dodávky nasledovné služby:

- Spustenie konverzných programov v SAP aplikáciách v produktívnom prostredí*:
 - Záloha aplikácie pred spustením konverzie
 - Zmena lokálnej meny na euro – fáza LCC
 - Databázová konverzia transakčných a customizovaných dát

* predpokladom pre spustenie konverzných programov v SAP aplikáciách v produktívnom prostredí je úplné ukončenie aktivít v súvislosti s Ročnou účtovnou závierkou za rok 2008. Vykonalie Ročnej účtovnej závierky za rok 2008 a ukončenie súvisiacich aktivít v SAP aplikáciách v plánovanom termíne je plnou zodpovednosťou Objednávateľa a nie je predmetom dodávky diela Zhotoviteľom.

- Kontrola a dorovnanie rozdielov v rámci interných integračných väzieb:
 - Integrácia hlavnej knihy a vedľajších kníh - automatické doúčtovanie rozdielov
 - Integrácia účtovných a rozpočtových dát - automatické dorovnanie rozdielov
 - Integrácia stavu zásob so stavom na účtoch hlavnej knihy - automatické porovnanie stavov
 - Integrácia stavu IM na kartách so stavom v účtovníctve - automatické porovnanie stavov
- Kontrola a dorovnanie rozdielov v rámci externých integračných väzieb:
 - Manuálne porovnanie stavov na účtoch v SAP aplikáciách a stavov po konverzii v externých systémoch s integračným rozhraním na SAP aplikácie
 - Manuálne doúčtovanie rozdielov zo zaokrúhľovania
- Horeuvedené služby budú realizované pre nasledovné aplikácie:
 1. SAP aplikácie IS SŠP: SAP R/3 moduly FI, AM, FM, MM, HR a IIM a Výkazníctvo ŠP (modul SAP BW),
 2. IS ESO – SAP R/3 FI, AM, CO, FM, MM, HR,
 3. AC KSK – moduly SAP R/3 FI, AM, CO, FM, HR, modul BW, modul Riadenie rozpočtu,
 4. Platobné portály - modul Platobný portál KSK, modul Platobný portál NSK,
 5. SAP moduly PSCD a FI pre Colnú správu,
 6. súčinnosť v prípade transakcií realizovaných cez Integračnú platformu SAP XI a jej konektory.

Akceptačný protokol „Konverzia transakčných dát v SAP aplikáciách“, popisujúci priebeh konverzie a rekonziliácie dát na produktívnom systéme sa stáva pre obe strany záväzným potvrdením o funkčnosti produktívnych euro-kompatibilných verzií vyššie menovaných aplikácií.

Zoznam použitých skratiek

V tejto Zmluve o dielo ako aj v prílohách sú použité nasledovné skratky:

Skratka	Úplné znenie
AccoMan	Názov modulu pre vedenie účtov informačného systému pre systém štátnej pokladnice
ACIS	Účtovníctvo príjmového cyklu VPS na euro
AC KSK	Administratívne centrum Košického samosprávneho kraja
AC NSK	Administratívne centrum Nitrianskeho samosprávneho kraja
ARDAL	Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
FlexMan	Názov modulu pre využívanie flexibilných zostáv z informačného systému pre systém štátnej pokladnice
IS ESO	Externé účtovníctvo Ministerstva financií Slovenskej republiky
IS ŠSP	Informačný systém pre systém štátnej pokladnice
ManEx	Názov modulu pre riadenie výdavkov informačného systému pre systém Štátnej pokladnice
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
NBS	Národná banka Slovenska
PayEx	Názov modulu pre platobný styk informačného systému pre systém štátnej pokladnice
PlarEx	Názov modulu pre finančné plánovanie informačného systému pre systém štátnej pokladnice
SAP AM	Modul správa majetku ŠP (súčasť „malej“ pokladnice)
SAP BC	SAP báza
SAP BW	Modul výkazníctvo
SAP FI	Modul finančné účtovníctvo
SAP FM	Modul správa rozpočtu
SAP HR	Modul personalistika a mzdy
SAP IIM	Modul inventúra investičného majetku
SAP MM	Modul riadenie nákupov/obstarávanie
SAP PSCD	Public Sector Collection and Disbursement (Finančný modul účtovania príjmov organizácie vo väzbe na obchod. partnera) implem. spravidla s FI modulom
SAP TCC	znamená zmenu transakčnej meny systému SAP z SKK na EUR
SAP LCC	Znamená zmenu lokálnej meny v systéme SAP z SKK na EUR, dôležitá pre konverziu transakčných dát
SAP XI	Integračná platforma informačného systému pre systém štátnej pokladnice
ŠP	Štátna pokladnica
ŠÚ SR	Štatistický úrad Slovenskej republiky
VPS	Kapitola Všeobecnej Pokladničnej Správy Ministerstva financií SR, reprezentovaná účt. okruhom VPS v IS ESO
WSS	WallStreet Suite – informačný systém ARDAL

Príloha č. 2

Cenová špecifikácia a platobný kalendár

Dielo bude dodané prostredníctvom ucelených dodávok v termínoch a cenách podľa nasledujúcej tabuľky.

p.č.	Platobný míľnik	termín plnenia	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1	Detailná špecifikácia - SAP IS SŠP, IS ESO, AC KSK, PP KSK, PP NSK, ACIS, XI, WSS	10.6.2008	4,050,067	769,513	4,819,580
2	Detailná špecifikácia - bankové aplikácie IS SŠP	30.6.2008	1,654,933	314,437	1,969,370
3	Implementácia a test funkcionality pre duálne zobrazovanie	30.6.2008	14,460,111	2,747,421	17,207,532
4	Implementácia funkcionality bankových aplikácií IS SŠP pre rozpočtový rok 2009	28.11.2008	11,584,534	2,201,061	13,785,595
5	Implementácia a test funkcionality pre konverziu na euro	17.11.2008	33,469,918	6,359,284	39,829,202
6	Generálny test euro-kompatibilných aplikácií a rozhraní	19.12.2008	35,535,117	6,751,672	42,286,789
7	Konverzia transakčných dát v SAP aplikáciách	16.2.2009	13,345,320	2,535,611	15,880,931
	spolu		114,100,000	21,679,000	135,779,000

Príloha č. 3: Harmonogram plnenia dodávky

Dielo bude dodané v súlade s nasledovným harmonogramom plnenia:

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	
1	Zabezpečenie pripravenosti IS pre systém ŠP a ďalších IS riadenia verejných financií na zavedenie Eura	195 days	Mon 19.5.08	Mon 16.2.09	
2	Štart programu	0 days	Mon 19.5.08	Mon 19.5.08	
3	Testovacie prostredie pripravené	0 days	Mon 19.5.08	Mon 19.5.08	
4	Etap 1: Detailná špecifikácia - SAP IS SŠP, IS ESO, AC KSK, PP KSK, PP NSK, ACIS, XI, WSS	17 days	Mon 19.5.08	Tue 10.6.08	
5	I. cyklus testov - aplikácia licenčných konverzných programov	13 days	Mon 19.5.08	Wed 4.6.08	
6	I. cyklus testov - SAP IS SŠP	13 days	Mon 19.5.08	Wed 4.6.08	
10	I. cyklus testov - IS ESO	13 days	Mon 19.5.08	Wed 4.6.08	
14	I. cyklus testov - AC KSK	13 days	Mon 19.5.08	Wed 4.6.08	
18	I. cyklus testov - plat. portály KSK a NSK	13 days	Mon 19.5.08	Wed 4.6.08	
22	I. cyklus testov - ACIS (PSCD/FI)	13 days	Mon 19.5.08	Wed 4.6.08	
26	I. cyklus testov - SAP XI	13 days	Mon 19.5.08	Wed 4.6.08	
28	vypracovanie detailnej špecifikácie "prechodu Wallstreet Suite na euro"	8 days	Mon 19.5.08	Wed 28.5.08	
29	vypracovanie detailnej špecifikácie "prechodu SAP aplikácií IS SŠP na euro"	8 days	Mon 19.5.08	Wed 28.5.08	
30	vypracovanie detailnej špecifikácie "prechodu IS ESO na euro"	8 days	Mon 19.5.08	Wed 28.5.08	
31	vypracovanie detailnej špecifikácie "prechodu AC KSK na euro"	8 days	Mon 19.5.08	Wed 28.5.08	
32	vypracovanie detailnej špecifikácie prechodu PP KSK a NSK na euro	8 days	Mon 19.5.08	Wed 28.5.08	
33	vypracovanie detailnej špecifikácie "prechodu ACIS - Účt. príjmového cyklu VPS na euro"	8 days	Mon 19.5.08	Wed 28.5.08	
34	vypracovanie detailnej špecifikácie "prechodu integračnej platformy SAP XI na euro"	8 days	Mon 19.5.08	Wed 28.5.08	
35	pripomienkovanie detailných špecifikácií	5 days	Thu 29.5.08	Wed 4.6.08	
36	zpracovanie pripomienok	2 days	Thu 5.6.08	Fri 6.6.08	
37	overenie zapracovania pripomienok, finalizácia a akceptácia dokumentov	2 days	Mon 9.6.08	Tue 10.6.08	
38	Etap 2: Detailná špecifikácia - bankové aplikácie IS SŠP	31 days	Mon 19.5.08	Mon 30.6.08	
39	vypracovanie detailnej špecifikácie "prechodu bankových aplikácií IS SŠP na euro"	18 days	Mon 19.5.08	Wed 11.6.08	
40	pripomienkovanie detailnej špecifikácie	7 days	Thu 12.6.08	Fri 20.6.08	
41	zpracovanie pripomienok	3 days	Mon 23.6.08	Wed 25.6.08	
42	overenie zapracovania pripomienok, finalizácia a akceptácia dokumentu	3 days	Thu 26.6.08	Mon 30.6.08	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Half 2, 2008												Half 1, 2009											
					A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A											
43	Etapa 3:Implementácia a test funkcionality pre duálne zobrazovanie SAP	31 days	Mon 19.5.08	Mon 30.6.08																								
44	vývoj funkcionality pre duálne zobrazovanie SAP aplikácii IS SŠP	10 days	Mon 19.5.08	Fri 30.5.08																								
45	II. cyklus testov - duálne zobrazovanie SAP aplikácii IS SŠP	10 days	Mon 2.6.08	Fri 13.6.08																								
46	vývoj funkcionality pre duálne zobrazovanie IS ESO	10 days	Mon 19.5.08	Fri 30.5.08																								
47	II. cyklus testov - duálne zobrazovanie IS ESO	10 days	Mon 2.6.08	Fri 13.6.08																								
48	vývoj funkcionality pre duálne zobrazovanie AC KSK	10 days	Mon 19.5.08	Fri 30.5.08																								
49	II. cyklus testov - duálne zobrazovanie AC KSK	10 days	Mon 2.6.08	Fri 13.6.08																								
50	vývoj funkcionality pre duálne zobrazovanie plat. portály KSK a NSK	10 days	Mon 19.5.08	Fri 30.5.08																								
51	II. cyklus testov - duálne zobrazovanie plat. portály KSK a NSK	10 days	Mon 2.6.08	Fri 13.6.08																								
52	vývoj funkcionality pre duálne zobrazovanie ACIS (PSCD/FI)	10 days	Mon 19.5.08	Fri 30.5.08																								
53	II. cyklus testov - duálne zobrazovanie ACIS (PSCD/FI)	10 days	Mon 2.6.08	Fri 13.6.08																								
54	súčinnosť SAP XI počas II. cyklu testov	20 days	Mon 19.5.08	Fri 13.6.08																								
55	Akceptácia etapy 3	0 days	Mon 30.6.08	Mon 30.6.08																								
56	Duálne zobrazovanie - nábeh produktívnej prevádzky* závisí od termínu rozhodnutia EK	0 days	Fri 1.8.08	Fri 1.8.08																								
57	Etapa 4:Implementácia funkcionality bankových aplikácii IS SŠP pre rozpočtový rok 2009	104 days	Mon 7.7.08	Fri 28.11.08																								
58	vývoj funkcionality bankových aplikácii pre rozpočtový rok '09	78 days	Mon 7.7.08	Wed 22.10.08																								
59	test funkcionality bankových aplikácii pre rozpočtový rok '09	17 days	Thu 23.10.08	Fri 14.11.08																								
60	Nábeh produktívnej prevádzky - funkcionality bankových aplikácii pre rozpočtový rok '09	0 days	Fri 28.11.08	Fri 28.11.08																								
61	Etapa 5:Implementácia a test funkcionality pre konverziu na euro	130 days	Mon 19.5.08	Mon 17.11.08																								
62	vývoj a test funkcionality TCC - SAP aplikácie IS SŠP	50 days	Mon 16.6.08	Fri 22.8.08																								
66	vývoj a test funkcionality TCC - IS ESO	50 days	Mon 16.6.08	Fri 22.8.08																								
70	vývoj a test funkcionality TCC - AC KSK	50 days	Mon 16.6.08	Fri 22.8.08																								
74	vývoj a test funkcionality TCC - plat. portály KSK a NSK	50 days	Mon 16.6.08	Fri 22.8.08																								
78	vývoj a test funkcionality TCC - ACIS (PSCD/FI)	50 days	Mon 16.6.08	Fri 22.8.08																								
82	súčinnosť SAP XI počas testov TCC	50 days	Mon 16.6.08	Fri 22.8.08																								
83	vývoj a test funkcionality LCC - SAP aplikácie IS SŠP	60 days	Mon 16.6.08	Fri 22.8.08																								
87	vývoj a test funkcionality LCC - IS ESO	60 days	Mon 25.8.08	Fri 14.11.08																								
91	vývoj a test funkcionality LCC - AC KSK	60 days	Mon 25.8.08	Fri 14.11.08																								
95	vývoj a test funkcionality LCC - plat. portály KSK a NSK	60 days	Mon 25.8.08	Fri 14.11.08																								
99	vývoj a test funkcionality LCC - ACIS (PSCD/FI)	60 days	Mon 25.8.08	Fri 14.11.08																								
103	súčinnosť SAP XI počas testov LCC	60 days	Mon 25.8.08	Fri 14.11.08																								
104	vývoj funkcionality pre konverziu na euro bankové aplikácie IS SŠP	68 days	Wed 13.8.08	Fri 14.11.08																								
105	vývoj funkcionality pre konverziu na euro Wallstreet Suite	43 days	Mon 19.5.08	Wed 16.7.08																								
106	test funkcionality pre konverziu na euro Wallstreet Suite	22 days	Thu 17.7.08	Fri 15.8.08																								
107	vývoj integračných rozhraní pre konverziu na euro Wallstreet Suite	65 days	Mon 18.8.08	Fri 14.11.08																								
108	Freeze zmenových konaní	0 days	Wed 1.10.08	Wed 1.10.08																								
109	Finálne verzie aplikácií pre generálny test	0 days	Mon 17.11.08	Mon 17.11.08																								

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Half 2, 2008												Half 1, 2009												
					A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
110	Etapla 6:Generálny test euro-kompatibilných aplikácií a rozhraní	25 days	Mon 17.11.08	Fri 19.12.08																									
111	generálny test bankových aplikácií IS SŠP a ich rozhraní	25 days	Mon 17.11.08	Fri 19.12.08																									
112	generálny test SAP aplikácií IS SŠP a ich rozhraní	25 days	Mon 17.11.08	Fri 19.12.08																									
113	generálny test funkcionality po TCC konverzii SAP aplikácií IS SŠP a ich rozhraní	10 days	Mon 17.11.08	Fri 28.11.08																									
114	generálny test funkcionality po LCC konverzii SAP aplikácií IS SŠP a ich rozhraní	15 days	Mon 1.12.08	Fri 19.12.08																									
115	generálny test aplikácie IS ESO a jej rozhraní	25 days	Mon 17.11.08	Fri 19.12.08																									
116	generálny test funkcionality po TCC konverzii aplikácie IS ESO a jej rozhraní	10 days	Mon 17.11.08	Fri 28.11.08																									
117	generálny test funkcionality po LCC konverzii aplikácie IS ESO a jej rozhraní	15 days	Mon 1.12.08	Fri 19.12.08																									
118	generálny test aplikácie AC KSK a jej rozhraní	25 days	Mon 17.11.08	Fri 19.12.08																									
119	generálny test funkcionality po TCC konverzii aplikácie AC KSK a jej rozhraní	10 days	Mon 17.11.08	Fri 28.11.08																									
120	generálny test funkcionality po LCC konverzii aplikácie AC KSK a jej rozhraní	15 days	Mon 1.12.08	Fri 19.12.08																									
121	generálny test plat. portálov KSK a NSK a ich rozhraní	25 days	Mon 17.11.08	Fri 19.12.08																									
122	generálny test funkcionality po TCC konverzii plat. portálov KSK a NSK a ich rozhraní	10 days	Mon 17.11.08	Fri 28.11.08																									
123	generálny test funkcionality po LCC konverzii plat. portálov KSK a NSK a ich rozhraní	15 days	Mon 1.12.08	Fri 19.12.08																									
124	generálny test aplikácie ACIS (PSCD/FI) a jej rozhraní	25 days	Mon 17.11.08	Fri 19.12.08																									
125	generálny test funkcionality po TCC konverzii aplikácie ACIS (PSCD/FI) a jej rozhraní	10 days	Mon 17.11.08	Fri 28.11.08																									
126	generálny test funkcionality po LCC konverzii aplikácie ACIS (PSCD/FI) a jej rozhraní	15 days	Mon 1.12.08	Fri 19.12.08																									
127	súčinnosť SAP XI počas generálneho testu	25 days	Mon 17.11.08	Fri 19.12.08																									
128	generálny test aplikácie Wallstreet Suite a jej rozhraní	25 days	Mon 17.11.08	Fri 19.12.08																									
129	Etapla 7:Konverzia transakčných dát v SAP aplikáciách	40 days	Mon 22.12.08	Mon 16.2.09																									
130	VSTUP DO EMU	0 days	Thu 1.1.09	Thu 1.1.09																									
131	Nasadenie euro funkcionality do prod. prevádzky-bankové aplikácie a WSS, SAP kmeňové dáta, TCC verzia	13 days	Mon 22.12.08	Wed 7.1.09																									
132	Ukončenie ročnej účtovnej závierky 2008 - MF SR, ŠP, KSK, NSK, PSCD/FI CS SR	0 days	Tue 20.1.09	Tue 20.1.09																									
133	Nasadenie SAP verzia LCC lokálna mena euro - konverzia transakčných dát	5 days	Tue 27.1.09	Mon 2.2.09																									
134	Koniec konverzie systémov	0 days	Mon 2.2.09	Mon 2.2.09																									
135	Finálna akceptácia	0 days	Mon 16.2.09	Mon 16.2.09																									

Príloha č. 4

Požadovaná súčinnosť zo strany Objednávateľa

Pre realizáciu dodávky zo strany Zhotoviteľa je Objednávateľ povinný poskytnúť primeranú súčinnosť ako Zhotoviteľovi, tak i jeho subdodávateľom, v požadovanom rozsahu vrátane poskytnutia informácií, dokumentácie, súhlasov a ostatných materiálov potrebných na plnenie dodávky a zabezpečenie poskytnutia súčinnosti tretích strán, ktorými sú najmä dodávatelia ostatných softvérov, aplikácií a metodických podkladov. Objednávateľ je povinný zabezpečiť súčinnosť tretích strán, pokiaľ je to potrebné pre plnenie dodávky zo strany Zhotoviteľa.

Úspešné a včasné dodržanie záväzkov a povinností Zhotoviteľa, popísaných v tejto zmluve, je viazané a podmienené poskytnutím súčinnosti zo strany Objednávateľa tak, ako je ďalej uvedené v tejto kapitole.

Dostupnosť zdrojov Objednávateľa

Objednávateľ v rozsahu a čase nevyhnutnom na úspešné a včasné plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy:

- najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy vytvorí pracovné skupiny relevantné pre schválenie Detailnej špecifikácie a pre testovanie funkcionality aplikácií,
- poskytne zamestnancom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov prístup k zariadeniam, systémom a aplikáciám, dotknutým plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, a to aj mimo pracovnej doby a v dňoch pracovného voľna,
- umožní zamestnancom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľom prístup do priestorov súvisiacich s plnením dodávky počas pracovnej doby, mimo pracovnej doby a v dňoch pracovného voľna po predchádzajúcom odsúhlasení Objednávateľom..

Požiadavky na Projektový tím Objednávateľa

Pre úspešnú implementáciu a dodávku ponúkaného riešenia je potrebné, aby projektový tím Objednávateľa:

- mal prístup k požadovaným zdrojom,
- mal mandát na priame rozhodovanie na strane Objednávateľa,
- mal znalosti, ktoré zahŕňajú:
 - oblasť relevantných firemných procesov,
 - vstupné zdroje a externé dáta,
 - systémy a aplikácie, ktoré budú prepojené s aplikačným vybavením,
 - podrobné definície údajov, ktoré budú vymieňané so systémami, s ktorými bude prepojený s aplikačným vybavením,
 - oblasť relevantných aplikačných a sieťových rozhraní,
 - oblasť metodík (a príslušných vzorov a formulárov), podľa ktorých majú byť vypracované jednotlivé časti dokumentácie riešenia
 - oblasť relevantnej LAN/WAN infraštruktúry,

- oblasť IT prevádzky aplikácií, databáz, operačných systémov a serverovských zdrojov, HW a komunikačnej infraštruktúry,
- efektívne posúdenie dokumentácie analýzy, návrhu a rozhraní aplikačného vybavenia,

Objednávateľ je ďalej povinný poskytnúť súčinnosť v týchto oblastiach:

- menovať z radov svojich pracovníkov do projektových tímov odporučený počet kvalifikovaných, kompetentných pracovníkov so zodpovednosťami v danej oblasti s primeranými schopnosťami,
- zaistiť, aby kapacitné uvoľnenie vedúcich tímov a členov tímov bolo v rozsahu neohrozujúcom riadny postup projektu,
- menovať Projektového manažéra s dostatočnými právomocami, koordinovať a kontrolovať projektové tímy s časovou kapacitou vyčlenenou na tento Projekt neohrozujúcou riadny postup Projektu,
- napomáhať včasnému prijímaniu rozhodnutí príslušnými kompetentnými pracovníkmi Objednávateľa, ktoré sú nad rámec kompetencií orgánov Projektu,
- zaistiť dostatočný prístup k technickým a programovým prostriedkom súvisiacim s plnením predmetu zmluvy,
- zabezpečiť aktívnu účasť používateľov na testovaní a ich proaktívny prístup pri zisťovaní problémov (napr. bude potrebné vysporiadať zle zaúčtované doklady a pod.). Na to musia mať podporu vlastného vedenia a vyčlenený čas na tieto pracovné úlohy,
- pre systém AC KSK je potrebné zdôrazniť, že všetkých 7 OvZP, ktoré majú implementovaný SAP, sa musí zúčastniť testovania konverzií. Všetkých 7 organizácií musí postupovať koordinovane, konverzie je možné vykonávať len v rovnakom časovom bode za všetky organizácie,
- pre systém RIS je potrebné zabezpečiť súčinnosť dodávateľa tohto systému pri napínaní údajov rozpočtov a číselníkov pre roky 2008-2009 v etape testovania funkcionality bankových aplikácií pre rozpočtový rok 2009 a v etape generálneho testu bankových aplikácií IS SŠP a ich rozhraní.
- rovnako ako v predchádzajúcom bode je nutná koordinácia a spoločný postup všetkých 9 účtovných okruhov, ktoré sú v systéme IS ESO, pri testovaní a realizácii euro konverzií.
- Colná správa SR, ktorej zriaďovateľom je MF SR, poskytne pre IS ACIS údajovú, personálnu a administrátorskú súčinnosť v rozsahu potrebnom pre uvedenie inštancií ACIS – PSCD/FI pre účely euro konverzie do funkčnej prevádzky, schopnej zabezpečiť podporu aktivít v harmonograme (relevantných pre Colnú správu) definovaných v tejto zmluve a jej prílohách.

Požiadavky na testovacie prostredie

Pred začiatkom implementácie projektu „Zabezpečenie prechodu vybraných informačných systémov riadenia verejných financií na euro“ je potrebné vybudovať samostatné „euro testovacie“ prostredie vybraných informačných systémov riadenia verejných financií. Súčasnú testovacie prostredie IS pre SŠP a ostatných systémov MF SR je určené na vývoj a testovanie novej funkcionality podľa už objednaných a pripravovaných zmenových konaní, ktoré nesúvisia s prechodom na euro, z tohto dôvodu je potrebné vybudovať nové oddelené testovacie prostredie na testovanie prechodu vybraných informačných systémov riadenia verejných financií na euro minimálne na obdobie trvania projektu.

Testovacie prostredie musí zahŕňať nasledovné systémy:

1. Bankové aplikácie IS SŠP: ManEx/AccoMan/PayEx/PlarEx/FlexMan/UseMan,
2. SAP aplikácie IS SŠP: SAP R/3 moduly FI, AM, FM, MM, HR a IIM a Výkazníctvo ŠP (SAP BW),
3. IS ESO: moduly SAP R/3 FI, AM, CO, FM, MM, HR,
4. AC KSK: moduly SAP R/3 FI, AM, CO, FM, HR, modul BW, modul Riadenie rozpočtu,
5. Platobné portály: modul Platobný portál KSK, modul Platobný portál NSK,
6. Wallstreet Suite (WSS),
7. ACIS Colnej správy: modul PSCD, FI. Bude vytvorený samostatný testovací systém PSCD v priestoroch Colnej správy vo väzbe na testovací systém IS ESO - UO VPS - EURO)
8. Integrovaná platforma SAP XI.

Testovacie prostredie musí obsahovať tiež:

- kópiu produkčných dát vyššie uvedených informačných systémov
- kópiu aktuálnej produkčnej verzie vyššie uvedených informačných systémov
- integračné väzby medzi vyššie uvedenými informačnými systémami navzájom
- integračné väzby na testovacie inštalácie ostatných informačných systémov (napr. RIS, SIPS verzia euro, Target2, atď.)
- testovacie údaje pre integračné väzby (najmä RIS)

Obstaranie a inštalácia potrebnej hardvérovej infraštruktúry a softvérových licencií pre testovacie a produkčné prostredie vyššie uvedených aplikácií je plne v zodpovednosti Objednávateľa. Predmetom dodávky Zhotoviteľa je vytvorenie kópie produkčných dát a kópie aktuálnej produkčnej verzie vyššie uvedených aplikácií (okrem systému AC KSK, kde je to zodpovednosťou Objednávateľa, resp. IT oddelenia KSK) do „euro testovacieho“ prostredia Objednávateľa.

Požiadavky na hardvérovú infraštruktúru testovacieho prostredia:

1. Testovací server pre SAP IS SŠP a SAP BW (Výkazníctvo ŠP)
požadovaná konfigurácia servera:
 - 8GB RAM
 - CPU 6xHPPA-RISCpožadovaný priestor na diskovom poli:
pre SAP R/3 moduly 150 GB,
pre SAP BW 80 GB
2. Testovací databázový server pre bankové aplikácie ManEx/AccoMan/PayEx/PlarEx:
požadovaná konfigurácia servera:
 - 8GB RAM
 - CPU 4xHPPA-RISCpožadovaný priestor na diskovom poli:
610 GB v prípade úplnej kópie produkčných dát
3. Testovací aplikačný server pre bankové aplikácie ManEx/AccoMan/PayEx/PlarEx je k dispozícii, keďže v súčasnom testovacom prostredí sú dva aplikačné servery.
4. testovací aplikačný server SAP XI za účelom integračného testovania rozhraní medzi aplikáciami, ktoré sú zapojené do integračnej platformy SAP XI. Navrhujeme využiť jeden z dvoch produkčných cluster serverov pre decentrálny adapter engine SAP XI, prípadne rozšíriť existujúci testovací server SAP XI o rozhrania na testovacie systémy euro.
 - požadovaný priestor na diskovom poli: 60 GB

5. testovací aplikačný server ESO je k dispozícii – server rx7620, ktorý bol pôvodne v produkčnom prostredí, je teraz v testovacom prostredí a dá sa využiť aj na testovanie euro funkcionality. Testovací server ESO je konfigurovaný na 2 samostatné logické partície, navrhujeme tento server rozšíriť na 2. partíciu o 4GB RAM. CPU postačuje, obe partície majú priradené po 2 CPU, spolu 4xCPU.
 - potreba rozšíriť testovací server o 4GB RAM
 - požadovaný priestor na diskovom poli pre úplnú kópiu produkčných dát: 90 GB
6. testovací server WallStreet Suite ,
7. testovací server AC KSK ,
8. testovací server Platobného portálu NSK ,
9. testovací server ACIS (PSCD/FI).

Príloha č. 5

Popis akceptácií a preberania diela

Akceptačné testy aplikácie overujú, že riešenie spĺňa požiadavky Objednávateľa, funkcionality a technické riešenie v rozsahu definovanom zmluvou.

Akceptačné testy sa uskutočnia na základe Zhotoviteľom dodaných špecifikácií akceptačných testov, ktorá bude obsahovať popis akceptačných testov, testovacie dáta, príslušné prostredie, poradie vykonávania akceptačných testov, testovacie kritériá a časový plán akceptačných testov.

Cieľom akceptácie je dokumentovať úspešnosť realizácie, integrácie a inštalácie u Objednávateľa. Výsledkom akceptácie je zdokumentovaný akceptačný protokol podpísaný Oprávnenou osobou Objednávateľa a Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ nepreberá zodpovednosť za chyby spôsobené zmenou prostredia, ako napríklad zmenu vstupného dátového formátu, alebo zmeny procesného systému, ktoré neboli špecifikované alebo identifikované vo funkčnej špecifikácii. Zhotoviteľ je však nápomocný pri riešení plánovaných alebo neplánovaných zmien a definuje rozsah prác a náklady pre Objednávateľa spojené s odstránením nedostatkov. Vyriešenie uvedených problémov môže byť riešené prostredníctvom zmenového konania.

Akceptačné testy systému vyžadujú testovanie systému samotného, v prípade, že vyžadujú aj testovanie rozhraní pre zariadenia, ktoré nie sú dodávané Zhotoviteľom a nie sú súčasťou zmluvy, Objednávateľ musí ukončiť testy všetkých zariadení, ktoré nie sú podporované Zhotoviteľom pred začatím akceptačných testov. V prípade, že testy príslušných externých zariadení nie sú kompletné, Objednávateľ bude garantovať Zhotoviteľovi úľavu a vylúčenie ovplyvneného testu.

Akceptačné podmienky a podmienky preberania aplikácie

Komponent úspešne absolvoval akceptačné testy za predpokladu, že:

- nezostali neopravené žiadne chyby majúce kategóriu 3
- všetky chyby s kategóriou 2 majú vzájomne odsúhlasený plán opráv a ich počet neprevyšuje počet dohodnutý v kritériách akceptačných testov
- všetky chyby s kategóriou 1 majú vzájomne odsúhlasený plán opráv a ich počet neprevyšuje počet dohodnutý v kritériách akceptačných testov.

Ak bol Komponent Objednávateľom akceptovaný, rozumie sa tomu tak, že spĺňa špecifikácie uvedené v Detailnej špecifikácii, pričom Zhotoviteľ bude oprávnený spoľahnúť sa na vyššie uvedené pri vykonávaní neskorších fáz projektu, s výnimkou prípadu, že by taká akceptácia bránila Akceptácii diela ako celku.

Klasifikácia chýb:

Vada systému kategórie 3 – vada systému brániaca akceptácii

Podstatná vada systému - riadna prevádzka systému nie je možná, alebo je znížená do neprijateľnej miery touto chybou viac ako 24 hodín. Chybu zároveň nie je možné obísť pomocou nejakej obchádzky, alebo Objednávateľom akceptovateľného náhradného postupu.

Príklad: informačný systém nepracuje a opätovne nenabieha, strata/zničenie dát, chybné výsledky pri masovom spracúvaní dát.

Opatrenia: kvalifikovaný personál Zhotoviteľa začne počas servisnej pohotovosti najneskôr v rámci dohodnutého reakčného času spracúvať chybu a ručí aspoň krátkodobo za náhradné riešenie a pokiaľ to je možné, aspoň krátkodobo za odstránenie príčiny vady napr. výmenou hardvérových komponentov a prekonfiguráciou softvéru, odstránením vady softvéru prostredníctvom patchov. Zhotoviteľ okrem toho nahlási vadu – s výnimkou poruchy z opotrebovania – obratom a s vysokou prioritou výrobcovi, ak ním nie je sám Zhotoviteľ.

Vada systému kategórie 2 – chyba, ktorá nebráni akceptácii

Nepodstatná vada systému - riadna prevádzka nie je ovplyvnená natoľko, aby to zabránilo testovaniu funkčnosti (napr. zlyhanie funkcie). Každá vada, ktorú by mohli rozpoznať Objednávateľovi klienti, sa automaticky považuje prinajmenšom za vadu s prioritou 2. Takéto vady budú odstránené počas testovania funkčnosti, pokiaľ to bude možné a následne skontrolované. Zvyšné nedostatky budú uvedené v zozname nedostatkov pred koncom testovania funkčnosti. Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodnú termín, do ktorého budú nedostatky odstránené. Takáto vada systému nie je dôvodom pre odloženie testovania funkčnosti a ani nezabráni prevzatiu diela.

Príklad: nesprávne alebo nekonzistentné spracúvanie, citelne nižší výkon informačného systému ako bol dohodnutý, hromadenie krátkodobých závad prevádzky.

Opatrenia: kvalifikovaný personál Zhotoviteľa začne počas servisnej pohotovosti najneskôr v rámci dohodnutého reakčného času spracúvať vadu a ručí aspoň krátkodobo za náhradné riešenie a pokiaľ to je možné aspoň krátkodobo za odstránenie príčiny vady napr. výmenou hardvérových komponentov a prekonfiguráciou softvéru, odstránením vady softvéru prostredníctvom patchov. Zhotoviteľ okrem toho nahlási vadu – s výnimkou poruchy z opotrebovania – obratom a s vysokou prioritou výrobcovi, ak ním nie je sám Zhotoviteľ.

Vada systému kategórie 1 – malá chyba, ktorá nebráni akceptácii

Malá vada systému - neovplyvňuje riadnu prevádzku. Takáto vada systému nie je dôvodom pre odloženie testovania funkčnosti a ani nezabráni prevzatiu diela. Jedná sa o problémy drobného charakteru a vady, ktoré nebránia efektívnemu používaniu Systému. Môžu to byť menšie vady na obrazovkách alebo drobné odchýlky od očakávanej prevádzky.

Príklad: nesprávne chybové hlásenia (softvér prejde do stavu čakania a dá sa aktivovať iba stlačením klávesy).

Opatrenia: kvalifikovaný personál Zhotoviteľa začne v primeranom čase spracúvať vadu a ručí aspoň krátkodobo za náhradné riešenie a pokiaľ to je možné, aspoň krátkodobo za odstránenie príčiny vady napr. výmenou hardvérových komponentov a rekonfiguráciou softvéru, odstránením väd softvéru v rámci politiky uvoľnenia verzie. Zhotoviteľ okrem toho nahlási vadu s výnimkou poruchy z opotrebovania – obratom a s vysokou prioritou výrobcovi, ak ním nie je sám Zhotoviteľ.

Objednávateľ môže odmietnuť akceptáciu len vtedy, ak je identifikovaná Vada systému kategórie 3 alebo Vád kategórie 2 je viac ako tri alebo celkový počet Vád presiahne dvadsať.

Akceptačné testy a zodpovednosti

1. Príprava testovacích scenárov je v zodpovednosti Zhotoviteľa. Testovacie scenáre budú pokrývať všetky funkcie zmenené plnením podľa tejto Zmluvy. Pokrytie funkcií testovacími scenármi bude prezentované súhrnným zoznamom testovacích scenárov.
2. Za vykonanie akceptačných testov je zodpovedný Objednávateľ. Zhotoviteľ bude asistovať Objednávateľovi v plánovaní, vykonávaní a dokumentovaní akceptačných testov v dohodnutom časovom pláne.
3. Úlohou Objednávateľa bude pripraviť dáta pre akceptačné testy a dohodnúť podrobnosti akceptačných testov so Zhotoviteľom, ktorý ich odsúhlasí a Objednávateľ potom vykoná akceptačné testy podľa harmonogramu projektu.
4. Plán akceptačných testov pripraví Objednávateľ za pomoci Zhotoviteľa. V dokumente sa uvedie, ako sa budú tieto funkcie testovať a tiež budú definované podmienky testovania. Plán akceptačných testov bude podliehať súhlasu a oficiálnemu schváleniu Zhotoviteľa.
5. Akceptačné testy vykoná Objednávateľ (s podporou Zhotoviteľa tam, kde to bude potrebné) podľa plánu akceptačných testov. Správa o akceptačných testoch sa použije na oficiálne zaznamenanie výsledkov testov a primerane podrobne určí všetky odchýlky medzi dodaným systémom a funkciami uvedenými v Detailnej špecifikácii. Pokiaľ niektoré odchýlky od Detailnej špecifikácie vyžadujú iba malé opravy a zásadne neovplyvnia funkčnú prevádzku systému alebo jeho modulu, potom bude systém považovaný za prijatý a odchýlky budú opravené v rámci dohodnutého obdobia po prevzatí (akceptácii).
6. Ak sa počas testu odhalí alebo objaví nejaká chyba, test bude pokračovať, nezastaví sa, ani sa nerešartuje. Objednávateľ bezodkladne písomne zaznamená a nahlási všetky chyby počas akceptačného testu podľa postupov, na ktorých sa dohodli Projektoví manažéri.
7. Projektový tím sa počas akceptačných testov vynasnaží opraviť podľa možnosti čo najviac chýb. Avšak pripúšťa sa, že niektoré opravy sa nepodari dokončiť pred ukončením testu. Všetky takéto neopravené chyby budú zahrnuté do záverečnej správy za účelom vykonania opravných krokov.
8. Definitívne opravy zostávajúcich neopravených chýb sa vykonajú čo najskôr, ako to bude primerane možné. Po dodaní každej definitívnej

opravy Objednávateľ urýchlene vykoná test opravy konkrétnej chyby, aby overil, či oprava vykonaná projektovým tímom adekvátne opravila chyby nahlásené a definované v záverečnej správe.

Akceptácia dokumentácie

Keď Zhotoviteľ dodá dokumentáciu ako časť dodávky projektu, každá dodávka dokumentu bude zo začiatku vyvíjaná ako pracovná verzia. Projektový manažér môže dohodnúť pracovné stretnutia, vrátane členov tímu Zhotoviteľa a/alebo Objednávateľa, z dôvodu vylepšenia a spresnenia napísaného pracovného dokumentu.

Keď je pracovný dokument kompletný, Projektový manažér Zhotoviteľa predloží prvú finálnu verziu dokumentu elektronickou formou (zaslanie e-mailom) a doručenie jednej kópie v tlačovej forme Projektovému manažérovi Objednávateľa na revíziu a pripomienkovanie. Projektový manažér Objednávateľa je zodpovedný za distribúciu kópií prvej finálnej verzie dokumentu členom projektového tímu Objednávateľa pre interné pripomienkovanie. Projektový manažér Objednávateľa je zodpovedný za konsolidáciu pripomienok Objednávateľa a zabezpečí jasné označenie nedostatkov a pripomienok do predloženého dokumentu a zašle ho ako pripomienkovanú verziu Projektovému manažérovi Zhotoviteľa. Projektový manažér Objednávateľa bude mať podľa kategórie dokumentu adekvátny počet pracovných dní na revíziu a zaslanie konsolidovaných pripomienok Projektovému manažérovi Zhotoviteľa. Zhotoviteľ vykoná revíziu a vyhodnotí pripomienky Objednávateľa a zašle odpoveď počas adekvátneho počtu pracovných dní podľa kategórie dokumentu. Pripomienky Objednávateľa a Zhotoviteľove odporúčania budú buď diskutované a/alebo priamo integrované do finálnej verzie a doručené Projektovému manažérovi Objednávateľa počas adekvátneho počtu pracovných dní podľa kategórie dokumentu. Dodanie finálnej verzie dokumentu zaväzuje Objednávateľa k akceptácii dokumentu.

V prípade, že neboli prijaté žiadne pripomienky od Projektového manažéra Objednávateľa v dohodnutom čase podľa kategórie dokumentu, akceptácia je ukončená a dokument bude považovaný za finálnu verziu.

Dokument jednoduchý (typický rozsah do 50 strán):

- 4 pracovné dni na zaslanie pripomienok zo strany Objednávateľa
- 3 pracovné dni na vyhodnotenie pripomienok zo strany Zhotoviteľa a zaslanie zapracovania.
- 2 pracovné dni na integráciu pripomienok, finalizáciu a akceptáciu dokumentu.

Dokument zložitý (typický rozsah nad 50 strán):

- 7 pracovných dní na zaslanie pripomienok zo strany Objednávateľa
- 3 pracovné dni na vyhodnotenie pripomienok zo strany Zhotoviteľa a zaslanie zapracovania.
- 3 pracovné dni na integráciu pripomienok, finalizáciu a akceptáciu dokumentu.

Príloha č. 6

Riadenie zmien

- 1.1 Ak si Objednávateľ alebo Zhotoviteľ želajú uskutočniť akúkoľvek zmenu v rozsahu dodávky, budú sa uplatňovať Postupy zmenového konania popísané v tejto Prílohe , ako aj ostatné relevantné ustanovenia Zmluvy.
- 1.2 Návrh na zmenu je Oprávnenej osobe Zhotoviteľa (Objednávateľa) oprávnená predložiť výlučne Oprávnená osoba Objednávateľa (Zhotoviteľa) na vopred odsúhlasenom tlačive. Oprávnená osoba Zhotoviteľa vedie evidenciu došlých návrhov zmien a zabezpečuje rámcové posúdenie zmeny najneskôr do troch pracovných dní od dátumu prevzatia návrhu.
- 1.3 Výsledkom rámcového posúdenia návrhu na zmenu je jej kategorizovanie na zmenu „menšieho rozsahu“ alebo zmenu „väčšieho rozsahu“. Zmena menšieho rozsahu je klasifikovaná ako zmena, kde uvedená zmena nespôsobí zvýšenie ceny a nepredĺži časový harmonogram o viac ako 3 pracovné dni. V prípade zmeny, kde dôsledkom jej vykonania bude zvýšenie ceny diela alebo predĺženie termínu dodávky o viac ako 3 pracovné dni, bude táto považovaná za zmenu väčšieho rozsahu.
- 1.4 V prípade zmeny menšieho rozsahu zabezpečí Oprávnená osoba Zhotoviteľa detailné posúdenie predloženého návrhu do troch pracovných dní od dátumu rámcového posúdenia zmeny. V prípade zmeny väčšieho rozsahu si oprávnené osoby obidvoch zmluvných strán dohodnú a písomne potvrdia termín detailného posúdenia navrhutej zmeny.
- 1.5 Výsledkom detailného posúdenia návrhu na zmenu je stanovisko oprávnenej osoby Zhotoviteľa k vhodnosti, potrebnosti a realizovateľnosti navrhovaných úprav spolu s ich finančným a časovým ocenením, resp. ďalšími predpokladmi ich uskutočnenia. V závere stanoviska použije Oprávnená osoba Zhotoviteľa nasledujúcu klasifikáciu navrhovanej zmeny:
 - a. je možné realizovať bez dopadu na náklady alebo Harmonogram plnenia,
 - b. je možné realizovať, ale s dopadom na náklady alebo Harmonogram plnenia,
 - c. neodporúča realizovať,
 - d. nie je možné realizovať,
 - e. nie je možné realizovať v rámci existujúcej zmluvy o dielo, odporúča sa evidovať ako námet pre nový projekt.
- 1.6 Návrh na zmenu spolu s jeho posúdením v zmysle vyššie uvedeného textu predkladá Oprávnená osoba Zhotoviteľa vždy Oprávnenej osobe Objednávateľa.
- 1.7 Za spracovanie detailného posúdenia návrhu na zmenu je Zhotoviteľ oprávnený požadovať primerané finančné plnenie.
- 1.8 Ak dôjde k dohode o zmene projektu a z toho vyplývajúcich zmien podmienok dodávky, riadi sa zmenený projekt tam, kde nebolo dohodnuté inak, pôvodnými ustanoveniami tejto zmluvy.

- 1.9 Zhotoviteľ bude realizovať zmeny či doplnky v projekte iba v tom prípade, že bude dosiahnutá dohoda v otázkach zmien termínov a zvýšenia či zníženia ceny projektu, alebo ďalších podmienok zmeneného plnenia Zhotoviteľa. Bez ohľadu na iné ustanovenia, v prípade zmeny inej ako menšieho rozsahu (ako je táto definovaná vyššie), bude zmena realizovaná až na základe samostatného postupu, výsledkom ktorého bude uzavretie písomného dodatku, alebo, ak tak rozhodne Objednávateľ, samostatnej zmluvy na také zmenené plnenie.

Príloha č. 7

Sadzby Zhotoviteľa pre jednotlivé role

Za účelom plnenia podľa bodu 18.3. Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných sadzbách:

- a) Enterprise level Project manager 4130,- Sk/hod bez DPH, čo je 4914.70 Sk/hod s 19 % DPH,
- b) Junior konzultant 3100,- Sk/hod bez DPH, čo je 3689,- Sk/hod s 19 % DPH pri výkonoch, ktorých náročnosť je menšia ako 10 človekodní, 2700,- Sk/hod bez DPH, čo je 3213,- Sk/hod s 19 % DPH pri výkonoch, ktorých náročnosť je 10 alebo viac človekodní
- c) Enterprise Level Consultant I. 4750,- Sk/hod bez DPH, čo je 5652.50 Sk/hod s 19 % DPH,
- d) Enterprise Level Consultant II. 5938,- Sk/hod bez DPH, čo je 7066.22,- Sk/hod s 19 % DPH,
- e) Senior konzultant 5300,- Sk/hod bez DPH, čo je 6307,- Sk/hod s 19 % DPH,

pričom obidve Zmluvné strany budú tieto ceny uplatňovať nasledovne:

- 3.2.1 Enterprise level Project manager - Cena bude účtovaná len v prípade, realizácie výkonu v celkovej dĺžke viac ako 10 človekodní, pričom na každých ďalších 10 človekodní sa počíta jeden deň projektového manažmentu;
- 3.2.2 Junior Consultant - Cena bude účtovaná za výkony vykonávané pre oblasť 1.2.1 Zmluvy
- 3.2.3 Enterprise Level Consultant I. - Cena bude účtovaná za výkony vykonávané pre oblasť 1.2.2 až 1.2.8 Zmluvy
- 3.2.4 Enterprise Level Consultant II - Cena bude účtovaná za výkony vykonávané pre oblasť SAP/3 moduly SAP Portál a SAP Bába,
- 3.2.5. Senior konzultant - Cena bude účtovaná za výkony vykonávané zamestnancami HP, poskytnuté na základe vzájomnej dohody HP a Zákazníka.

Riešenie spĺňa požiadavky Objednávateľa, funkcionality a technické riešenie v rozsahu definovanom Zmluvou.
