

DODATOK č. 1
k zmluve o dielo
na rozšírenie funkčnosti
Integračnej platformy informačného systému pre systém štátnej pokladnice

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

so sídlom:	Galvaniho 7, 820 02 Bratislava, P.O. Box 43
identifikačné číslo:	35 785 306
číslo účtu:	262545880/1100
bankové spojenie:	Tatra banka, a.s., Bratislava
konajúca:	Ing. Igorom Zemanom, konateľom
zapísaný v OR:	BA1, oddiel Sro, vložka 21438/B.

(ďalej tiež len „Zhotoviteľ“)

a

Slovenská republika

zastúpená

Ministerstvom financií Slovenskej republiky

so sídlom:	Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, P.O. Box 82
identifikačné číslo:	00151742
číslo účtu:	7000001400/8180
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
zastúpené:	Ing. Jaroslavom Miklom, vedúcim služobného úradu


(ďalej len „Objednávateľ“)

uzavreli dňa 10.11.2006 zmluvu o dielo na rozšírenie funkčnosti Integračnej platformy informačného systému pre systém štátnej pokladnice (ďalej tiež len “Zmluva”).

Zmluvné strany sa nižšie uvedeného dňa, mesiaca, roka, konajúc v zmysle bodu 22.6 Zmluvy, dohodli na tomto dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej tiež len “Dodatok”), ktorým upravujú Zmluvu v súlade s nasledujúcim:

A. Článok 3 Termíny plnenia Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

„3.1. Dielo bude zhotoviteľom ukončené a objednávateľovi odovzdané po etapách (čiastkových plneniach) vždy v termínoch pre jednotlivé čiastkové plnenia ako to vyplýva z Detailného harmonogramu prác uvedeného v Prílohe č.1 k tejto zmluve (ďalej tiež len „Harmonogram“). Zjednodušený harmonogram prác je uvedený nižšie.

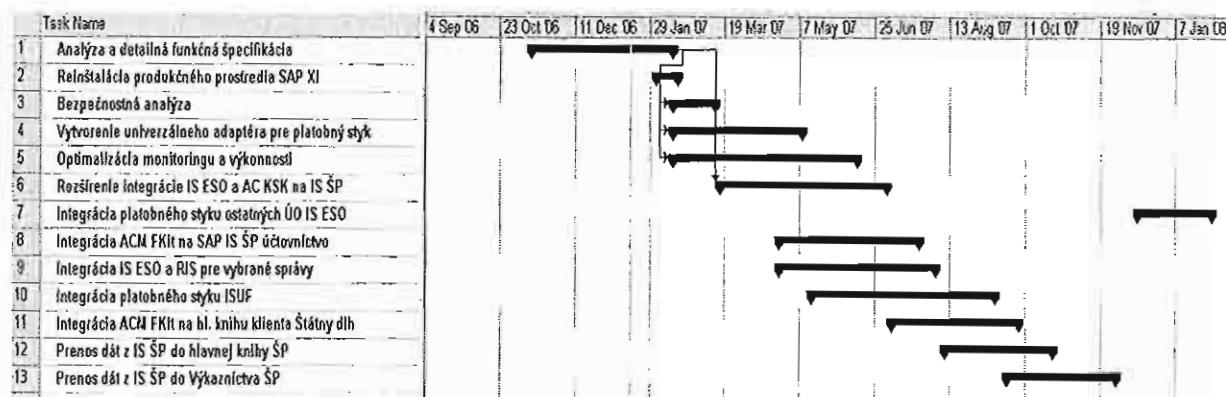

3.2 Dielo sa bude skladať z nasledujúcich čiastkových plnení, ktoré budú dokončené v súlade s nasledujúcim:

1. čiastkové plnenie - „Detailná funkčná špecifikácia“ - do 12.02.2007,
2. čiastkové plnenie - „Reinstalácia produkčného prostredia SAP XI“ - do 15.2.2007,
3. čiastkové plnenie - „Bezpečnostná analýza“ - do 12.03.2007,
4. čiastkové plnenie - „Vytvorenie univerzálneho adaptéra pre platobný styk“ - do 24.04.2007,
5. čiastkové plnenie - „Optimalizácia monitoringu a výkonnosti“ - do 14.05.2007,
6. čiastkové plnenie - „Rozšírenie integrácie IS ESO a AC KSK na IS ŠP“ - do 31.05.2007,
7. čiastkové plnenie - „Integrácia platobného styku ostatných ÚO IS ESO“ - do 31.12.2007,
8. čiastkové plnenie - „Integrácia ACM FKIt na SAP IS ŠP účtovníctvo“ - do 21.06.2007,
9. čiastkové plnenie - „Integrácia IS ESO a RIS pre vybrané správy“ - do 04.07.2007,
10. čiastkové plnenie - „Integrácia platobného styku ISUF“ - do 09.08.2007,
11. čiastkové plnenie - „Integrácia ACM FKIt na hlavnú knihu klienta ŠD“ - do 27.08.2007,
12. čiastkové plnenie - „Prenos dát z IS ŠP do hlavnej knihy ŠP“ - do 18.09.2007,
13. čiastkové plnenie - „Prenos dát z IS ŠP do Výkazníctva ŠP“ - do 29.10.2007.

3.3. Dielo ako celok sa bude považovať za ukončené akceptáciou posledného čiastkového plnenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť dielo ako celok do 31.1.2008“

B. Bod 2.1 *Detailná funkčná špecifikácia* Prílohy č.1 (Špecifikácia predmetu diela) k Zmluve sa dopĺňa o nasledovné znenie:

„Pre dodávku podľa bodu 2.6 Prílohy č.1 *Rozšírenie integrácie IS ESO a AC KSK na informačný systém SŠP – nahradenie niektorých manuálnych operácií používateľa cez obrazovky ManEx automatickou komunikáciou na úrovni systém-systém* sa Detailná funkčná špecifikácia časti pre IS ESO spracuje pre účtovný okruh MF01.

Pre dodávku podľa bodu 2.7 Prílohy č.1 *Integrácia platobného styku ostatných účtovných okruhov IS ESO* sa Detailná funkčná špecifikácia spracuje pre predpoklad, že novointegrované účtovné okruhy budú pre oblasť integrácie používať metodiku práce a procesy totožné s účtovným okruhom MF01.“


C. Článok 18 *Súčinnosť a iné záväzky zmluvných strán* sa dopĺňa bodom 18.10 v nasledovnom znení:


„18.10 Za účelom realizovateľosti dodávky podľa bodu 3.2.7. Zmluvy *Integrácia platobného styku ostatných ÚO IS ESO* sa Objednávateľ zaväzuje:

- a) zjednotiť účtovnú metodiku a účtovné postupy všetkých účtovných okruhov systému IS ESO podľa vzoru účtovného okruhu MF01 do 31.9.2007,
- b) do 31.10.2007 nasadiť na testovacie prostredie verziu IS ESO v súlade s predchádzajúcim bodom 18.10 a)
- c) do 31.12.2007 nasadiť na produkčné prostredie verziu IS ESO v súlade s predchádzajúcimi bodmi 18.10 a) a 18.10 b)“

D. Bod 4. *Detailný harmonogram prác* Prílohy č.1 (Špecifikácia predmetu diela) k Zmluve sa nahrádza novým nasledovným znením:


4. Detailný harmonogram prác

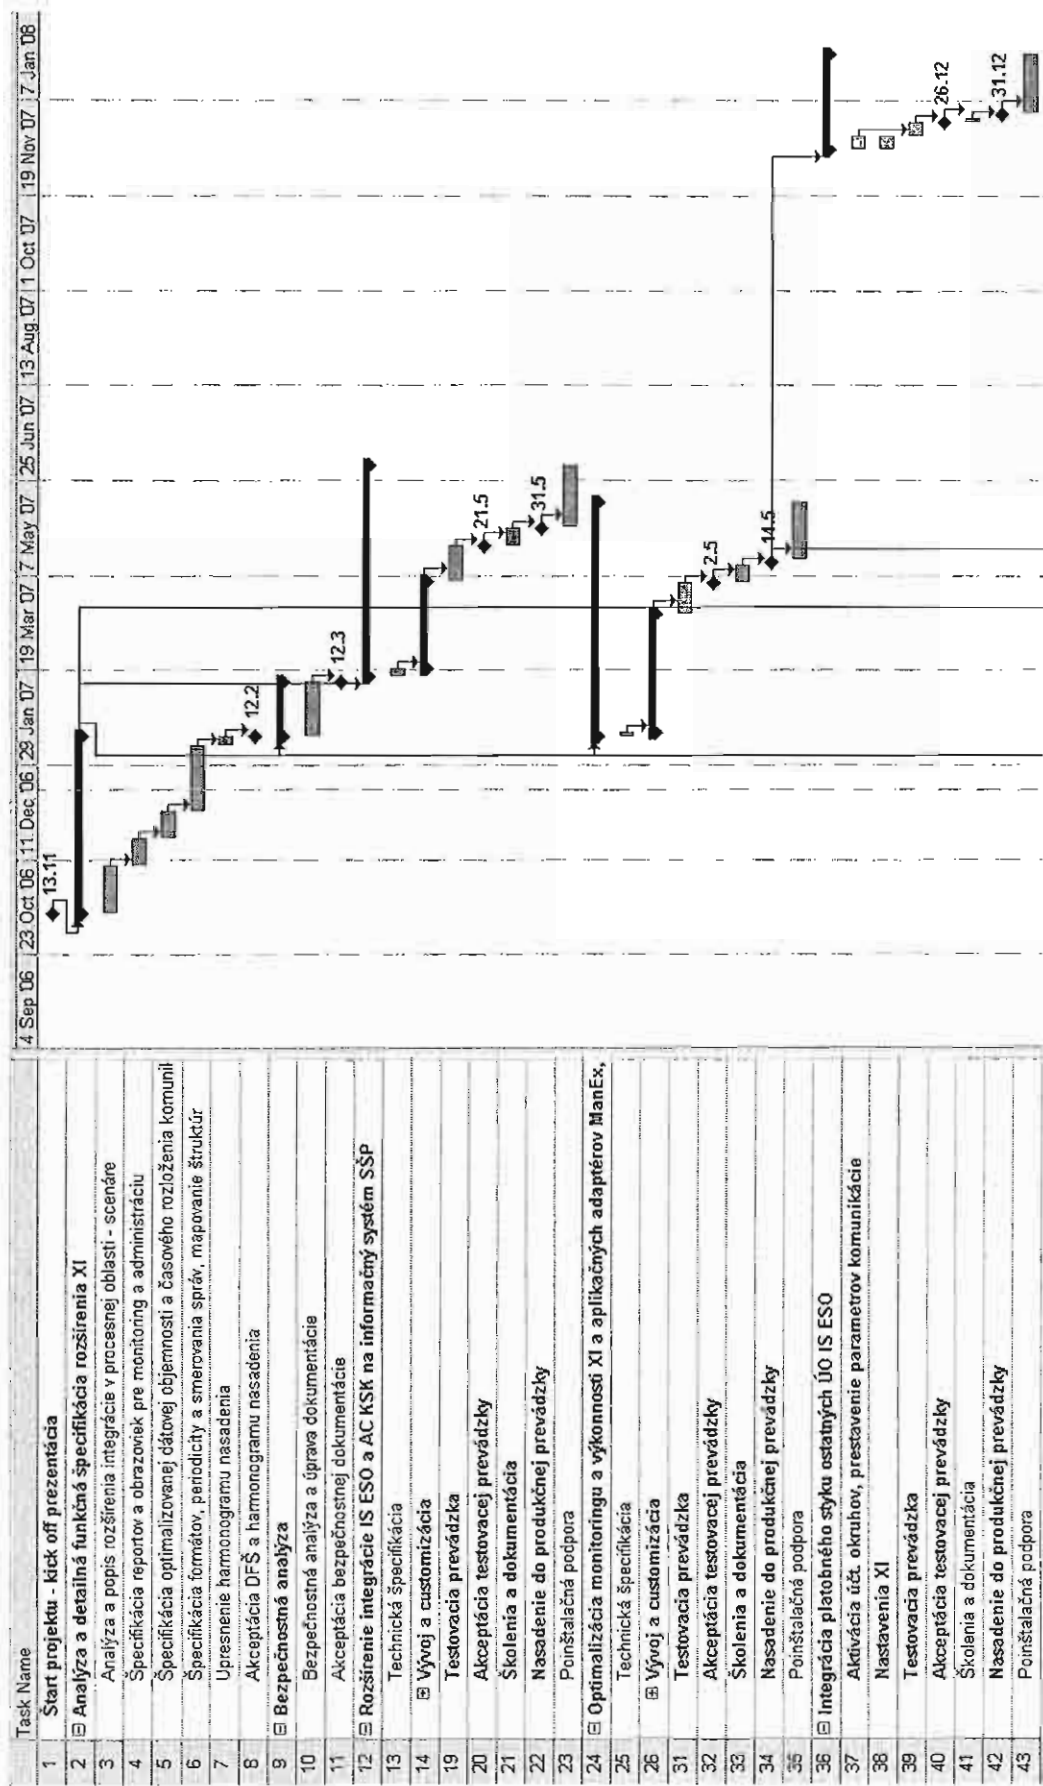

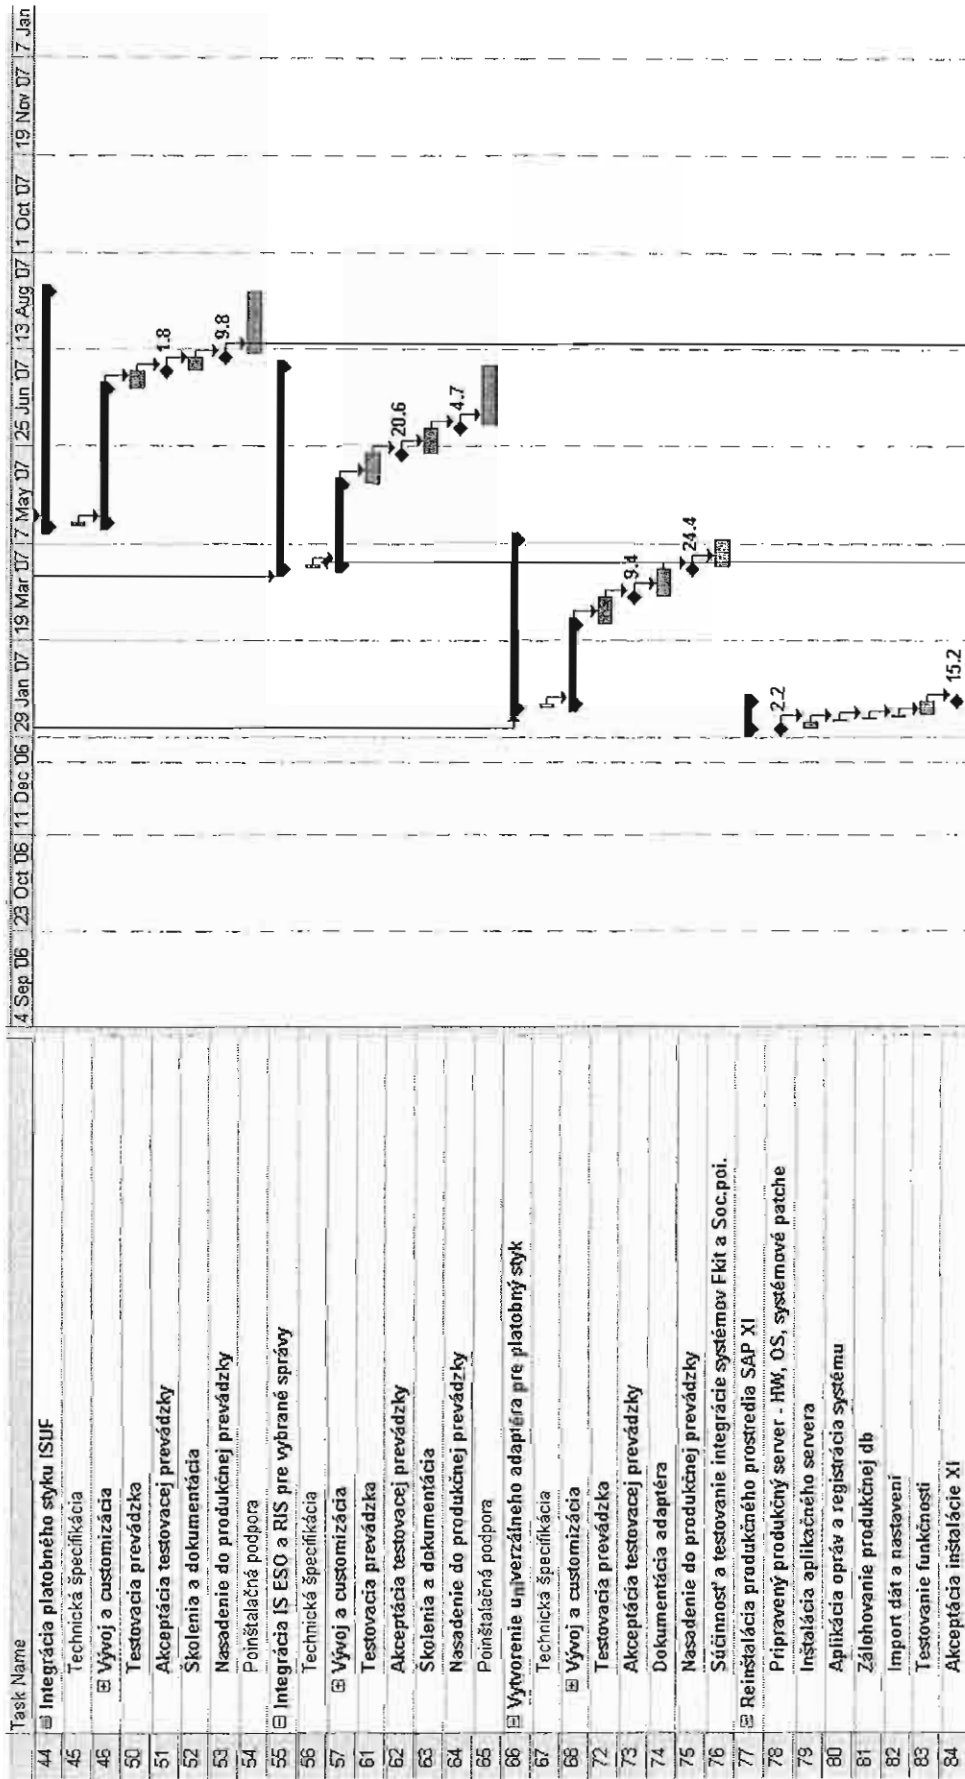

4 Sep 06 23 Oct 06 11 Dec 06 29 Jan 07 19 Mar 07 7 May 07 25 Jun 07 13 Aug 07 1 Oct 07 19 Nov 07 7 Jan 08

Task Name	
85	☑ Prenos transakčných záznamov bankových obrátov do hlavnej knihy
86	Technická špecifikácia
87	☑ Vývoj a customizácia
91	Testovacia prevádzka
92	Akceptácia testovacej prevádzky
93	Školenia a dokumentácia
94	Nasadenie do produkčnej prevádzky
95	Poinštaláčna podpora
96	☑ Prenos dát čerpania rozpočtu a zostatkov účtov do Výkazníctva
97	Technická špecifikácia
98	☑ Vývoj a customizácia
100	Testovacia prevádzka
103	Akceptácia testovacej prevádzky
104	Školenia a dokumentácia
105	Nasadenie do produkčnej prevádzky
106	Poinštaláčna podpora
107	☑ Integrácia účtovného modulu ACM FKIt na SAP IS SP účtovníctvo
108	Technická špecifikácia
109	☑ Vývoj a customizácia
113	Testovacia prevádzka
114	Akceptácia testovacej prevádzky
115	Školenia a dokumentácia
116	Nasadenie do produkčnej prevádzky
117	Poinštaláčna podpora
118	☑ Aktualizácia detailnej funkčnej špecifikácie rozšírenia XI
119	Úprava obsahu DFS na základe aktuálneho stavu k 22.6.07
120	Upresnenie harmonogramu nasadenia
121	Akceptácia aktualizovanej DFS
122	☑ Integrácia účtovného modulu ACM FKIt na hl. knihu klienta Státny Dlh
123	Technická špecifikácia
124	☑ Vývoj a customizácia
128	Testovacia prevádzka
129	Akceptácia testovacej prevádzky
130	Školenia a dokumentácia
131	Nasadenie do produkčnej prevádzky
132	Poinštaláčna podpora

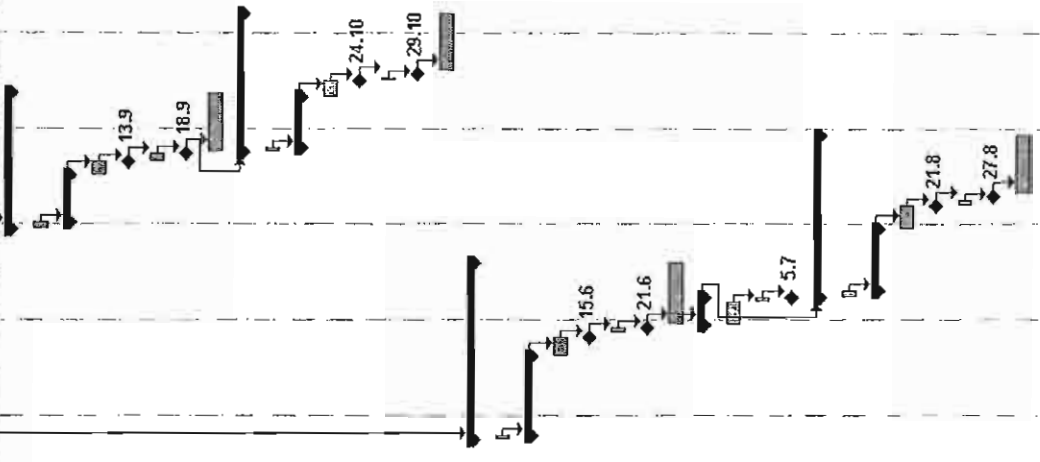

- E. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
- F. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) exemplároch. Každá strana obdrží po dvoch z nich.
- G. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú ustanoveniami tohto Dodatku dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.

V Bratislave, dňa 19. 06. 2007

26 -07- 2007

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.



Ing. Jaroslav Mikla
vedúci služobného úradu



Ing. Igor Zeman
konateľ

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
Štefanovičova 5
817 02 BRATISLAVA 15
- 2C/1 -

 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Vajnianska 7, PO BOX 43
850 02 Bratislava 22
invent -7-
