



32893/2010

## Riadenie zmien

**Zmena lokalizácie hraničných Distribučných miest (HDM)  
v rámci schváleného zoznamu Distribučných miest V3.7 a zmena  
požiadavky T1.9 súťažných podkladov**

CR\_00032\_HDM\_V3.7\_zmena\_T1.9\_v1.0\_svk

Ref. č. 32

Verzia 1.0

## OBSAH

|   |                                                                                              |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Zhrnutie .....                                                                               | 3  |
| 2 | Navrhované zmeny a očakávané synergické efekty .....                                         | 4  |
| 3 | Popis dopadu zavedenia zmeny na rozsah Zmluvy medzi Poskytovateľom<br>a Objednávateľom ..... | 10 |
| 4 | Dopad zavedenia zmeny na základné bloky mýtného systému .....                                | 11 |
| 5 | Dopad zavedenia zmeny na kľúčové procesy .....                                               | 12 |
| 6 | Technologická platforma a architektúra .....                                                 | 13 |
| 7 | Navrhovaný časový harmonogram .....                                                          | 14 |
| 8 | Návrh poskytovateľa na ocenenie zmeny .....                                                  | 15 |
| 9 | História dokumentu .....                                                                     | 16 |

## 1 Zhrnutie

Pri zriaďovaní Hraničných distribučných miest (ďalej len "HDM") Vyšný Komárnik, Haniska, Trstená a Šahy, ktoré boli spoločnosťou NDS, a.s. a spoločnosťou SkyToll, a.s. schválené v dokumente Fáza vybudovania EMS V3.7., došlo z dôvodu problémov pri zriadení HDM v konkrétnych objektoch k nutnosti zmeny polohy týchto HDM.

Zároveň podávame týmto návrh na zmenu požiadavky T1.9 časti B1 Opisu predmetu zákazky Súťažných podkladov č.1/2008 v zmysle ktorej *„Elektronický mýtny systém musí byť umiestnený na území Slovenskej republiky z dôvodu zabezpečenia efektívnej realizácie možného budúceho prevodu Služby a predaja Podniku“* – z dôvodu objektívnej nemožnosti splnenia predmetnej podmienky podávame tento návrh na zmenu, ktorý je jedinou zmenou navrhovanou výnimočne, a to z nižšie uvedených objektívnych dôvodov a nemožnosti splnenia stanovenej povinnosti; ostatné HDM sú alokované výlučne na území Slovenskej republiky; v danom prípade ide o lokalizáciu HDM Drietoma – Starý Hrozenkov (č.93), ktorá sa nachádza na území Českej republiky cca 400 m od hranice Slovenskej republiky.

## 2 Navrhované zmeny a očakávané synergické efekty

HDM Vyšný Komárnik bol pôvodne plánovaný v objekte poľských colných orgánov 40 m na území Poľska. Pre preťahy v príprave nájomného vzťahu na tieto priestory bolo potrebné nájsť nové priestory v objekte „Terminál“, cca 500 m od hranice s Poľskom.

HDM Milhost' bolo pôvodne plánované v objekte Truck centra pri obci Haniska. Pre nemožnosť uzavretia zmluvného vzťahu s majiteľom objektu našiel subdodávateľ Česmad nový objekt cca 500 m od štátnej hranice v objekte čerpacej stanice Benzina.

HDM Trstená bol plánovaný v objekte pod správou PZ SR . Správca budovy však vypovedal prenajímateľovi Česmad nájomnú zmluvu. Nové priestory pre zriadenie HDM sú v tej istej lokalite v priestore hraničného prechodu v objekte Motorestu (posunutie o 50 m).

HDM Šahy bol pôvodne plánovaný v priestore zmenárne a reštaurácie na hraničnom prechode. Majiteľ priestorov však napriek uzavretej zmluve s prenajímateľom Česmad, neumožnil prístupníť priestory pre vykonanie nevyhnutných stavebných a technických úprav k zriadeniu HDM. Nové HDM je navrhované v objekte ČS Shell, situovanej 3,4 km od hranice s Maďarskom.

Česmad garantuje, že novo navrhnuté miesta spĺňajú všetky technické požiadavky na zriadenie HDM (otváracia doba, parkovacie miesta, vzdialenosť od hranice, konektivita, skladové priestory).

| 1.                                                                                  | 2.                        | 3.       |                                     |                          |        | 4.                          | 5.                             | 6.                              | 7.    | 8.                | 9.                                     | 10.                    | 11.                                                 | 12.            | 13.        | 14.                | 16.          | 17.                     |                           |                           |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----|----|
| Distribučné<br>miesto/<br>Hraničné<br>distribučné<br>miesto/<br>Kontaktné<br>miesto | Číslo a názov<br>partnera | Lokalita |                                     |                          |        | Súradnice<br>severnej šírky |                                | Súradnice<br>východnej<br>dĺžky |       | Otváracia<br>doba | Vzdialenosť k najbližšiemu<br>POS v km | Číslo najbližšieho POS | Smer POSu<br>/ prístup z<br>obidvoch<br>strán cesty | Sieť SEP/ COMB | Prípojenie | Skladové priestory | GSM pokrytie | Prístup nad 12t         | Číslo súboru (.jpg) na CD | Parkovacie miesta nad 12t |    |    |
| HDM                                                                                 | 88                        | Cesmad   | Trstená -<br>Chýžné (PL)            | Krakovská,<br>E77, č. 59 | 028 01 | Žilinský<br>kraj            | Turbočín<br>/ Liesek           | 49 24                           | 21.27 | 19 39             | 26.49                                  | NONSTOP                | 40                                                  | 59             | obojsmerný | SEP                | 512kbs       | min (4 m <sup>2</sup> ) | áno                       | áno                       | 88 | >5 |
| Premium<br>HDM                                                                      | 89                        | Cesmad   | Výšný Komárnik<br>- Barwinek (PL)   | E371, č. 73              | 090 05 | Prešovs<br>ký kraj          | Svidník /<br>Nižný<br>Komárnik | 49 24                           | 42.05 | 21 42             | 1.46                                   | NONSTOP                | 20                                                  | 48             | obojsmerný | SEP                | 512kbs       | min (4 m <sup>2</sup> ) | áno                       | áno                       | 89 | >5 |
| HDM                                                                                 | 91                        | Cesmad   | Milhost' -<br>Tornyosnémeti<br>(HU) | E71,<br>Benzína          | 044 58 | Košický<br>kraj             | KE                             | 48 32                           | 8.89  | 21 15             | 25.84                                  | NONSTOP                | 15                                                  | 76             | obojsmerný | SEP                | 512kbs       | 8 m <sup>2</sup>        | áno                       | áno                       | 91 | >5 |
| HDM                                                                                 | 92                        | Cesmad   | Šahy -<br>Piraussapusza<br>(HU)     | SNEP č. 64               | 936 01 | Nitrians<br>ky kraj         | Šahy                           | 48 4                            | 55.69 | 18 56             | 42.28                                  | NONSTOP                | <45                                                 | 64,21          | obojsmerný | SEP                | 512kbs       | min (4 m <sup>2</sup> ) | áno                       | áno                       | 92 | >5 |

Tabuľka č.1 – Zoznam navrhovaných zmien v lokalitách hraničných Distribučných miest


Vysvetlivky k nižšie uvedeným obrázkom:

⊗ Pôvodná lokalizácia HDM

○ Nová lokalizácia HDM




Obrázok č. 1 - Zmena HDM v Milhosti

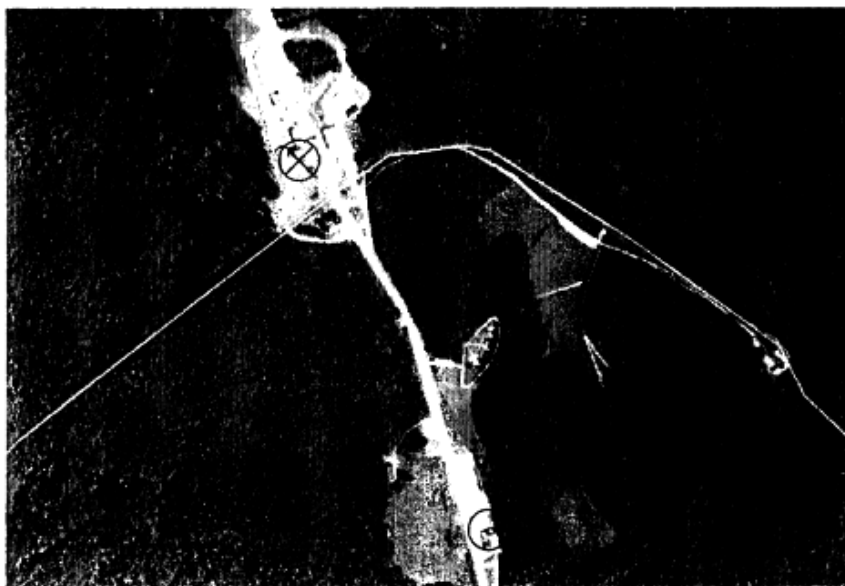

Obrázok č. 2 - Zmena HDM vo Vyšnom Komárniku




Obrázok č. 3 - Zmena HDM Šahy

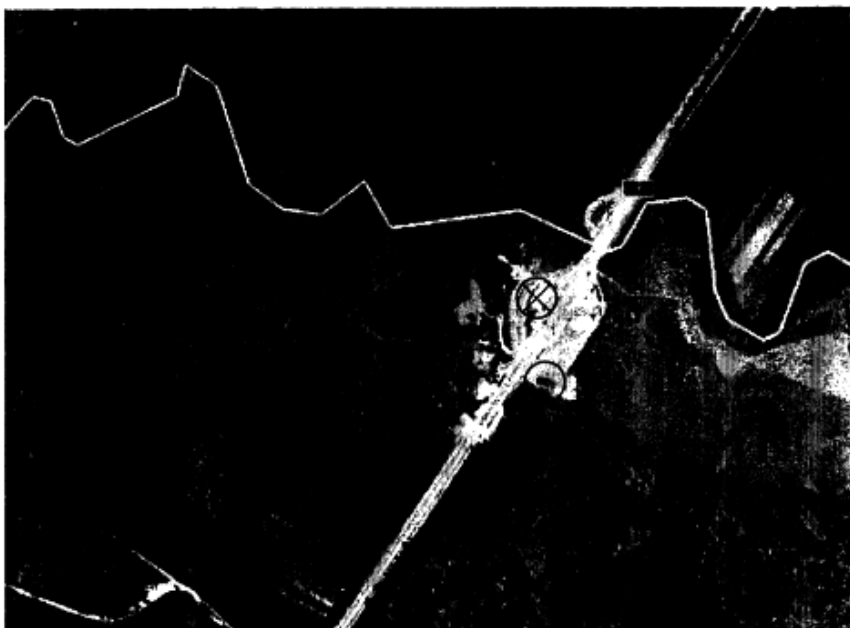

Obrázok č. 4 - Zmena HDM Trstená

V súlade s časťou 1 tohto návrhu na uskutočnenie zmeny (zhmutie), prikladáme fotodokumentáciu, z ktorej jednoznačne a nad akúkoľvek pochybnosť vyplýva:

- 1) v danej lokalite nebolo z objektívnych dôvodov možné umiestniť dané HDM na území Slovenskej republiky,
- 2) ide o HDM, ktoré má od hraníc Slovenskej republiky vzdialenosť do 400 m, pričom ide o objekt bývalej colnice;
- 3) opätovne zdôrazňuje skutočnosť, že ide o jediné HDM umiestnené mimo územia Slovenskej republiky.

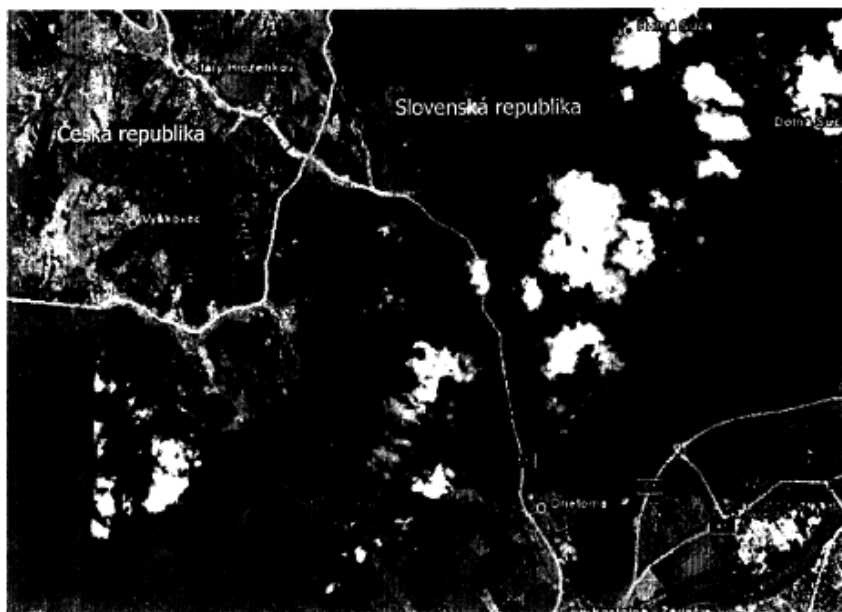

Obrázok č. 5 – Lokalizácia HDM č. 93 Drietoma – Starý Hrozenkov

### 3 Popis dopadu zavedenia zmeny na rozsah Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom

Zmena požiadavky T1.9 časti B1 Opisu predmetu zákazky Súťažných podkladov č.1/2008 a zmena schválenej dokumentácie V3.7 nemá žiaden vplyv na cenu služby – dodatočné náklady objednávateľa, pričom uvádzame, že v plnom rozsahu a nezmenene predmetnou zmenou nebudú dotknuté:

- tak ustanovenia týkajúce sa ochrany informácií v rozsahu bezpečnostného projektu:

základné ciele v tejto oblasti boli realizované prostredníctvom technických, organizačných a personálnych bezpečnostných opatrení zameraných na minimalizovanie rizík elektronického mýtného systému v prostredí spoločnosti NDS, a.s.. Bezpečnostné opatrenia pokrývajú všetky aspekty spracúvania osobných údajov v elektronickom mýtnom systéme prevádzkovaného v prostredí spoločnosti NDS, a.s., preto v rámci dosiahnutých bezpečnostných cieľov sme zabezpečili organizačné pokrytie všetkých operácií s osobnými údajmi dotknutých osôb,

minimálne požadované technické opatrenia v prostredí spoločnosti NDS, a.s. zohľadňujú požiadavky na:

- bezpečný a riadený prístup k osobným údajom Elektronického mýtného systému,
- bezpečný a kontrolovaný prístup k IT a do Elektronického mýtného systému,
- priradenie primeraných prístupových práv užívateľom Elektronického mýtného systému,
- bezpečnú prácu s výstupmi z Elektronického mýtného systému,
- bezpečné uloženie dokumentov a elektronických médií nesúcich osobné údaje,
- zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti aktív Elektronického mýtného systému,
- zabezpečenie pripravenosti v oblasti riešenia bezpečnostných incidentov a havarijných stavov,
- zabezpečenie ochrany a bezpečnej likvidácie dokumentov obsahujúcich osobné údaje v papierovej forme,

minimálne požadované organizačné opatrenia boli zamerané na:

- dohľad nad ochranou osobných údajov Elektronického mýtného systému,
- efektívne riadenie bezpečnosti v NDS,
- aplikovanie opatrení nezávislé od organizačnej štruktúry NDS,
- zosúladenie spracovania osobných údajov s požiadavkami legislatívy SR (napr. zmluvy so sprostredkovateľmi),
- zosúladenie internej legislatívy s požiadavkami zákonov,
- obmedzenie vyžadovaného prístupu k osobným údajom na základe požiadavky „need to know“,
- návrh preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie prípadným porušeniam zákona,
- zabezpečenie poskytovania osobných údajov dotknutých osôb v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov,

minimálne požadované personálne opatrenia boli zamerané na:

- minimalizáciu počtu oprávnených osôb,
  - zabezpečenie poučenia a zvyšovanie bezpečnostného povedomia všetkých oprávnených osôb,
  - zabezpečenie vymedzenia a presného stanovenia zodpovednosti za osobné údaje,
  - zabezpečenie mlčanlivosti oprávnených osôb,
  - zabezpečenie školenia oprávnených osôb,
- ako aj rozsah a kvalita (riadny a včasný výkon) poskytovania služby: dbáme o riadne a včasné plnenie všetkých zmluvných a právnych povinností, vyplývajúcich nám tak z platnej a účinnej slovenskej, českej a európskej legislatívy, ako i Zmluvy.

## 5 Dopad zavedenia zmeny na kľúčové procesy

Neboli identifikované žiadne negatívne dôsledky týkajúce sa kľúčových procesov Elektronického mýtného systému.

## **6 Technologická platforma a architektúra**

Neboli identifikované žiadne negatívne dopady na technologickú platformu a architektúru Elektronického mýtného systému.

## 7 Navrhovaný časový harmonogram

Neboli identifikované žiadne negatívne dopady na časový harmonogram vykonávacej dokumentácie Elektronického mýtného systému.

## **8 Návrh poskytovateľa na ocenenie zmeny**

Nebol identifikovaný žiadny finančný dopad (dodatočne vyvolaný náklad) tak pre Objednávateľa, ako i pre Poskytovateľa služby.

## 9 História dokumentu

| Verzia | Status | Dátum      | Osoba         | Dôvod zmeny |
|--------|--------|------------|---------------|-------------|
| 1.0    | F      | 10.11.2009 | SkyToll, a.s. | Vydané      |
|        |        |            |               |             |
|        |        |            |               |             |
|        |        |            |               |             |
|        |        |            |               |             |
|        |        |            |               |             |
|        |        |            |               |             |
|        |        |            |               |             |

História dokumentu:

Pracovná verzia „W“, Revidovaná verzia „R“, Finálna verzia „F“



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>SkyToll, a.s.</b>    |            |
| Došlo dňa: 30. 06. 2010 |            |
| Číslo: I/3922           | Príloha: - |
| Vybavuje:               | NOK        |

Vážený pán  
**Ing. Matej Okáli**  
predseda predstavenstva

SkyToll, a. s.  
Prievozská 2/A  
821 09 Bratislava

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/ linka

Dátum

21928/2010/20100

Ing.Voleník//583112226

29.6.2010

VEC: Prijatie návrhu uskutočnenia zmeny

Vážený pán predseda predstavenstva,

na základe Vášho písomného návrhu uskutočnenia Zmeny (Zmena lokalizácie hraničných Distribučných miest (HDM) v rámci schváleného zoznamu Distribučných miest V3.7 a zmena požiadavky T1.9 súťažných podkladov) - názov dokumentu CR\_00032\_HDM\_V3.7\_zmena\_T1.9\_v1.0\_svk Vám podľa ustanovenia bodu 39 článku XV. (Spoločné ustanovenia) Zmluvy o komplexnej službe elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 v dohodnutej lehote udeľujeme tento písomný pokyn na uskutočnenie Zmeny, ktorým dochádza k uzavretiu dodatku k Zmluve v rozsahu návrhu uskutočnenia Zmeny. Zároveň akceptujeme, že s návrhom uskutočnenia Zmeny nie sú spojené dodatočné náklady a že vlastná realizácia všetkých ostatných činností podľa Zmluvy pod vplyvom tejto Zmeny nebude rezultovať v navýšení Základnej ročnej ceny Služby.

Ďalej Vám v zmysle vyššie spomínaného ustanovenia tejto zmluvy pripomíname, že ste povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa tejto Zmluvy so zohľadnením dohodnutej Zmeny podľa príslušného dodatku a zároveň viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených Zmien po celú dobu poskytovania Služby.

S pozdravom

  
Ing. Igor Choma  
predseda predstavenstva

  
Ing. Rastislav Noskovič  
člen predstavenstva

Telefón, Fax  
02/ 58311111  
02/ 58311706

Bankové spojenie  
UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
č.č.: 6624858013/1111

Zapísaný v obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel Sa, Vločka č. 3518/B

IČO  
35 919 001

DIČ  
2021937775

IČ DPH  
SK 2021937775
