

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: Z- 1192/2008

Č. zhotoviteľa: 08BA01014

dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) na stavbu :

I/67 Rekonštrukcia cesty v mieste hraničného prechodu SR – MR Kráľ

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: : Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník úseku investičnej prípravy
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995,
v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005,
zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ** : **Valbek s.r.o.**
Sídlo : Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Eduard Manco, konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Eduard Manco
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Eduard Manco
- vo veciach technických : Ing. Robert Vorschneider
Bankové spojenie : Komerční banka Bratislava, a.s.
Číslo účtu : 35-6848780267/8100
IČO : 36 612 642
IČ DPH : SK 2022209288
Tel./Fax : 02/44 643 077, 02/44 643 078
e-mail: : manco@valbek.sk
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR
Okresného súdu Bratislava I Odd: Sro, vložka č. 41175/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

- 2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je dokumentácia na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru na stavbu:

„I/67 Rekonštrukcia cesty v mieste hraničného prechodu SR – MR Kráľ“

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl. 3. Vykonávanie diela

- 3.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3 Objávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

Čl. 4. Rozsah a obsah

- 4.1 Záväzným podkladom pre vypracovanie diela je oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky zhotoviteľa č.j.VO – 2086/2008 zo dňa 04.08.2008 a zhotoviteľom predložená ponuka dňa 31.07.2008.
- 4.2 Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu pre realizáciu stavby, dokumentáciu pre ponuku (DP) v súlade s TP č. 03/2006 – Dokumentácia stavieb ciest, technické podmienky, podľa prílohy č. 10, 11 a príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.
- 4.3 Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie:
- 4.3.1 obsah dokumentácie je daný prílohou č. 10, 11 TP 03/2006
- 4.3.2 riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby.
- 4.3.3 všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.
- 4.4. Nároky na spracovanie DP:
- 4.4.1 minimalizovať trvalé zábery
- 4.4.2 stavbu navrhnuť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostavujúcich častí dotknutých pozemkov.
- 4.4.3 riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili.
- 4.4.4 rozsah prípadných vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods. 13. zák.č. 135/1961 Zb. a odsúhlasiť s objednávateľom.
- 4.4.5 spracovať podklady pre prípadne odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov.
- 4.4.6 riešiť prístupové cesty na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest, ktoré sa využívajú počas výstavby, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami.
- 4.4.7 riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami
- 4.4.8 navrhnuť harmonogram organizácie výstavby (POV)
- 4.4.9 popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia a regulácie dopravy)
- 4.4.10 polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi pozemnoknižného katastra (právny stav)
- 4.5 Náležitosti dokumentácie a požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní
- 4.5.1 Geodetické zameranie územia (dodať v digitálnej forme vo výstupe dgn) bude súčasťou

- 4.5.2 časti „F“ – Dokumentácia meračských prác. Súčasťou dokumentácie meračských prác bude účelová mapa, kde sa aktualizuje stav polohy jestvujúcich inžinierskych sietí s potvrdením o správnosti zákresu ich priebehu potvrdenej správcom. Bude vytýčená os miestnej komunikácie, zamerané terénne pozdĺžne profily a priečne rezy po 25 m.
- 4.5.2 Zároveň budú riešené body vytyčovacej siete so zoznamom súradníc. Dokumentácia meračských prác bude zároveň riešiť navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc.
- 4.5.3 Koordinačnú situáciu stavby je potrebné spracovať na podklade mapy z katastra nehnuteľností so zakreslením všetkých inžinierskych sietí. Ďalej je potrebné riešiť prekládky, prípadne ochrany jestvujúcich nadzemných a podzemných inžinierskych sietí dotknutých stavbou v nevyhnutnom rozsahu. Dokumentácia musí riešiť obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácie dopravy a pod.). Verejná doprava bude vedená po polovici súčasnej cesty striedavo jednosmerne s podrobným dopravným značením tohto dopravného obmedzenia.
- 4.5.4 V rámci PD je potrebné spracovať optimálne technické a ekonomické riešenia stavebných objektov. V rámci stavby sa spracuje plán organizácie výstavby tak, aby minimalizoval negatívne vplyvy zásahu do krajiny a aby minimalizoval prejazdy týmto územím. V dokumentácii je ďalej potrebné riešiť zvláštne požiadavky na zhotovenie stavby (postup výstavby podľa územných podmienok - umiestnenie stavebného dvora, prístup na stavenisko, depónia nevhodných materiálov, nároky na elektrickú energiu, vodu, materiálové zdroje do násypov, stabilitu svahov).
- 4.5.5 Výkaz výmer bude vypracovaný v jazyku slovenskom v agregovaných položkách a bude súčasťou každej dokumentácie.
- 4.5.6 Súpis agregovaných položiek bude vypracovaný v jazyku slovenskom aj v elektronickej forme a bude súčasťou každej dokumentácie.
- 4.5.7 Kontrolný rozpočet stavby v CÚ 2008 2x v sadách č.1 a 2.

4.6 Spôsob a lehoty prejednávania

- 4.6.1 Odsúhlasenie smerového a výškového vedenia trasy cesty a návrhu križovatiek, do 6 týždňov od podpisu zmluvy
- 4.6.2 Odsúhlasenie objektovej skladby, do 8 týždňov od podpisu zmluvy
- 4.6.3 Vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia ich rozsahu podľa zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov
- 4.6.4 Prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich vlastníkov alebo správcov objektov stavby s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok
- 4.6.5 Predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie podľa § 14, ods. 1), písm. d) zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Technickú inšpekciu a doloženie tohto posudku k dokumentácii objektov stavby v dokladovej časti
- 4.6.6 Odsúhlasenie návrhu dopravného značenia s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ a doloženie dokladu o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom
- 4.6.7 Koncept kompletnej dokumentácie predloží projektant objednávateľovi ku kontrole a k pripomienkam 15 dní pred termínom dodania dokumentácie na dobu 5 dní.
- 4.6.8 Koncept dokumentácie projektant prerokuje na záverečnom prerokovaní
- 4.6.9 Záverečne odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na ich hlavičkovom papieri a bude z neho zrejme, že s predloženým riešením súhlasia bez pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie projektovej dokumentácie
- 4.6.10 Projektant sa zúčastní na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho objednávateľ k tomu vyzve

4.7 Počet výtlačkov dokumentácie

Kompletná DRS – tlačaná forma	8 x
Kompletná digitálna forma DP	6 x
Výtlačky navyše:	
- prehľadná situácia M 1 : 50 000	5 x
- koordinačný výkres stavby	10 x
- kópia z katastrálnej mapy	5 x

4.8 Rozsah prác autorského dozoru bude v súlade s prílohou č.12 TP č.03/2006 - Dokumentácia stavieb ciest

4.8.1 Rozsah plnenia autorského dozoru :

- 4.8.1.1 zúčastniť sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- 4.8.1.2 vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach,
- 4.8.1.3 v prípade odchýliek prijímať návrhy na doplnkové riešenia za účasti geotechnika,
- 4.8.1.4 zúčastniť sa preberania základových škár, pokiaľ si to v PD vyhradil,
- 4.8.1.5 na požiadanie objednávateľa vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch, súvisiacich so zemnými prácami a zakladaním objektov vyplývajúcich zo zistených skutočností,
- 4.8.1.6 vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavebných prác na zmeny dokumentácie z technického a technologického hľadiska na základe predbežného súhlasu objednávateľa,
- 4.8.1.7 vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby k prácam nad rozsah dokumentácie na realizáciu stavby (naviac práce),
- 4.8.1.8 zúčastňovať sa na kontrolných dňoch stavby,
- 4.8.1.9 zúčastňovať sa na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej ucelenej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými predpismi stanovených skúšok,
- 4.8.1.10 na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu predložiť stanovisko z pohľadu autorského dozoru,
- 4.8.1.11 sledovať dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi podľa DRS
- 4.8.1.12 vypracovať stanovisko k dodržaniu projektovaných parametrov v zmysle § 18 ods.2 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.
- 4.8.1.13 riešiť zmeny technického riešenia stavby vyplývajúce z požiadaviek objednávateľa a zo záverov kontrolných dní

4.8.2 Spôsob vykonávania autorského dozoru :

- 4.8.2.1 Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, do zápisu z kontrolného dňa stavby, alebo listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v tejto zmluve o dielo, prípadne iný pracovník, písomne poverený oprávneným pracovníkom.
- 4.8.2.2 Každá návšteva na stavbe zo strany AD musí byť ohlásená stavebnému dozoru (SD) s uvedením účelu. Bez ohlásenia a odsúhlasenia SD nebude táto návšteva uznaná a uhradená.
- 4.8.2.3 Ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúca z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie stavebného dozoru objednávateľa do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín.
- 4.8.2.4 Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania autorského dozoru v predpokladanom rozsahu 100 hodín. V tomto rozsahu je zahrnutá okrem záväzkov podľa ods. 4.8.1 aj technická príprava, konzultácie a účasť na kontrolných dňoch stavby.
- 4.8.2.5 V prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému.

4.8.3 Termíny výkonu autorského dozoru budú upravené dodatkom k tejto zmluve.

Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

- 5.1 Názov : I/67 Rekonštrukcia cesty v mieste hraničného priechodu SR – MR Kráľ
Miesto : I/67 Kráľ – hraničný prechod SR/MR
Dĺžka : 0,250 km
Kraj : Banskobystrický
Okres : Lučenec
- 5.2 Základné parametre:
Dĺžka : 0,250 km
Kategória: C 9,5/60

- 5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
- a) do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
 - b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Čl. 6. Termín plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 4 tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

6.1 DP do 30.01.2009

6.2 Autorský dozor – začne plynúť po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavebných prác a skončí zápisničným odovzdaním a prevzatím stavby. Presné termíny budú upravené dodatkom k zmluve.

Čl. 7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním predmetu zmluvy resp. jeho ucelených častí uvedených v zmluve
Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatiu diela je Pavlína Aláčová v mieste jeho sídla, (SSC IVSC Banská Bystrica).
- 7.2 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov
- 7.3 Predĺžiť termín dodania možno iba v prípade, že:
- 7.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
 - 7.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
 - 7.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.
- 7.4 Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

8.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu článku 4 tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny prác, stanovená hodinovými sadzbami a kalkulácia nákladov a zisku podľa hodinových sadzieb tvoria samostatné prílohy č.1 a 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

8.1.1 DP

Cena prác bez DPH	1 935 000,00 Sk
DPH 19 %	367 650,00 Sk
Cena prác vrátane DPH	2 302 650,00 Sk

Slovom: Dvamiliónytristodvatisícšesťstopäťdesiat Slovenských korún

8.1.2 Autorský dozor

Hodinová sadzba	750,00 Sk
-----------------	-----------

- 8.2 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom, po vyhotovení a odovzdaní diela podľa článku 6.1 a 8.1.1 (DP). Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho ucelenej časti. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu diela podľa čl. 8.1, resp. zníženú o sumu zmluvnej pokuty podľa čl. 14
- 8.4 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí:
- a) v rozsahu 90 % z ceny podľa bodu 8.1.1 s DPH v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,

b) v rozsahu 10 % z ceny podľa bodu 8.1.1 s DPH v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehladnutí diela v uvedenej lehote 60 dní

8.5 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :

- Priame mzdy
- Ostatné priame náklady
- Režijné náklady
- Zisk
- Celková cena

Hodinové sadzby v tarifných triedach tvoria samostatnú prílohu č.2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Hodinové sadzby pre výkon AD budú upresnené v jednotlivých rokoch plnenia zmluvy, na základe zhotoviteľom predložených a objednávatelom prijatých kalkulácií, najneskôr do 31.03. každého príslušného roku. Ak do tohto termínu zhotoviteľ neprerokuje s objednávatelom novú kalkuláciu, bude mu v príslušnom roku priznaná schválená kalkulácia z uplynulého roku.

8.6 Výkon autorského dozoru bude hradený podľa skutočne vykonaných návštev, potvrdených stavebným dozorom objednávateľa. Podkladom pre úhradu bude faktúra vystavená zhotoviteľom do 30.11. v roku výkonu AD, resp. po jeho ukončení.

Čl. 9. Zodpovednosť zhotoviteľa

9.1 Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá v rozsahu uvedenom v čl. 4 podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v čl. 2, 3, 5 a 6 tejto zmluvy.

Čl. 10. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

10.1. Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

Titul, meno, priezvisko	Funkcia	zastúpenie v rámci plnenia zmluvy

10.2. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

Titul, meno, priezvisko	Funkcia	zastúpenie v rámci plnenia zmluvy
Ing. Dáša Foltániová	hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb	vo veciach technických
Pavína Aláčová	odborný zamestnanec prípravy stavieb	vo veciach technických

Čl. 11. Podzhotovitelia

11.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Zoznam podzhotoviteľov:

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
GEO3 Trenčín, s.r.o.	Dokumentácia meračských prác	Geodetické	3,7
Valbek, spol. s r.o., Liberec	Úprava inžinierskych sietí	Projekčné	23,0

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % 26,7.

- 11.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa povinností a zodpovedností stanovenej v zmluve.

Čl. 12 Náhrada škôd

- 12.1 Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, zapríčinené porušením jeho povinností, ktoré spôsobia objednávateľovi zvýšené náklady na stavbe a to počas realizácie a záručnej doby stavby.
- 12.3 Za týmto účelom je zhotoviteľ povinný najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu začatia realizácie stavby predložiť objednávateľovi kópiu poisťnej zmluvy na úhradu prípadných škôd, ktoré budú zapríčinené porušením jeho povinností a následne spôsobia objednávateľovi škody a zvýšené náklady na stavbe realizovanej podľa vypracovaného projektu.

Čl. 13 Obchodné tajomstvo a autorské práva

- 13.1 Objávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 13.3 Objávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ predmet zmluvy na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.
- 13.4 Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

Čl.14 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 14.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za :

Č.	Druh pokuty	Čl. návrhu ZoD.	Výška pokuty v Sk/deň
1.	neukončenie DP v zmluvnom termíne	6.2.	5 000,-
2.	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	15.	1 500,-

14.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za :

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl. návrhu ZoD.	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
1.	omeškanie s úhradou faktúry	8.6.	0,05 % z dlžnej čiastky

14.3 Objednávateľ za neplnenie autorského dozoru môže zhotoviteľovi znížiť dohodnutú cenu za AD nasledovne:

- a) za neospravedlненú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 3 000,00 Sk za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa
- b) za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 1 000,00 Sk za každý nesplnený termín
- c) za neospravedlненú neúčast' na odovzdávaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 3 000,00 Sk, ak bol písomne vyrozumený o tom minimálne 5 pracovných dní vopred.

Čl. 15 Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 15.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 15.3 Viditeľné vady dodávky musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.
- 15.4 **Záručná doba** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne :
začína plynúť - zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy, v rozsahu podľa čl. 4, objednávatelom bez vád a nedorobkov,
končí - zápisničným odovzdaním a prevzatím stavby, zrealizovanej podľa predmetu zmluvy
- 15.5 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.
- 15.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
- 15.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávatel'a za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.9 Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.
- 15.10 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávatel'ovi tým, že pri realizácii diela bude postupovať podľa dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom.

Čl. 16 Doplnky, zmeny, navyše práce

- 16.1 V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k dokumentácii počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe do skončenia záručnej lehoty, vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia, objednávateľ predloží zhotoviteľovi objednávku. Zhotoviteľ predloží objednávatel'ovi dodatok k zmluve spolu so špecifikáciou rozsahu hodín pri zachovaní hodinových sadzieb uvedených v tejto zmluve a pri dodržaní článku 19.
- 16.2 Doplnky a navyše práce budú oceňované hodinovými sadzbami odsúhlasenými medzi zhotoviteľom a objednávatel'om a použitými v tejto zmluve.

Čl. 17 Odstúpenie od zmluvy

- 17.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy.

- 17.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- 17.2.1 Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
 - 17.2.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
 - 17.2.3 Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
 - 17.2.4 Voči zhotoviteľ bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 17.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 17.4 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka.
- 17.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane, po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť súhlasu druhej strany.
- 17.6 Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 17.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby podľa § 262 Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z väd diela, nároky zo záruky)
- 17.8 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Čl. 18 Platby pri odstúpení od zmluvy

- 18.1 Ak od zmluvy odstúpi objednávateľ pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 18.2 Pokiaľ od zmluvy odstúpi zhotoviteľ, pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Čl. 19 Zmena záväzkov

- 19.1 Meniť alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 19.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenie, príp. cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dohodnutej v tejto zmluve.
- 19.3 K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 14 dní od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Čl. 20 Riešenie sporov

- 20.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, uplatnenia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Čl. 21. Záverečné ustanovenia

- 21.1 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 21.2 Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 21.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.


21.4 Zmluva má 10 strán a prílohy č. 1 a 2, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 29.10.2008



.....
Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa
V Bratislave, dňa 30.10.2008



.....
Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti Valbek s.r.o.

127

Podrobná špecifikácia dokumentácie pre ponuku (DP)

	Časť dokumentácie	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		750	600	550	400	
		Potrebný počet hodín				
Zväzok 3	Technicko-kvalitatívne podmienky					40 700,00 SKK
	Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné	8			4	7 600,00 SKK
	Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne	42			4	33 100,00 SKK
Zväzok 4	Cenová časť					42 000,00 SKK
	Popis prác		4		1	2 800,00 SKK
	Celkový výkaz výmer	16	40		1	36 400,00 SKK
	Súpis agregovaných položiek		4		1	2 800,00 SKK
Zväzok 5	Dokumentácia na realizáciu stavby	952	1110	554	419	1 852 300,00 SKK
PONUKOVÁ CENA DP BEZ DPH SPOLU						1 935 000,00 SKK
DPH 19%						367 650,00 SKK
PONUKOVÁ CENA DP S DPH SPOLU						2 302 650,00 SKK

DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY (DRS)

	časť dokumentácie	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		750	600	550	400	
		Potrebný počet hodín				
A	Spravidelná správa	38			8	31 700,00 SKK
B.1	Celková situácia stavby M 1:10 000/1000	4		18	2	13 700,00 SKK
B.2	pozdĺžny rez M 1:10 000/1 000	1		8	2	5 950,00 SKK
C.1	Koordinačný výkres stavby M 1:1000	8	24	18	8	33 500,00 SKK
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2000/1000	16	52		4	44 800,00 SKK
D	Písomnosti a výkresy objektov	755	1014	510	395	1 613 150,00 SKK
F	Dokumentácia meračských prác	80	20			72 000,00 SKK
O	Rozpočet	50				37 500,00 SKK
PONUKOVÁ CENA DRS SPOLU BEZ DPH						1 852 300,00 SKK
DPH 19%						351 937,00 SKK
PONUKOVÁ CENA DRS SPOLU S DPH						2 204 237,00 SKK

Časť "D" - Písomnosti a výkresy objektov

	časť dokumentácie	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		750	600	550	400	
		Potrebný počet hodín				
101	Úprava cesty I/67	433	448	452	320	970 150,00 SKK
201	Úprava prístrešku	24	48	24	8	63 200,00 SKK
301	Úprava kanalizácie	148	78	18	16	174 100,00 SKK
401	Úprava vodovodov	4	80		8	54 200,00 SKK
501	Úprava slaboprúd. vedení	8	70	16	8	60 000,00 SKK
601	Úprava silnoprúdových vedení	126	92		19	157 300,00 SKK
801	Demolácia dezinf. jamy a drobných objektov	8	128		8	86 000,00 SKK
802	Demontáž váhy	4	70		8	48 200,00 SKK
ČASŤ "D" BEZ DPH SPOLU						1 613 150,00 SKK
DPH 19%						306 498,50 SKK
ČASŤ "D" S DPH SPOLU						1 919 648,50 SKK

KALKULÁCIA NÁKLADOV A ZISKU PODĽA TARIFNÝCH TRIED**Hlavný inžinier projektu HIP, Špecialista**

Mzdy	460,00 Sk
Odvody (35,2%)	161,92 Sk
Réžia 12% (z miezd)	55,20 Sk
Zisk 11% (z miezd + odvody + réžia)	74,48 Sk
Sadzba Sk/h	751,60 Sk

SADZBA Sk/h - PONUKA 750,00 Sk

Ved. projektant, zodpovedný projektant

Mzdy	370,00 Sk
Odvody (35,2%)	130,24 Sk
Réžia 12% (z miezd)	44,40 Sk
Zisk 11% (z miezd + odvody + réžia)	59,91 Sk
Sadzba Sk/h	604,55 Sk

SADZBA Sk/h - PONUKA 600,00 Sk

Projektant, Konštruktér

Mzdy	340,00 Sk
Odvody (35,2%)	119,68 Sk
Réžia 12% (z miezd)	40,80 Sk
Zisk 11% (z miezd + odvody + réžia)	55,05 Sk
Sadzba Sk/h	555,53 Sk

SADZBA Sk/h - PONUKA 550,00 Sk

Kreslič, planografia


Mzdy	245,00 Sk
Odvody (35,2%)	86,24 Sk
Réžia 12% (z miezd)	29,40 Sk
Zisk 11% (z miezd + odvody + réžia)	39,67 Sk
Sadzba Sk/h	400,31 Sk

SADZBA Sk/h - PONUKA 400,00 Sk

V Bratislave dňa: 30.7.2008

Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti
Valbek s.r.o.

Harmonogram prác na zákazke

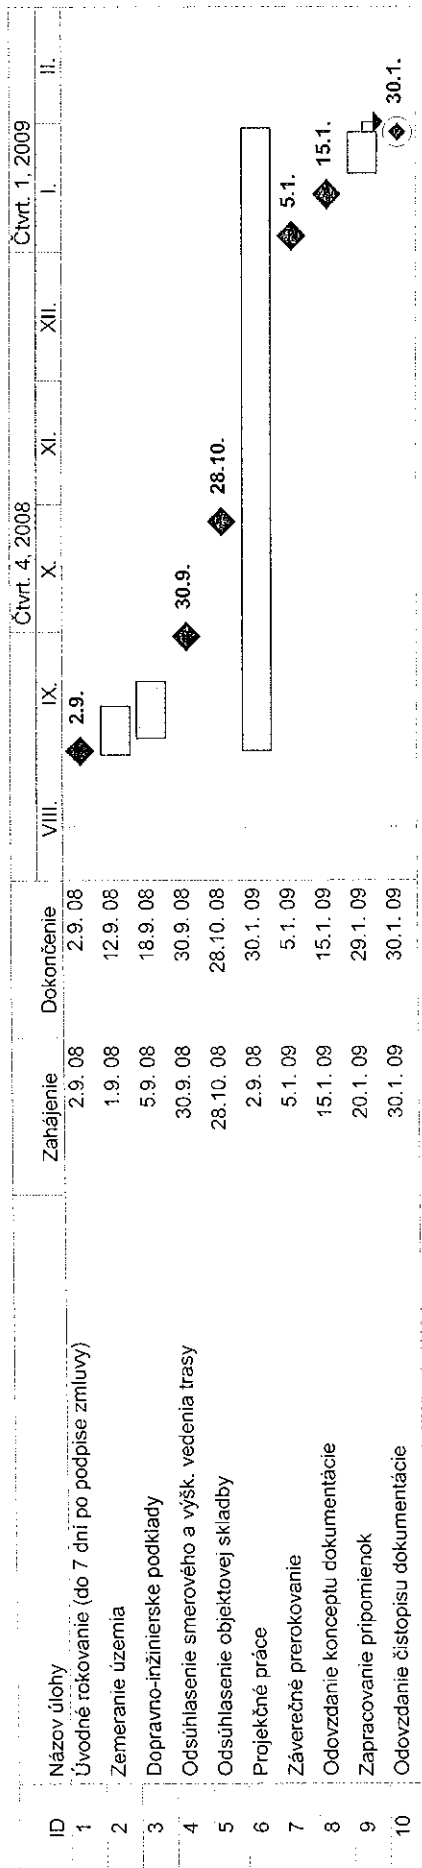

Legenda:

Úlohy
Mlínik

Termíny určené objednávateľom
Konečný termín
